

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。




蒲郡バイパス 工事便り



発行 第34号
平成27年3月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長: 鈴木工業(株) 鈴木 忠臣
TEL 0533-69-3663, FAX 0533-65-9520

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974

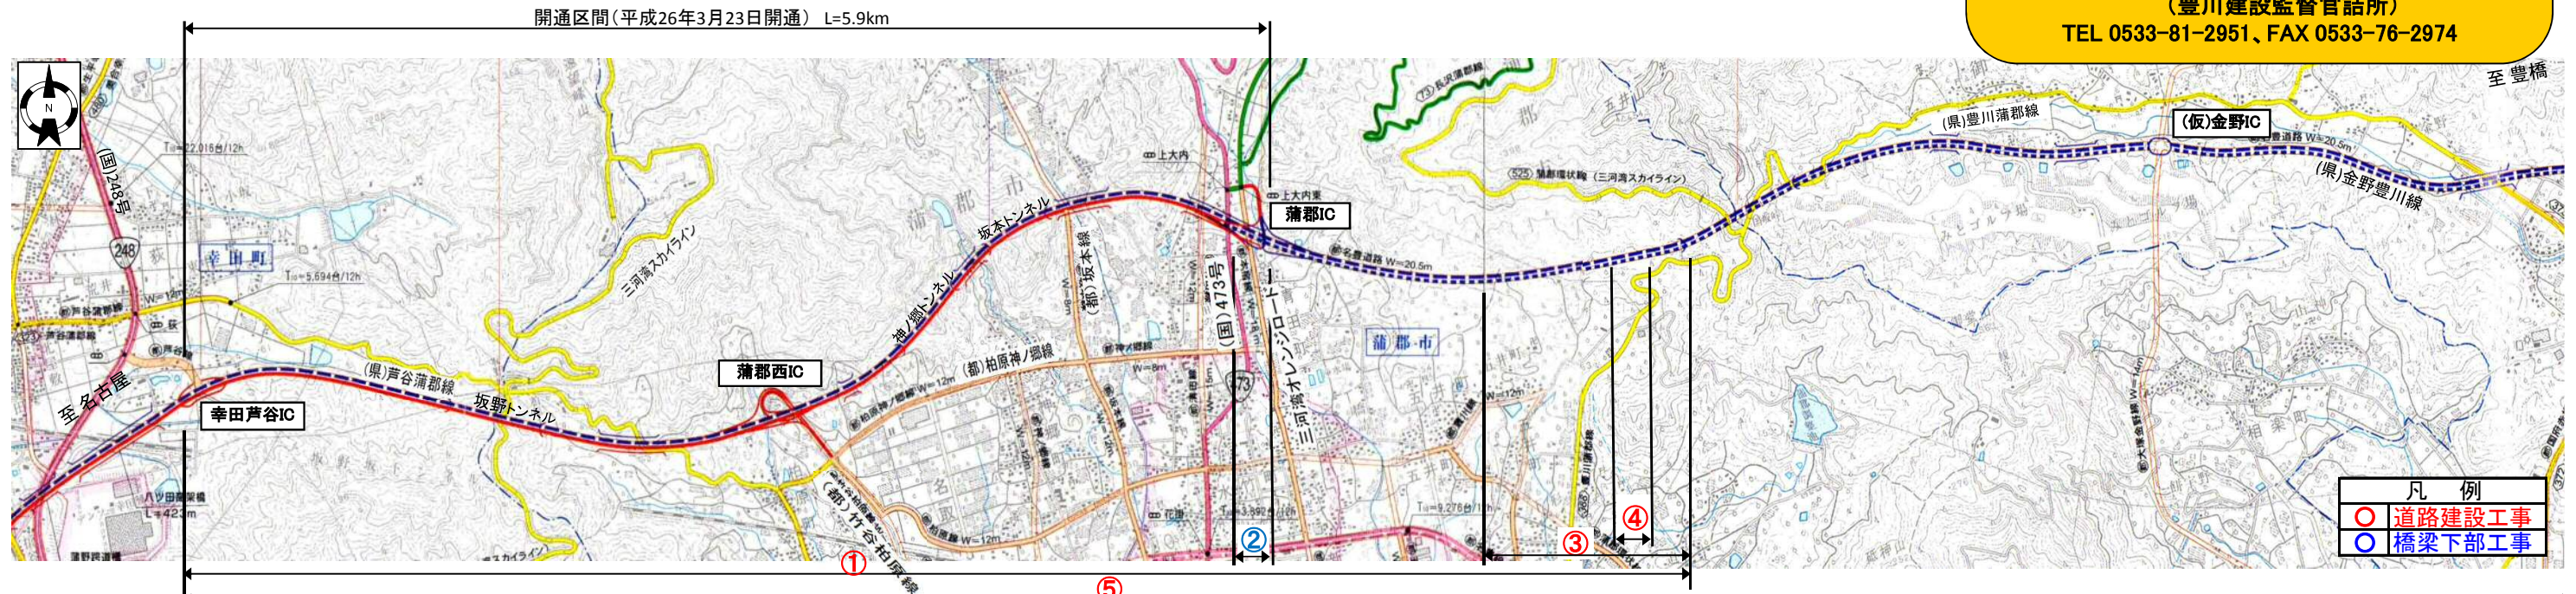

①

工事名	平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事
工期	平成26年3月18日～平成27年3月27日
施工業者	長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590, FAX 0533-65-8591
2月末時点進捗率	92%
3月作業内容	清田地区排水構造物、舗装、防護柵、区画線
工事概要	蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります
	豊橋側より名古屋側を望む(7号橋)

②

工事名	平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事
工期	平成26年3月25日～平成27年3月25日
施工業者	山旺建設(株) TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093
2月末時点進捗率	93%
3月作業内容	足場解体、市道復旧
工事概要	蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります
	名古屋側より豊橋側を望む

③

工事名	平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事
工期	平成26年3月21日～平成27年2月27日
施工業者	磯工メノ
2月末時点進捗率	100%
3月作業内容	-
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるための山の掘削と工事用道路をつくりました
	名古屋側より豊橋側を望む

完成しました!

④

工事名	平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事
工期	平成26年5月2日～平成27年3月25日
施工業者	鈴木工業(株) TEL 0533-69-3663, FAX 0533-65-9520
2月末時点進捗率	93%
3月作業内容	掘削、法面、舗装
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します
	名古屋側より豊橋側を望む

⑤

工事名	平成26年度 23号蒲郡BP整備工事
工期	平成26年6月19日～平成27年3月27日
施工業者	サンエイ(株) TEL 0533-67-3340, FAX 0533-67-3341
2月末時点進捗率	62%
3月作業内容	掘削、排水構造物、舗装
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します
	名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
私どもの工事は、蒲郡市五井町にて、バイパス本線の山の掘削・土砂搬出及び排水路をつくる工事で、昨年6月中旬より立木の伐採を始め、7月下旬から約5万m³の掘削・土砂搬出を開始し、「雨にも負けず、風にも負けず…いや台風には負けました」が、順調に工事が進み、排水路2基を完成し工事はほぼ完了しました。
工事完成まで残り1か月をきりましたが、最後まで無事故・無災害記録を更新できるよう安全第一で工事を進めて参ります。
今後も、蒲郡バイパスの工事が続きますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。



5号排水路コンクリート打設状況



5号排水路完成
