

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。




蒲郡バイパス 工事便り



発行 第35号
平成27年4月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長:サンエイ(株) 高原 俊之

監修:名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

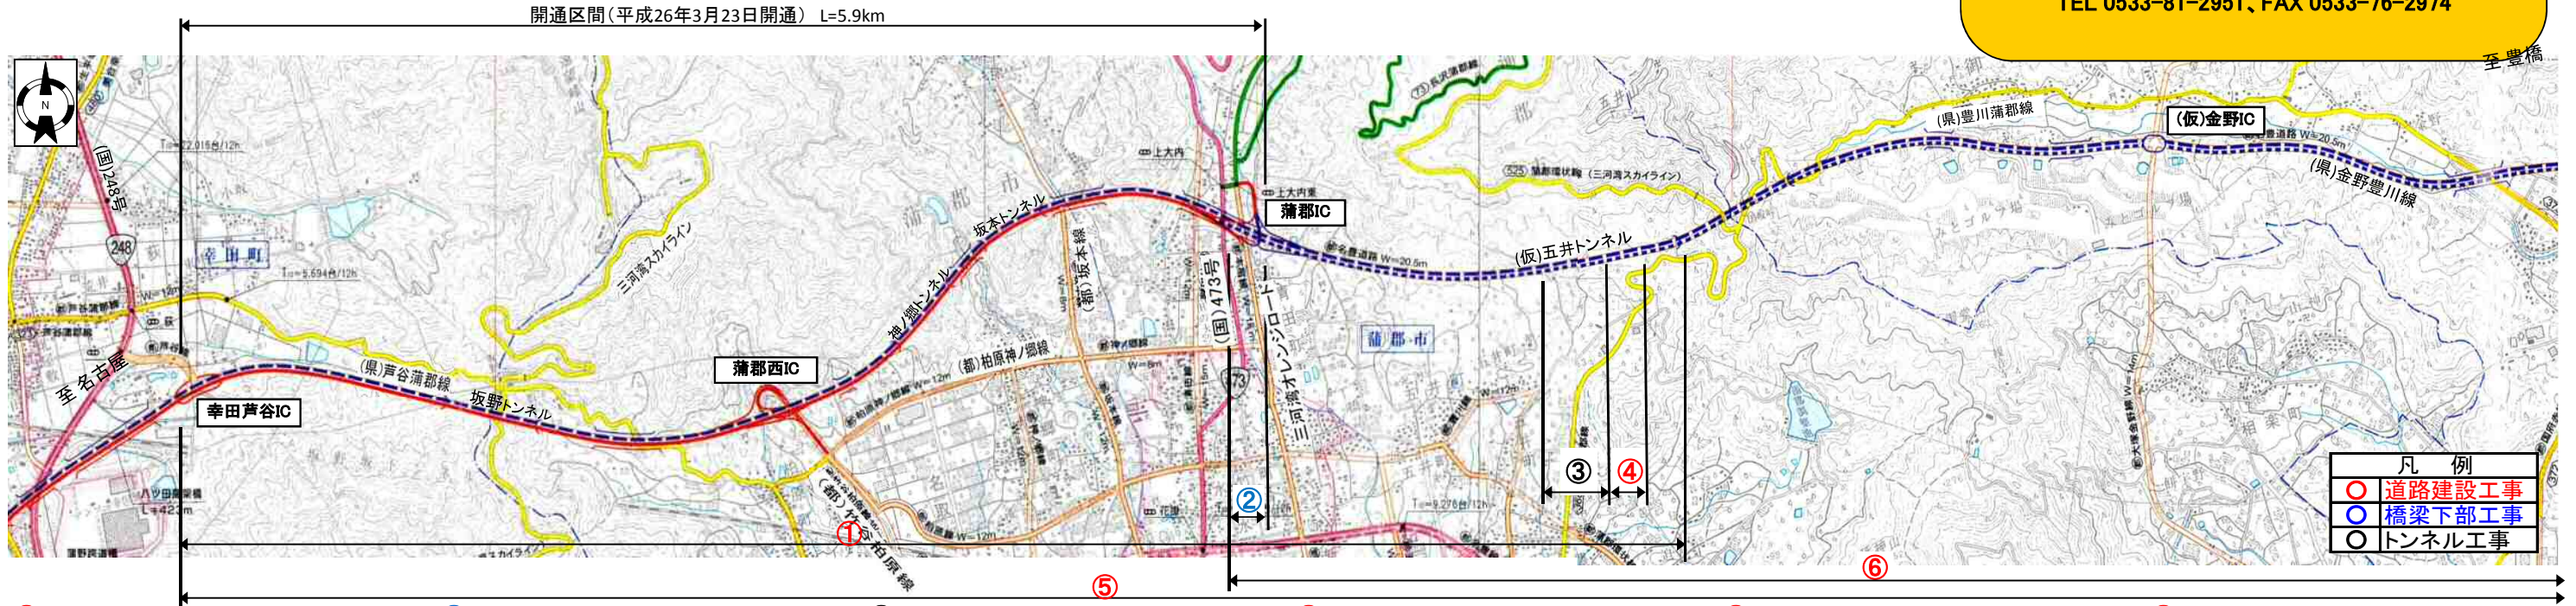

①	②	③	④	⑤	⑥
工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事 工 期 平成26年3月18日～平成27年3月27日 施 工 業 者 長坂建設興業 ㈱ 3月末時点 進捗率 100% 4月作業内容 - 工 事 概 要 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくりました  名古屋側より豊橋側を望む(7号橋) 完成しました！	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事 工 期 平成26年3月25日～平成27年3月25日 施 工 業 者 山旺建設㈱ 3月末時点 進捗率 100% 4月作業内容 - 工 事 概 要 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくりました  名古屋側より豊橋側を望む 完成しました！	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 工 期 平成27年2月21日～平成28年3月25日 施 工 業 者 ㈱鴻池組 連絡先未定 3月末時点 進捗率 0% 4月作業内容 準備工 工 事 概 要 蒲郡市五井町でトンネルをつくります  豊橋側より名古屋側を望む 新規工事です！	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事 工 期 平成26年5月2日～平成27年3月25日 施 工 業 者 鈴中工業㈱ 3月末時点 進捗率 100% 4月作業内容 - 工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削しました  名古屋側より豊橋側を望む 完成しました！	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP整備工事 工 期 平成26年6月19日～平成27年3月27日 施 工 業 者 サンエイ㈱ 3月末時点 進捗率 100% 4月作業内容 - 工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削しました  名古屋側より豊橋側を望む 完成しました！	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事 工 期 平成27年3月7日～平成27年12月20日 施 工 業 者 長坂建設興業 ㈱ 連絡先未定 3月末時点 進捗率 0% 4月作業内容 準備工 工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します  豊橋側より名古屋側を望む 新規工事です！

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は、工事範囲が豊川市為当町～額田郡幸田町と広範囲にわたる工事で、各現場への移動に時間を要するため、迅速な対応を常に心がけ工事を進めました。至らない点もあったとは思いますが、無事工事を終え、地元の皆様の温かさを感じる事ができました。

工事期間中は地元の皆様、周辺道路を利用される皆様には大変ご迷惑をおかけしたと思いますが、皆様のご理解とご協力のおかげで無事工事を完了する事ができました。

今後も、蒲郡バイパスの工事が続きますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。



名古屋側より豊橋側を望む(施工中)

平成26年度 23号蒲郡BP整備工事 サンエイ(株) 現場代理人 高原 俊之



蒲郡バイパス 工事便り




発行 第36号
平成27年5月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長: 株式会社鴻池組 酒井康至
TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km

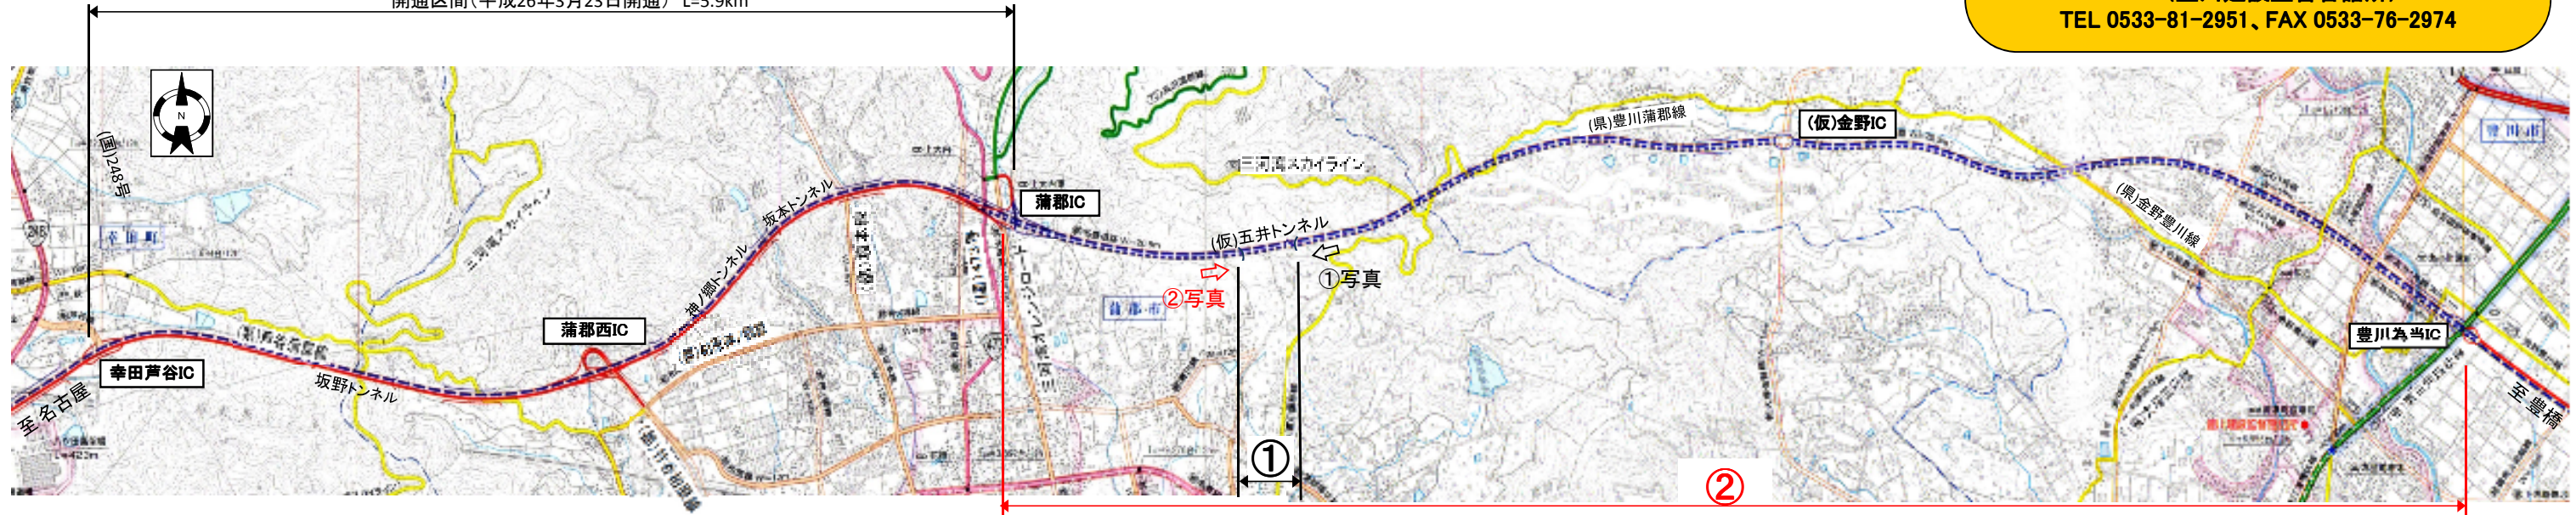

凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
工 期	平成27年2月21日～平成28年3月25日
施 工 業 者	(株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
4月末時点 進捗率	0%
5月作業予定	準備工
工 事 概 要	・蒲郡市五井町でトンネルをつくります ・工事は5月下旬から着手予定です
	
豊橋側より名古屋側を望む	

②

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
工 期	平成27年3月7日～平成27年12月20日
施 工 業 者	長坂建設興業 (株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
4月末時点 進捗率	0%
5月作業予定	掘削
工 事 概 要	・蒲郡市五井町でバイパス本線をつくる ために山を掘削します ・工事は5月上旬から着手予定です
	
名古屋側より豊橋側を望む	

編集長からひと言


平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、蒲郡市五井町の五井山においてトンネル工事の施工を行うこととなりました。鴻池組と申します。トンネル延長は299mで、名古屋側から豊橋側へ向けて掘っていきます。

当面は、豊橋側においてトンネルの準備工事を行い、5月末頃から土工事や構造物工事等を進め、トンネルの掘削開始時期が9月頃になる予定です。

今後、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 株式会社鴻池組 現場代理人 酒井 康至

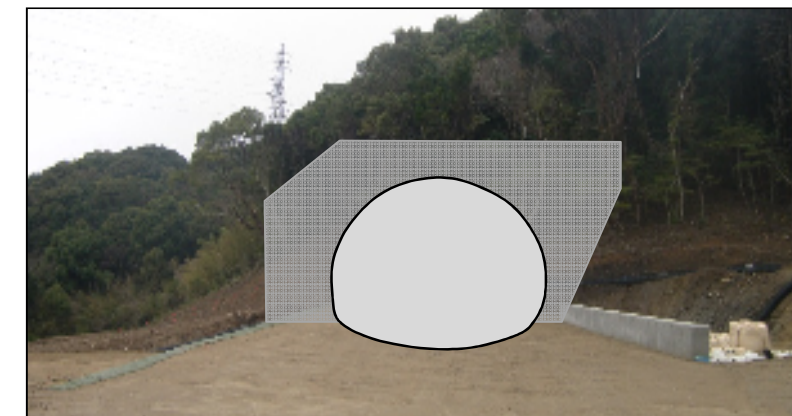

豊橋側より名古屋側を望む(完成イメージ)



蒲郡バイパス 工事便り



発行 第37号
平成27年6月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長:長坂建設興業株式会社 鈴木達郎
TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591

監修:名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
工 期	平成27年2月21日～平成28年3月25日
施 工 業 者	(株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
5月末時点 進捗率	0%
6月作業予定	準備工
工 事 概 要	・蒲郡市五井町でトンネルをつくり ます。 ・6月より伐採工事に着手します。



豊橋側より名古屋側を望む

②

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
工 期	平成27年3月7日～平成27年12月20日
施 工 業 者	長坂建設興業 (株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
5月末時点 進捗率	1.5%
6月作業予定	掘削・土砂搬出
工 事 概 要	・蒲郡市五井町でバイパス本線をつ くるために山を掘削しています ・5月から土砂掘削を開始しました。



名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、蒲郡市五井町の五井山において掘削工事の施工を行うこととなりました長坂建設興業(株)と申します。私どもの工事は、工事範囲が豊川市為当町から蒲郡市清田町と広範囲にわたる工事のため各所にて工事を実施します。尚、工事については、迅速かつ丁寧に進めることを心がけます。

当面は、五井地区にて掘削・土砂搬出工事を、8月末頃まで実施予定です。

今後、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事 長坂建設興業(株) 現場代理人 鈴木 達郎



土砂掘削状況



機械による石の破碎状況



蒲郡バイパス 工事便り



発行 第38号
平成27年7月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長: 株式会社鴻池組 酒井康至
TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
工 期	平成27年2月21日～平成28年3月25日
施 工 業 者	(株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
6月末時点 進捗率	1.0%
7月作業予定	準備工(仮設道路工事)
工 事 概 要	・蒲郡市五井町でトンネルをつくります。 ・7月から東(豊橋)側で仮設道路工事を開始します。



豊橋側より名古屋側を望む

②

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
工 期	平成27年3月7日～平成27年12月20日
施 工 業 者	長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
6月末時点 進捗率	5.8%
7月作業予定	掘削・土砂搬出
工 事 概 要	・蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削しています



名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

トンネル工事を担当する鴻池組です。6月より五井山東(豊橋)側において、伐採工事に着手しております。引き続き、伐採工事の方を進めていき、今後はトンネル工事の準備として、仮設道路工事・トンネル坑口付近の事前準備工事へ順次入っていく予定です。

当社としては、雨にも風にも暑さにも負けず、頑張っていきます!

今後、地域の皆様には何かとご不便・ご面倒をお掛けすると存じますが、引き続き当工事へのご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 株式会社鴻池組 現場代理人 酒井 康至



伐採状況



係員の髙橋です。
今年度入社した新入社員です。まだまだ力不足ですが、若さでカバーしていきますのでよろしくお願いいたします。



係員の中村です。
昨年度入社した新人です。現場を担当しています。工事中は色々ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

若手職員紹介



蒲郡バイパス 工事便り




発行 第39号
平成27年8月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長:長坂建設興業株式会社 鈴木達郎
TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591

監修:名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km

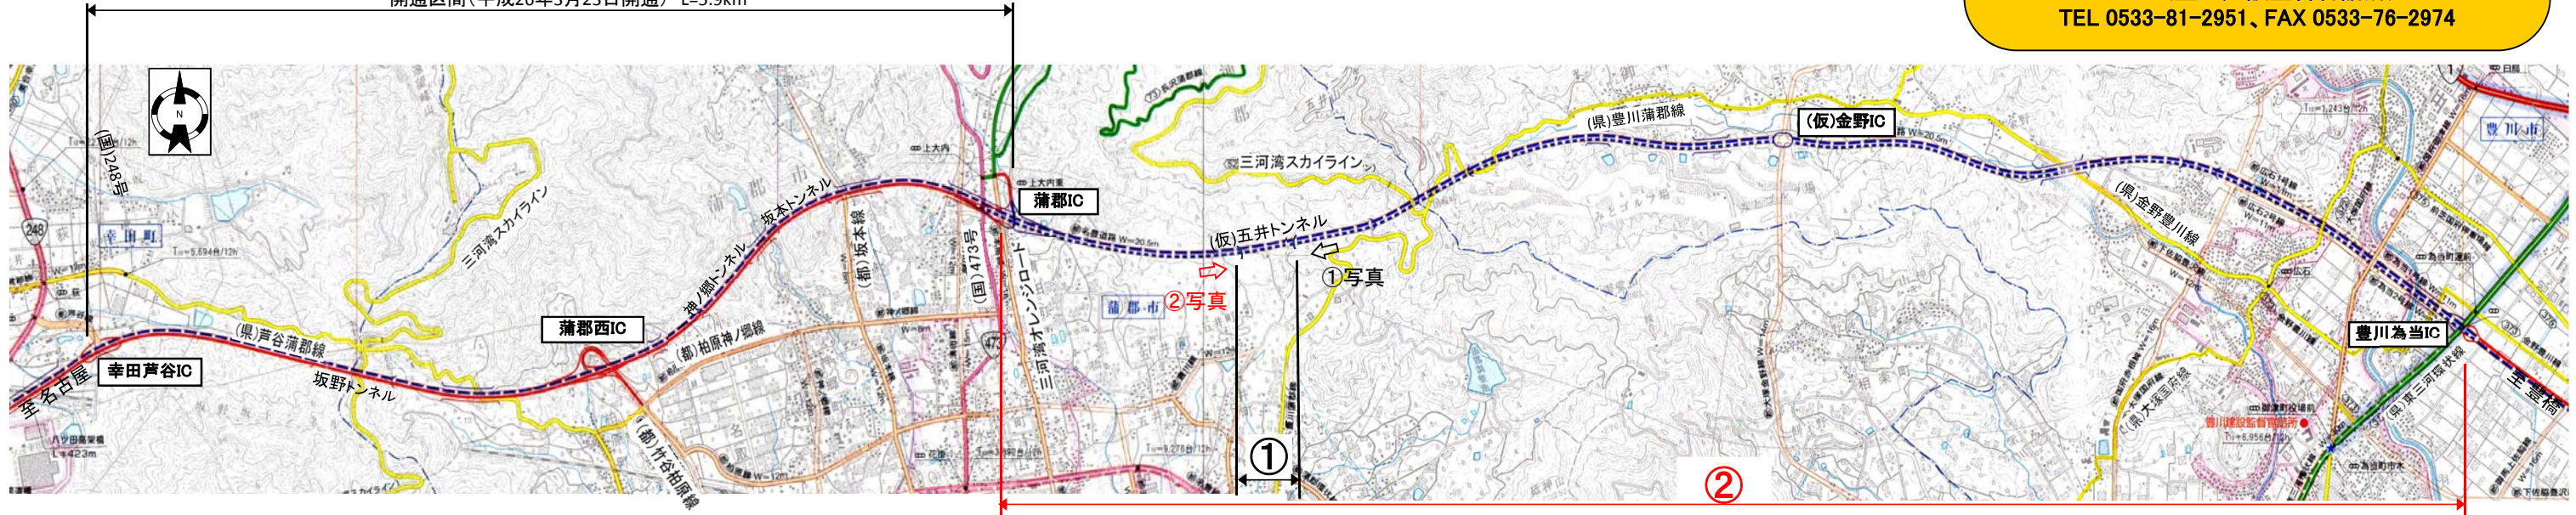

凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
工 期	平成27年2月21日～平成28年3月25日
施 工 業 者	(株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
7月末時点 進捗率	1.2%
8月作業予定	土工事・構造物工事
工 事 概 要	・蒲郡市五井町でトンネルをつくります。 ・現在東側で沈砂池を施工しています。 ・今後は土工事に着手していきます。



豊橋側より名古屋側を望む

②

工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
工 期	平成27年3月7日～平成27年12月20日
施 工 業 者	長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
7月末時点 進捗率	22.3%
8月作業予定	掘削・土砂搬出
工 事 概 要	・蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削しています



名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

引き続き、蒲郡市五井町の五井山において掘削工事の施工を行っております長坂建設興業(株)です。5月から掘削・土砂搬出工事を行い、予定数量30,000m³搬出のうち20,000m³搬出しました。

残り10,000m³ですが、8月末頃を目標に搬出します。

今後も、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事 長坂建設興業(株) 現場代理人 鈴木 達郎

ちょっとした工夫



移動式簡易トイレの使用

当現場は、五井地区のほかに、清田・神之郷地区等で軽作業を行うことがあります。

その時に困るのが、トイレ事情です。この問題を解決するため、軽トラにトイレが搭載されている移動式簡易トイレを活用しています。
