



蒲郡バイパス 平成27年10月 工事便り




発行 第41号
平成27年10月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長：長坂建設興業株式会社 鈴木達郎
TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591

監修：名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km

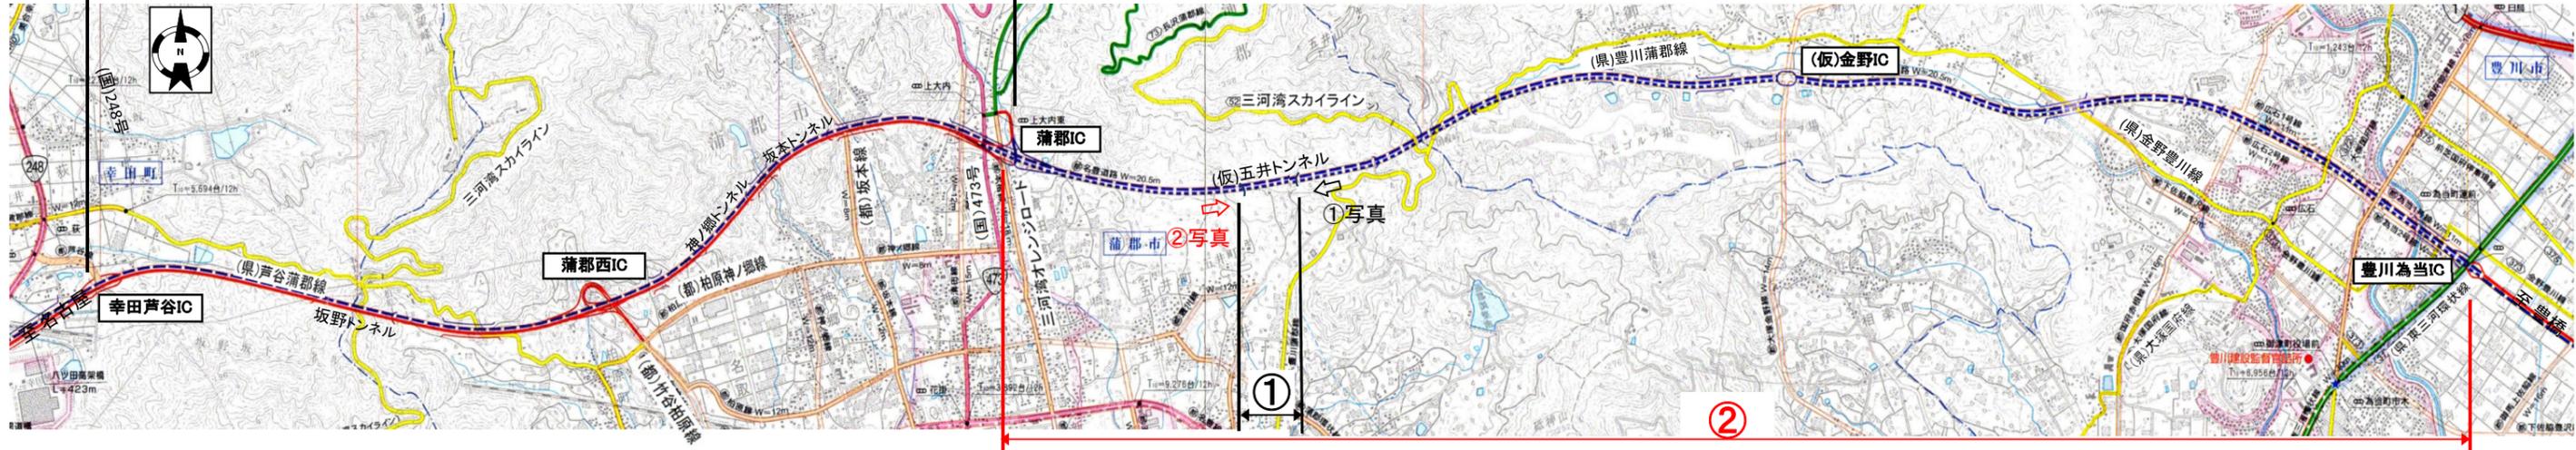

凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①	工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
	工 期	平成27年2月21日～平成28年7月8日
	施 工 業 者	(株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
	9月末時点 進捗率	4.9%
	10月作業予定	トンネル仮設備、構造物・土工事
	工 事 概 要	・蒲郡市五井町でトンネルをつくり ます。 ・10月より10月の掘削を開始します。



豊橋側より名古屋側を望む

②	工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
	工 期	平成27年3月7日～平成27年12月20日
	施 工 業 者	長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
	9月末時点 進捗率	67.4%
	10月作業予定	法面工・擁壁工
	工 事 概 要	蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるため に山を掘削しました。



名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

蒲郡市五井町の五井山において、掘削工事の施工を行ってまいりました、長坂建設興業(株)です。5月から掘削・土砂搬出工事を行い、予定数量30,000m³を9月上旬に、搬出完了しました。

引き続き、国坂峠側(仮)五井トンネル東側)において法面工と擁壁工を施工いたします。今年度中の完成を目標に、施工してまいります。

今後も、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事 長坂建設興業(株) 現場代理人 鈴木 達郎

着手前(5月上旬)



掘削完了(9月上旬)

