



沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 平成28年1月 工事便り




発行 第44号
平成28年1月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長: 株式会社 鴻池組 酒井康至
TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km

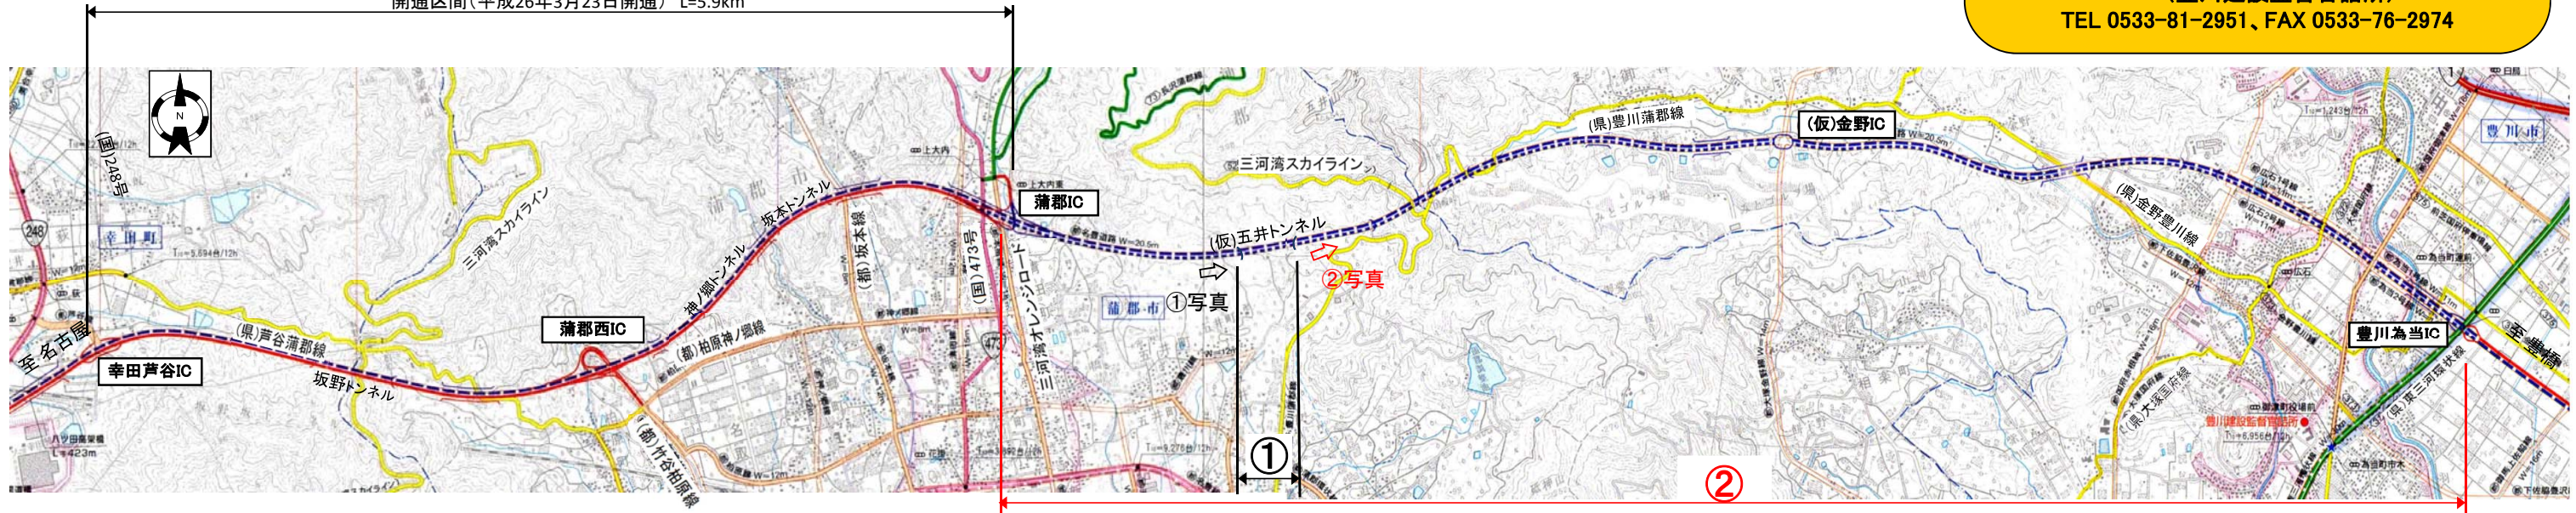

凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
工 期	平成27年2月21日～平成28年7月8日
施 工 業 者	(株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
12月末時点 進捗率	24.2%
1月作業予定	トンネル工、構造物・土工事
工 事 概 要	蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：69m/299m】



名古屋側より豊橋側を望む

②	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
工 期	平成27年3月7日～平成28年2月29日
施 工 業 者	長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
12月末時点 進捗率	85.8%
1月作業予定	法面工・擁壁工
工 事 概 要	蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁をつくっています。



名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

蒲郡市五井町の五井山において、トンネル工事を行っております株式会社鴻池組です。新年を迎え、いよいよトンネルの貫通に向け工事本格化してまいります。工事関係者一同安全作業に心掛けていく所存でございます。

今回は、トンネル工事の掘削方法の概要について紹介したいと思います。本トンネルは、大型機械により掘削を行います。掘削が完了したら、支保工(H-200)を設置し、地山にコンクリート吹付けやロックボルト打込みの補強をしながら、この繰り返し作業でトンネルを掘っていきます。

今後も、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気づきな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 株式会社 鴻池組 現場代理人 酒井康至


機械掘削



支保工設置



コンクリート吹付



ロックボルト打込み



掘削完了

