

沿線地域の皆さまへ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。



蒲郡バイパス 平成28年3月 工事便り




発行 第46号
平成28年3月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長:長坂建設興業株式会社 鈴木達郎
TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591

監修:名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km

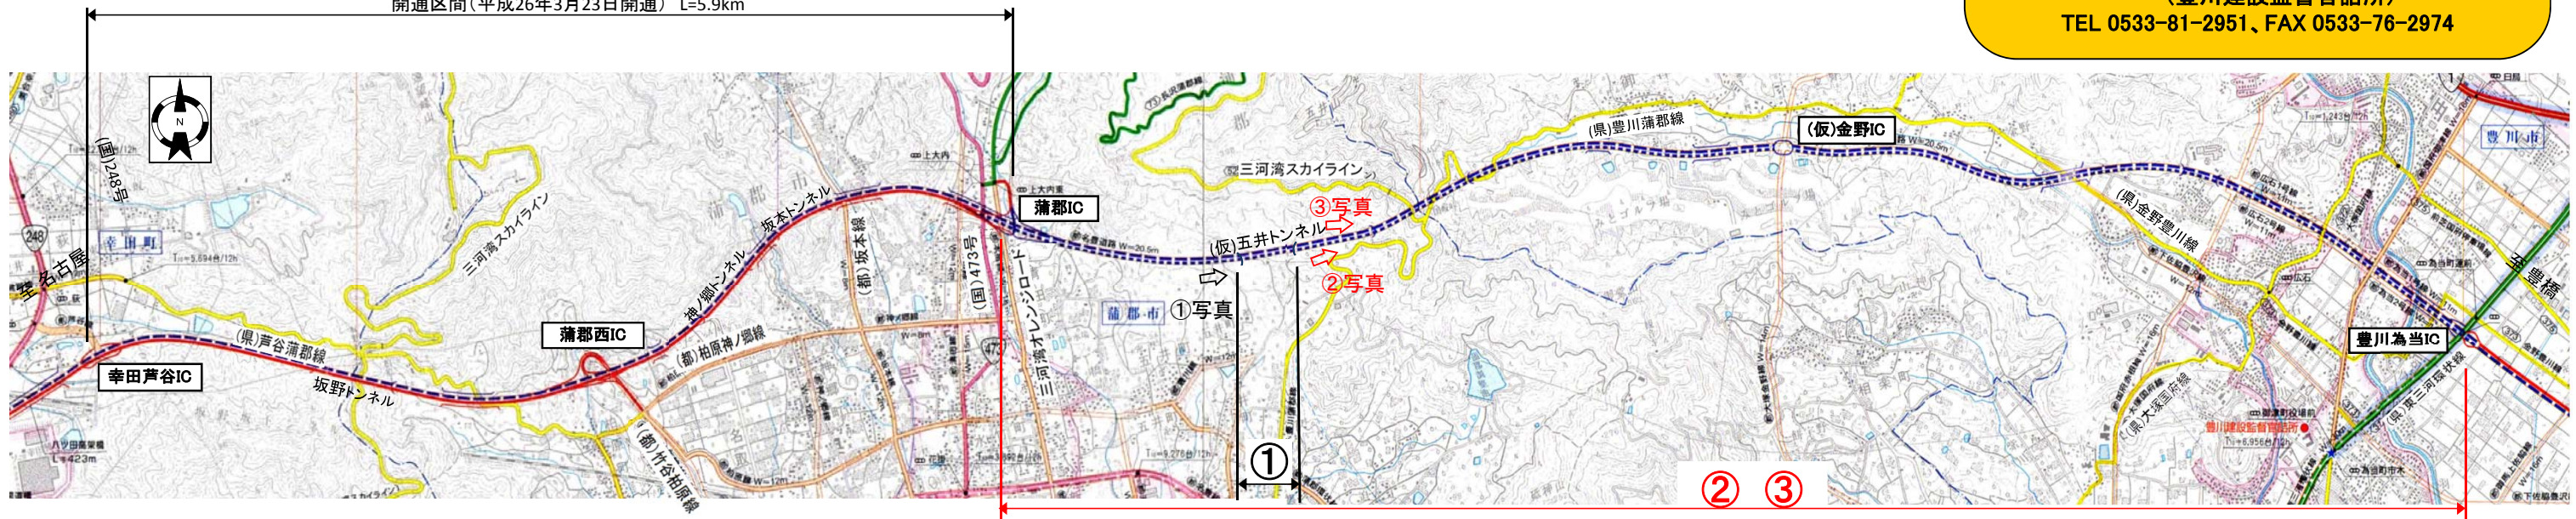

凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①	工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
	工 期	平成27年2月21日～平成28年7月8日
	施 工 業 者	(株)鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
	2月末時点 進捗率	37.1%
	3月作業予定	トンネル工、構造物・土工事
	工 事 概 要	蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗:125m/299m】

②	工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事
	工 期	平成27年3月7日～平成28年3月23日
	施 工 業 者	長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
	2月末時点 進捗率	98.3%
	3月作業予定	後片付け
	工 事 概 要	蒲郡市五井町で擁壁工・落石防護柵工の 後片付けをしています。

③	工 事 名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
	工 期	平成28年1月13日～平成28年9月9日
	施 工 業 者	黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614
	2月末時点 進捗率	0.6%
	3月作業予定	準備工
	工 事 概 要	蒲郡市五井町でバイパス本線の擁壁をつ くっています。



名古屋側より豊橋側を望む



名古屋側より豊橋側を望む



名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

蒲郡市五井町の五井トンネル東側において、工事を行っております長坂建設興業(株)です。昨年5月より五井トンネル西側にて約3万m³の掘削・土砂搬出を開始し、10月より五井トンネル東側にて法面・擁壁工事にも着手しました。工事のほうは順調に進み、ほぼ完了しております。

残りの工事は、後片付けを行って工事完了になります。最後まで、無事故・無災害で安全第一で工事を進めてまいります。地元の皆様には工事期間中、大変ご迷惑をおかけしたかと思ひます。改めてお詫び申し上げますと共に、ご協力心より感謝いたしております。

今後も、蒲郡バイパスの工事は続きます。引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

平成26年度 23号蒲郡BP東部整備工事

長坂建設興業株式会社 現場代理人 鈴木達郎

今回の整備工事で施工した構造物



法面工(切土補強)



落石防護柵工
