



沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 平成28年4月 工事便り




発行 第47号
平成28年4月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長: 株式会社 鴻池組 酒井康至
TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km

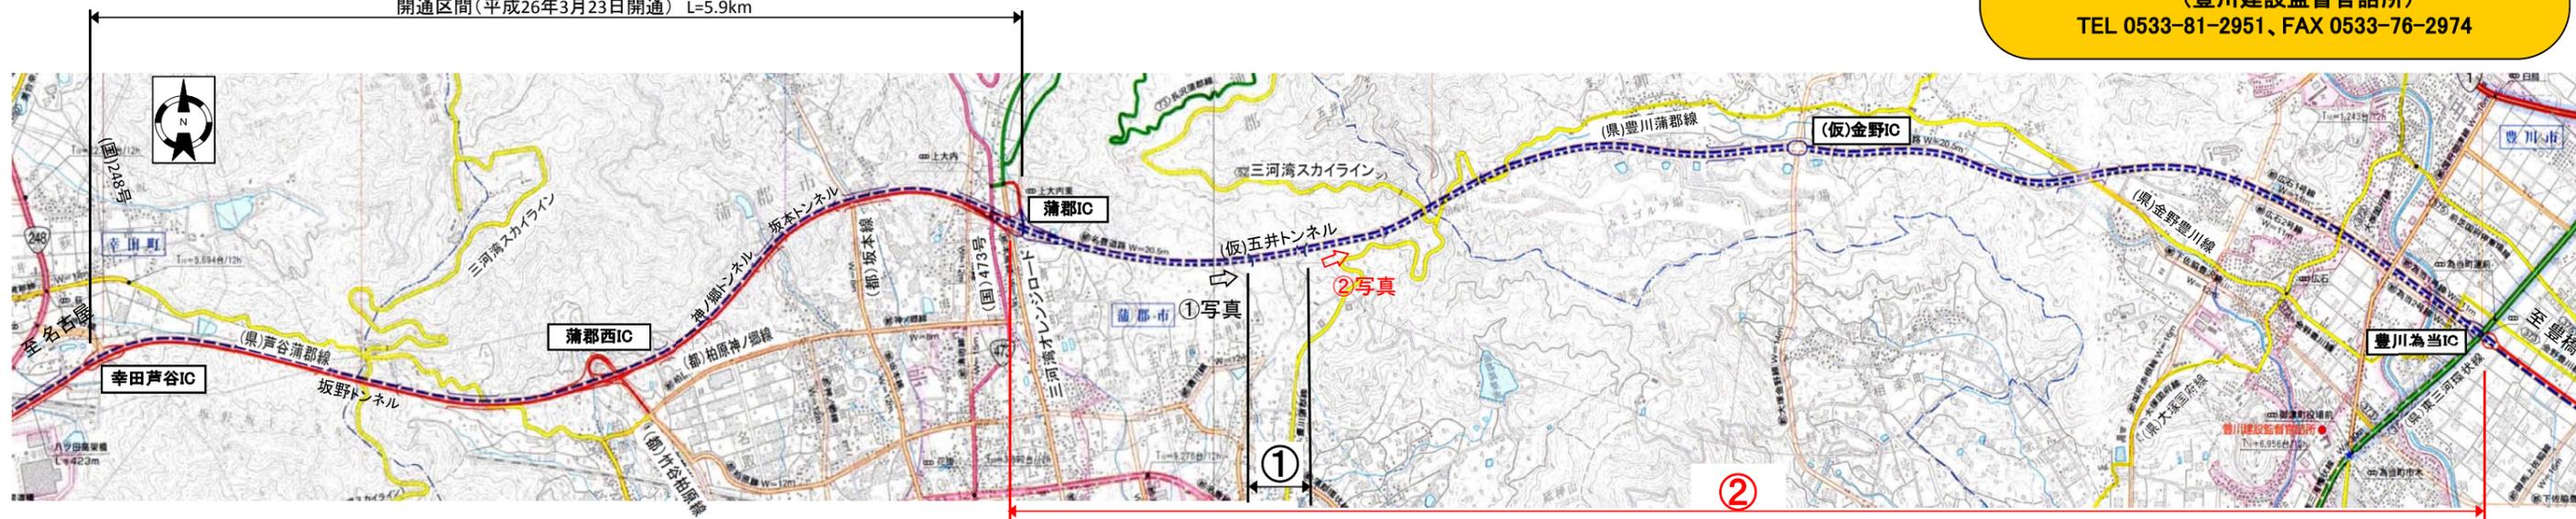

凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事

①	工 事 名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
	工 期	平成27年2月21日～平成28年7月22日
	施 工 業 者	株式会社 鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334
	3月末時点 進捗率	41.3%
	4月作業予定	トンネル工・土工事
	工 事 概 要	蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。



名古屋側より豊橋側を望む

②	工 事 名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
	工 期	平成28年1月13日～平成28年9月9日
	施 工 業 者	黒柳建設 株式会社 TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614
	3月末時点 進捗率	18.6%
	4月作業予定	擁壁工、カルバート工
	工 事 概 要	蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁をつくっています。



名古屋側より豊橋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

蒲郡市五井町の五井山において、トンネル工事を行っております株式会社鴻池組です。トンネル掘削については、土質条件の変更により、補助工法の追加等があり、約半分の150mの掘削が完了しました。今後はトンネルの土被りも徐々に薄くなっていくため、補助工法を併用しながら慎重に掘っていくこととなります。

掘り進めた先の貫通先(東側)の方は、構造物や土工事もほぼ完了し、トンネルの貫通を迎えるだけの準備が整いました。この先も引き続き安全作業で工事を進めてまいります。

今後も、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。また、工事中に何かお気づきな点等がございましたら、気軽にお声をお掛け下さい。

平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 株式会社 鴻池組 現場代理人 酒井康至



トンネル切羽(先端)



トンネル貫通側(東側)
