

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


蒲郡バイパス 平成28年6月 工事便り



発行 第49号
平成28年6月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
編集長：株式会社近藤組 近藤 武
TEL 0533-75-6827、FAX 0533-75-6837

監修：名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)

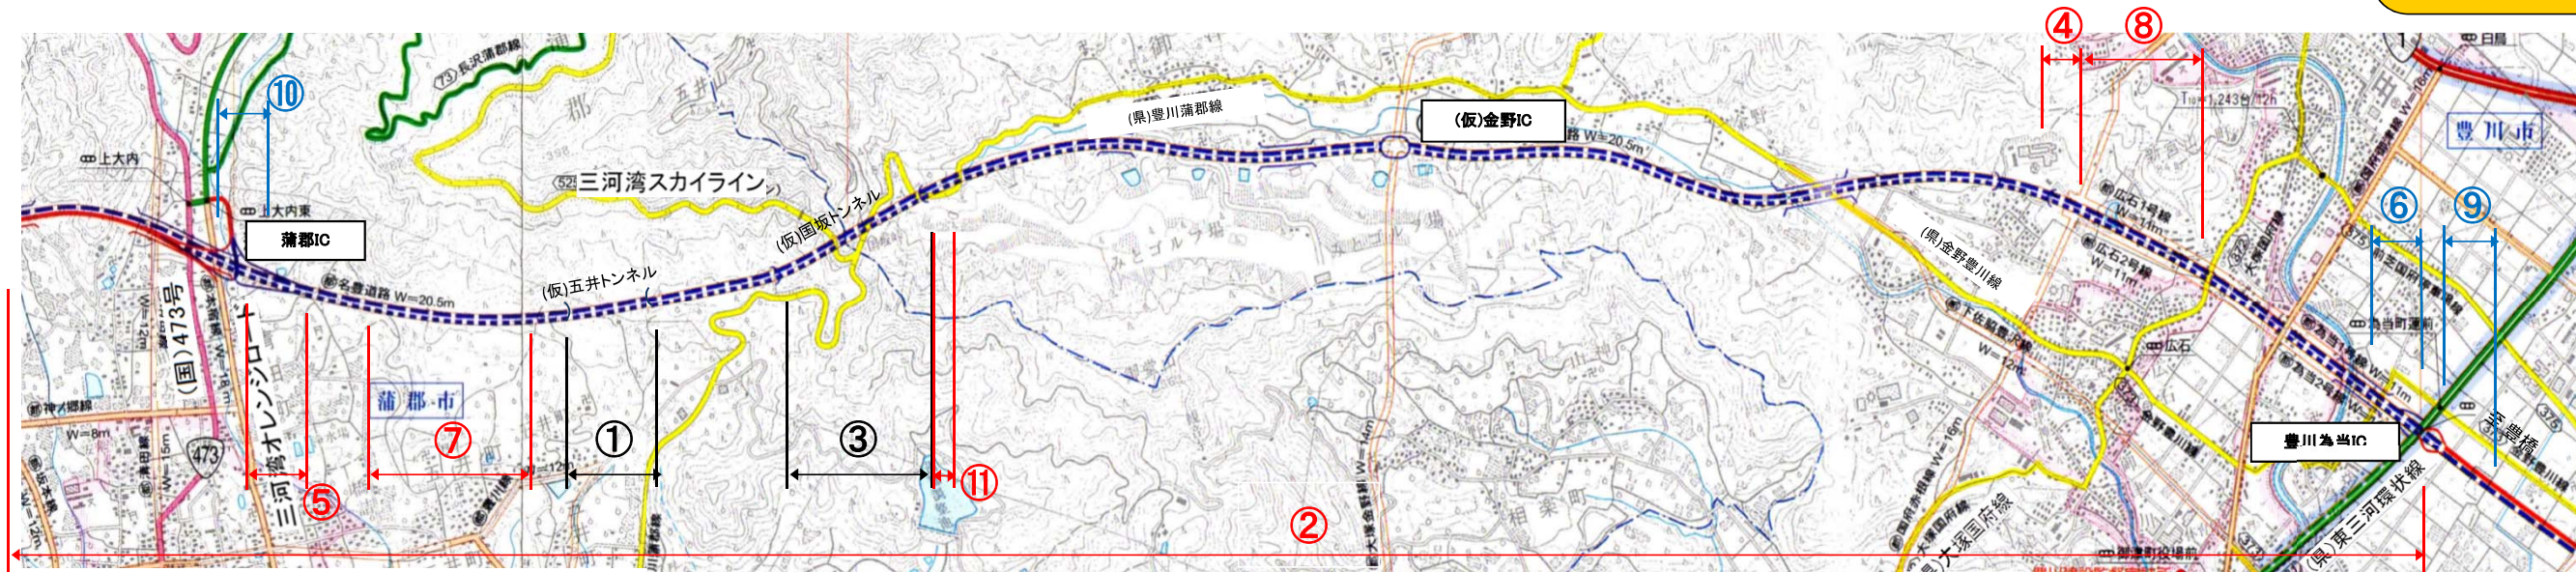

凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事
○	橋梁下部工事

① 工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 工 期 平成27年2月21日～平成28年7月22日 施 工 業 者 (株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333、FAX 0533-67-4334 5月末時点 進捗率 57.3% 6月作業予定 トンネル工・坑門工・土工 工 事 概 要 蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：240m/299m】  名古屋側より豊橋側を望む	② 工 事 名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 工 期 平成28年1月13日～平成28年9月9日 施 工 業 者 黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613、FAX 0533-56-7614 5月末時点 進捗率 35.2% 6月作業予定 道路土工・擁壁工・カルバート工 工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁をつくっています。  名古屋側より豊橋側を望む	③ 工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事 工 期 平成28年2月26日～平成30年3月20日 施 工 業 者 大日本土木(株) TEL 0533-75-6531、FAX 0533-75-6537 5月末時点 進捗率 0.2% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：0m/678m】  名古屋側より豊橋側を望む	④ 工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事 工 期 平成28年3月9日～平成28年10月31日 施 工 業 者 (株) ヒメノ TEL 0533-56-7182、FAX 0533-56-7183 5月末時点 進捗率 0.5% 6月作業予定 伐採・埋設物移設 工 事 概 要 豊川市御津町で御津高校のテニスコートをつくっています。  名古屋側より豊橋側を望む	⑤ 工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP清田地区道路建設工事 工 期 平成28年3月17日～平成28年9月15日 施 工 業 者 神野建設(株) TEL 0533-68-5385、FAX 0533-68-5386 5月末時点 進捗率 3.2% 6月作業予定 舗装工・排水工・本体構築・切回し道路施工 工 事 概 要 蒲郡市清田町で横断ボックスをつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む	⑥ 工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事 工 期 平成28年3月17日～平成28年9月15日 施 工 業 者 (株) 近藤組 TEL 0533-75-6827、FAX 0533-75-6837 5月末時点 進捗率 22.3% 6月作業予定 仮設工・場所打杭工 工 事 概 要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む	⑦ 工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 工 期 平成28年3月29日～平成28年9月15日 施 工 業 者 丸洋建設(株) TEL 0564-83-8682、FAX 0564-83-8683 5月末時点 進捗率 4.4% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線の工事用道路をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む
--	--	---	--	---	---	--

⑧ 工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事 工 期 平成28年3月30日～平成29年2月28日 施 工 業 者 岡田建設(株) TEL 0533-56-8582、FAX 0533-56-8583 5月末時点 進捗率 0.3% 6月作業予定 道路土工・撤去工・仮設工 工 事 概 要 豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。  名古屋側より豊橋側を望む	⑨ 工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事 工 期 平成28年3月31日～平成28年9月15日 施 工 業 者 藤城建設(株) TEL 0533-65-9273、FAX 0533-65-9236 5月末時点 進捗率 1.8% 6月作業予定 場所打ち杭 工 事 概 要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。  名古屋側より豊橋側を望む	⑩ 工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事 工 期 平成28年3月30日～平成28年9月15日 施 工 業 者 木村建設(株) TEL 0533-65-9394、FAX 0533-65-9407 5月末時点 進捗率 3.2% 6月作業予定 伐採工・土工 工 事 概 要 蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくっています。  名古屋側より豊橋側を望む	⑪ 工 事 名 平成28年度 23号蒲郡BP金野地区道路建設工事 工 期 平成28年5月10日～平成28年9月15日 施 工 業 者 青山建設(株) TEL 0532-54-6385、FAX 0532-55-1372 5月末時点 進捗率 0.0% 6月作業予定 伐木・除根・木根処分 工 事 概 要 県道368号線から国坂トンネル東側坑口への工事用道路をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む
--	--	---	--

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、為当地区において、豊川為当ICから音羽川までの区間で、橋脚をつくる工事をさせていただきました近藤組(こんどうぐみ)と申します。

6月中旬までは、大型の重機を使用した地下の杭工事を行い、その後は、地上部の柱工事へ進んでまいります。

現場周辺の道路には近隣小中学校の通学路があるため、子供たちに配慮した現場づくりを心掛けてまいります。地元の方々にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

工事中何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声掛け下さい。

⑥ 平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事

(株)近藤組
『ゆめぞう』です

