



沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


蒲郡バイパス 平成28年7月 工事便り



発行 第50号
平成28年7月1日

蒲郡バィス支部工事等安全協議会
編集長：丸洋建設株式会社 三矢裕次郎
TEL0564-83-8682、FAX0564-83-8683

監修：名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

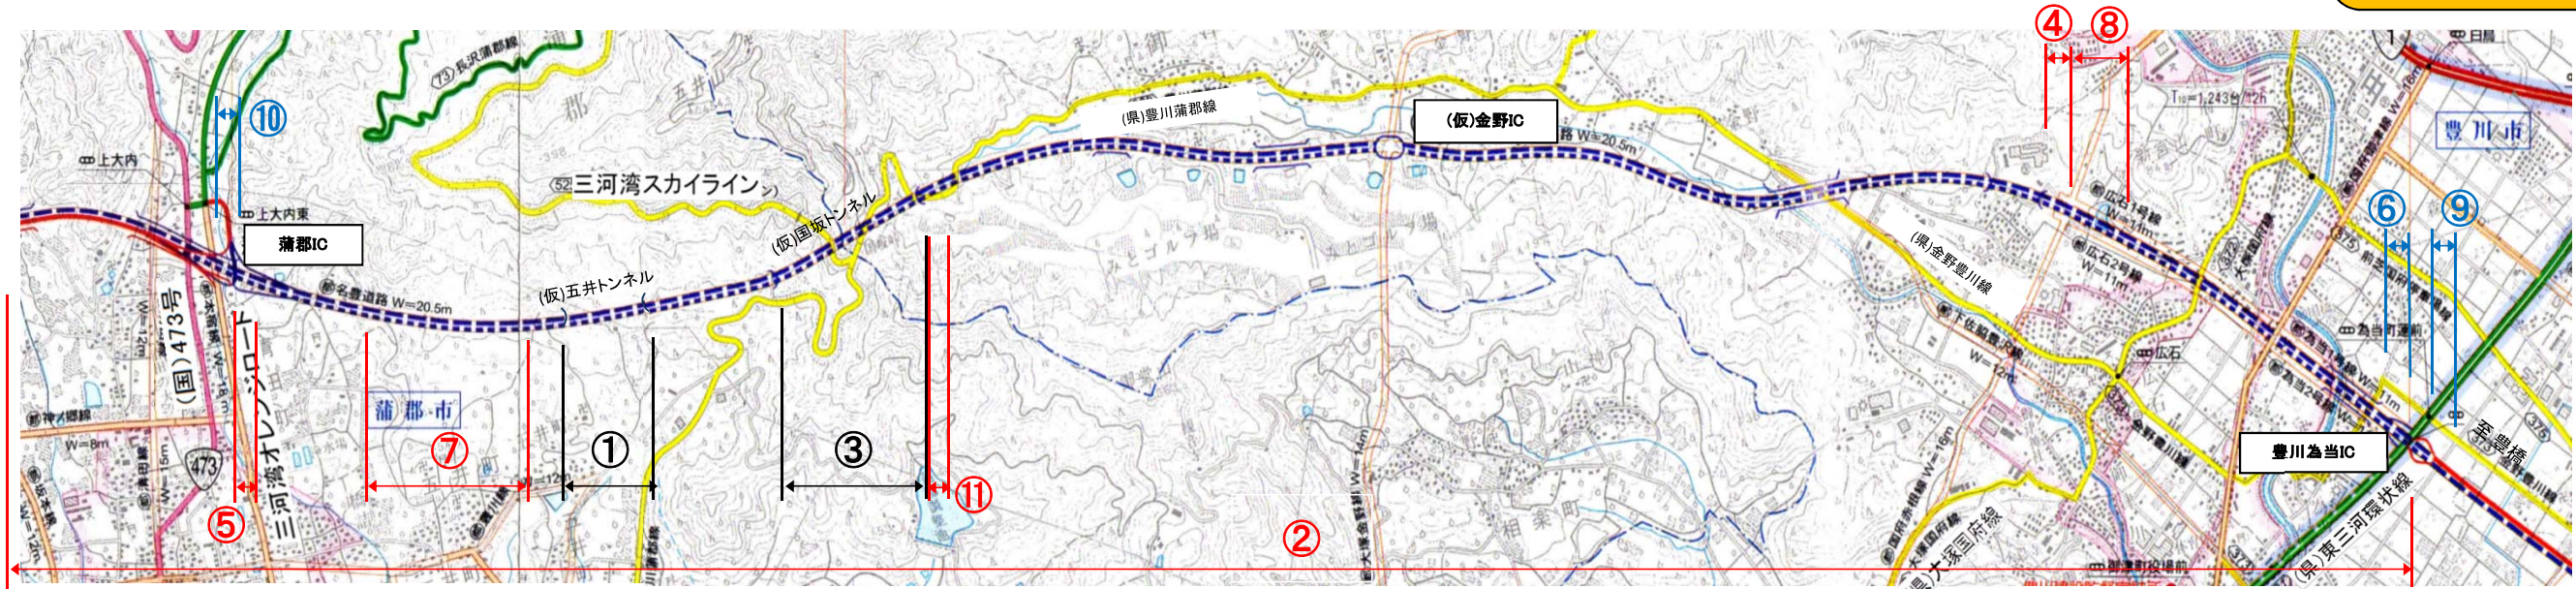

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
工事名 平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 工期 平成27年2月21日～平成28年12月19日 施工業者 (株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333, FAX 0533-67-4334 6月末時点進捗率 66.7% 7月作業予定 トンネル工、坑門工、土工事 工事概要 蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：294m/299m】	工事名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 工期 平成28年1月13日～平成28年9月9日 施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613, FAX 0533-56-7614 6月末時点進捗率 61.0% 7月作業予定 道路土工、擁壁工、カルバート工、排水構造物工 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線沿いの擁壁をつくっています。	工事名 平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事 工期 平成28年2月26日～平成30年3月20日 施工業者 大日本土木(株) TEL 0533-75-6531, FAX 0533-75-6537 6月末時点進捗率 0.3% 7月作業予定 準備工 工事概要 蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：0m/678m】	工事名 平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事 工期 平成28年3月9日～平成28年10月31日 施工業者 (株) ヒメノ TEL 0533-56-7182, FAX 0533-56-7183 6月末時点進捗率 3.5% 7月作業予定 伐採・埋設物移設 工事概要 豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設工事を行っています。	工事名 平成27年度 23号蒲郡BP清田地区道路建設工事 工期 平成28年3月17日～平成28年9月15日 施工業者 神野建設(株) TEL 0533-68-5385, FAX 0533-68-5386 6月末時点進捗率 25.4% 7月作業予定 ネットワーク・床版・本体構築・切戻し道路施工 工事概要 蒲郡市清田町で横断ボックスをつくっています。	工事名 平成27年度 23号蒲郡BP為当第4橋下部工事 工期 平成28年3月17日～平成28年9月15日 施工業者 (株) 近藤組 TEL 0533-75-6827, FAX 0533-75-6837 6月末時点進捗率 54.0% 7月作業予定 仮設工・場所打杭工 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。	工事名 平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 工期 平成28年3月29日～平成28年9月15日 施工業者 丸洋建設(株) TEL 0564-83-8682, FAX 0564-83-8683 6月末時点進捗率 20.5% 7月作業予定 準備工(伐採工)、道路土工 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線の工事用道路をつくっています。
名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む

⑧	⑨	⑩	⑪
工事名 平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事 工期 平成28年3月30日～平成29年2月28日 施工業者 岡田建設(株) TEL 0533-56-8582, FAX 0533-56-8583 6月末時点進捗率 1.3% 7月作業予定 土工事、擁壁工 工事概要 豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グランドをつくっています。	工事名 平成27年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事 工期 平成28年3月31日～平成28年9月15日 施工業者 藤城建設(株) TEL 0533-65-9273, FAX 0533-65-9236 6月末時点進捗率 22.2% 7月作業予定 作業土工、橋脚躯体工 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。	工事名 平成27年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋下部工事 工期 平成28年3月30日～平成28年9月15日 施工業者 木村建設(株) TEL 0533-65-9394, FAX 0533-65-9407 6月末時点進捗率 7.2% 7月作業予定 RC橋脚工 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくっています。	工事名 平成28年度 23号蒲郡BP金野地区道路建設工事 工期 平成28年5月10日～平成28年9月15日 施工業者 青山建設(株) TEL 0533-76-3103, FAX 0533-76-3103 6月末時点進捗率 0.0% 7月作業予定 伐木除根、木根処分、土工事 工事概要 県道368号線から国坂トンネル東側抗口への工事用道路をつくっています。
名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、蒲郡市五井町～清田町において工事用道路をつくる工事をさせていただきます丸洋建設(株)と申します。工事用道路の延長は580mあり、バックホウ、ブルドーザ等の機械を使用して施工を行ってまいります。

5月下旬より伐採工事に着手しており、7月頃からは工事用道路の掘削・盛土を行う予定をしております。

現場周辺の道路は狭いため、工事用車両で通行する際は十分配慮して安全運転に努めてまいります。地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることがあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声掛け下さい。

⑦ 平成27年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 丸洋建設株式会社 現場代理人 三矢裕次郎
