




沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 平成28年11月 工事便り



発行 第54号
平成28年11月1日

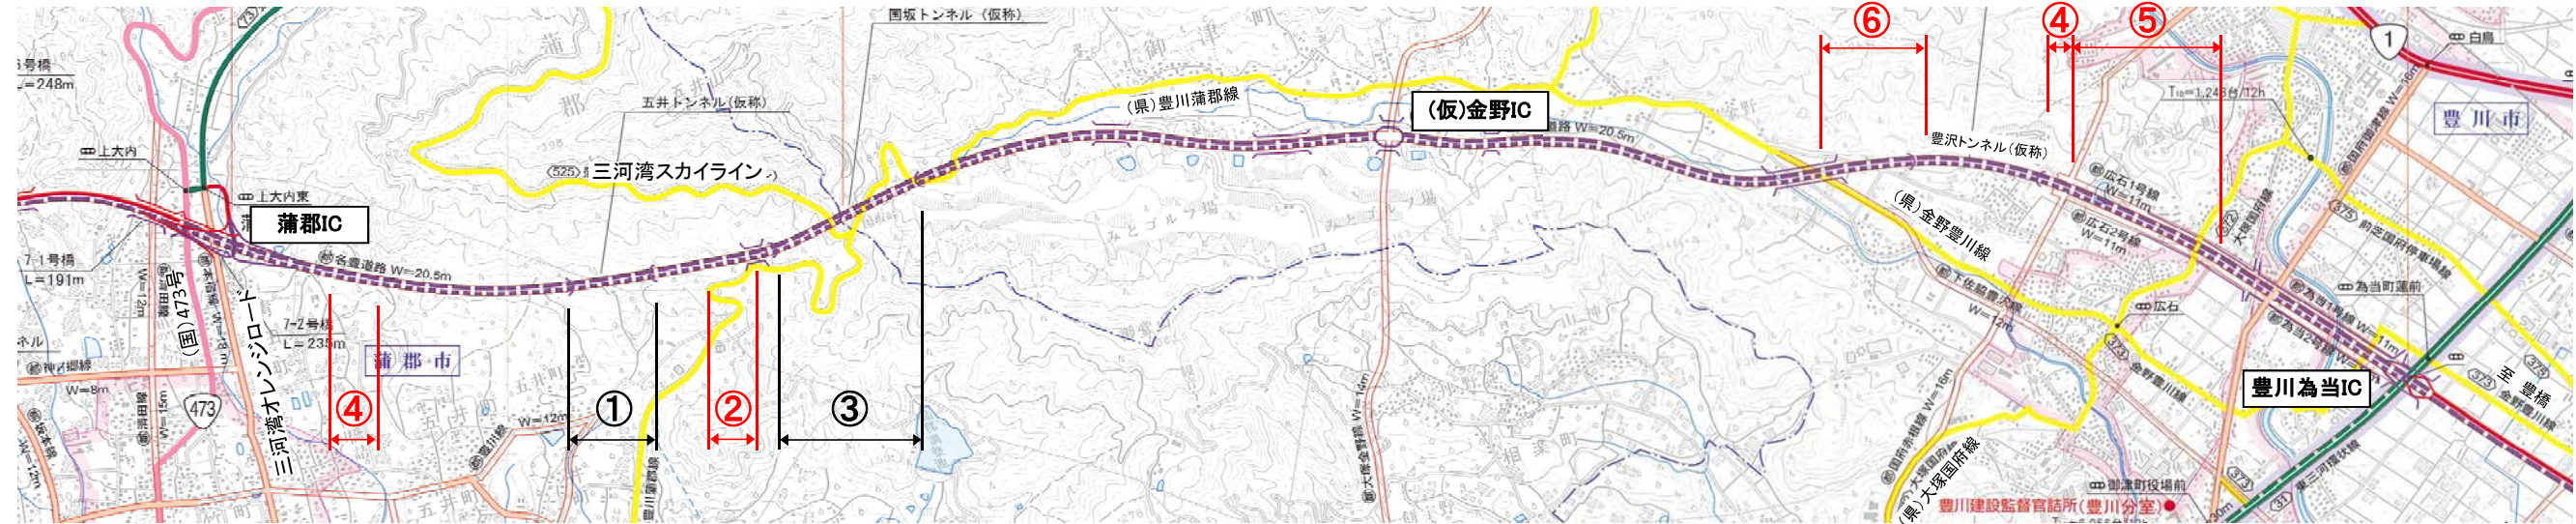


凡例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事


①

工事名	平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事
工期	平成27年2月21日～平成28年12月19日
施工業者	(株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333, FAX 0533-67-4334
10月末時点進捗率	93.1%
11月作業予定	トンネル工
工事概要	蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル覆工：291m/299m】
	
名古屋側より豊橋側を望む	

②

工事名	平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
工期	平成28年1月13日～平成29年3月24日
施工業者	栗柳建設(株) TEL 0533-56-7613, FAX 0533-56-7614
10月末時点進捗率	65.2%
11月作業予定	道路土工、排水構造物工
工事概要	蒲郡市五井町でバイパス本線の盛土工事を行っています。
	
名古屋側より豊橋側を望む	


③

工事名	平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事
工期	平成28年2月26日～平成30年3月20日
施工業者	大日本土木(株) TEL 0533-75-6531, FAX 0533-75-6537
10月末時点進捗率	1.7%
11月作業予定	トンネル掘削工、トンネル残土処理工
工事概要	蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：0m/678m】
	
名古屋側より豊橋側を望む	


④

工事名	平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事
工期	平成28年3月9日～平成28年12月22日
施工業者	(株) ヒメノ TEL 0533-56-7182, FAX 0533-56-7183
10月末時点進捗率	40.0%
11月作業予定	法面工、撤去工
工事概要	豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設工事を行っています。
	
名古屋側より豊橋側を望む	

⑤

工事名	平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事
工期	平成28年3月30日～平成29年2月28日
施工業者	岡田建設(株) TEL 0533-56-8582, FAX 0533-56-8583
10月末時点進捗率	22.0%
11月作業予定	道路土工、排水構造物工
工事概要	豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。
	
名古屋側より豊橋側を望む	

⑥

工事名	平成28年度 23号蒲郡BP豊沢広石道路建設工事
工期	平成28年9月14日～平成29年3月23日
施工業者	長坂建設興業(株) TEL 0533-56-9057, FAX 0533-56-9058
10月末時点進捗率	0.1%
11月作業予定	構造物撤去工、作業土工
工事概要	豊川市御津町豊沢でバイパス本線の工事用道路をつくっています。
	
名古屋側より豊橋側を望む	

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、豊川市御津町内で県立御津高校のテニスコートを移設する工事と新たに清田地区で盛土工事をさせていただいております(株)ヒメノと申します。

御津地区では、10月に山の斜面の掘削・補強がほぼ完了し、11月から既設擁壁の撤去・搬出を行う予定をしております。

また、清田地区では、10月から蒲郡市清田町内で農水管の切回しやバイパスの側道工事に着手しており、11月からは工事排水を調整する沈砂池の設置や農水管の仮廻し等を行う予定をしております。

御津地区及び清田地区の現場とも、周辺道路の利用・特性状況などに十分配慮し、地域優先安全第一の現場を心がけてまいります。

工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

また、工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声掛け下さい。

④ 平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事 株式会社ヒメノ 現場代理人 森野隆二

蒲郡バ 入支部工事等安全協議会

編集長：株式会社ヒメノ 森野隆二
TEL 0533-56-7182, FAX 0533-56-7183

監修：名四国道事務所豊川分室(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974
