



沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


蒲郡バイパス 平成28年12月 工事便り



発行 第55号
平成28年12月1日



凡 例
○ 道路建設工事
○ トンネル工事

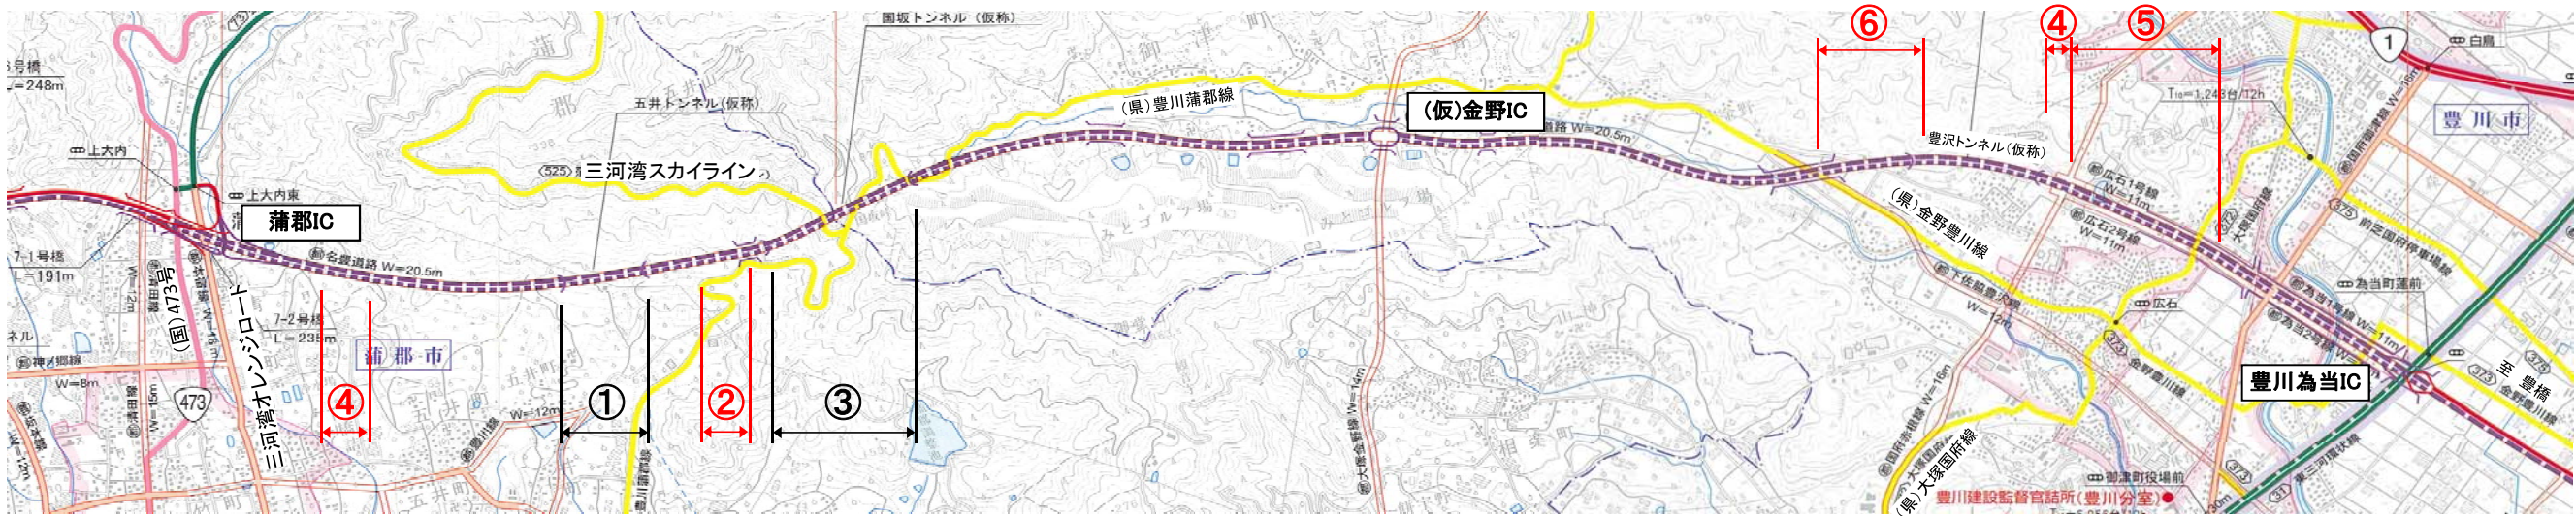

①	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP五井トンネル工事 工 期 平成27年2月21日～平成28年12月19日 施 工 業 者 (株) 鴻池組 TEL 0533-67-4333. FAX 0533-67-4334 11月末時点 進捗率 95. 3% 12月作業予定 トンネル工・仮設備解体 工 事 概 要 蒲郡市五井町でトンネルをつくっています。 【トンネル覆工：291m/299m】  豊橋側より名古屋側を望む
---	--

②	工 事 名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 工 期 平成28年1月13日～平成29年3月24日 施 工 業 者 黒柳建設 (株) TEL 0533-56-7613. FAX 0533-56-7614 11月末時点 進捗率 74. 0% 12月作業予定 道路土工、排水構造物工 工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線の盛土工事を行っています。  名古屋側より豊橋側を望む
---	--

③	工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事 工 期 平成28年2月26日～平成30年3月20日 施 工 業 者 大日本土木 (株) TEL 0533-75-6531. FAX 0533-75-6537 11月末時点 進捗率 5. 0% 12月作業予定 トンネル掘削工、トンネル残土処理工 工 事 概 要 蒲郡市五井町 (国坂峠) でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：25m/678m】  名古屋側より豊橋側を望む
---	--

④	工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事 工 期 平成28年3月9日～平成29年3月30日 施 工 業 者 (株) ヒメノ TEL 0533-56-7182. FAX 0533-56-7183 11月末時点 進捗率 42. 0% 12月作業予定 構造物撤去 (既設杭)、農水、排水、擁壁工 工 事 概 要 豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設工事を行っています。  名古屋側より豊橋側を望む
---	--

⑤	工 事 名 平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事 工 期 平成28年3月30日～平成29年3月31日 施 工 業 者 岡田建設 (株) TEL 0533-56-8582. FAX 0533-56-8583 11月末時点 進捗率 32. 0% 12月作業予定 道路土工、排水構造物工、舗装工 工 事 概 要 豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。  名古屋側より豊橋側を望む
---	--

⑥	工 事 名 平成28年度 23号蒲郡BP豊沢広石道路建設工事 工 期 平成28年9月14日～平成29年3月23日 施 工 業 者 長坂建設興業 (株) TEL 0533-56-9057. FAX 0533-56-9058 11月末時点 進捗率 5. 0% 12月作業予定 伐採工、地盤改良工 工 事 概 要 豊川市御津町豊沢でバイパス本線の工事用道路をつくっています。  名古屋側より豊橋側を望む
---	---

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

蒲郡市五井町山田において、国坂トンネル工事を実施しております大日本土木(株)です。

平成28年10月21日にトンネル工事開始にあたり、安全祈願祭を無事に執り行ないまして、本格的な掘削工事を開始しました。

トンネル延長678mの内、トンネル掘削は現在で約25m程度進んでおり、今後は早期貫通を目指して12月中旬頃より昼夜作業を実施していく予定です。

工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

また、工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽に声掛け下さい。

安全祈願祭



③ 平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事
大日本土木株式会社 現場代理人 岩田 修

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会

編集長：大日本土木株式会社 岩田 修

TEL 0533-75-6531、FAX 0533-75-6537

監修：名四国道事務所豊川分室（豊川建設監督官詰所）

TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974
