





沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。





# 蒲郡バイパス 平成29年4月 工事便り

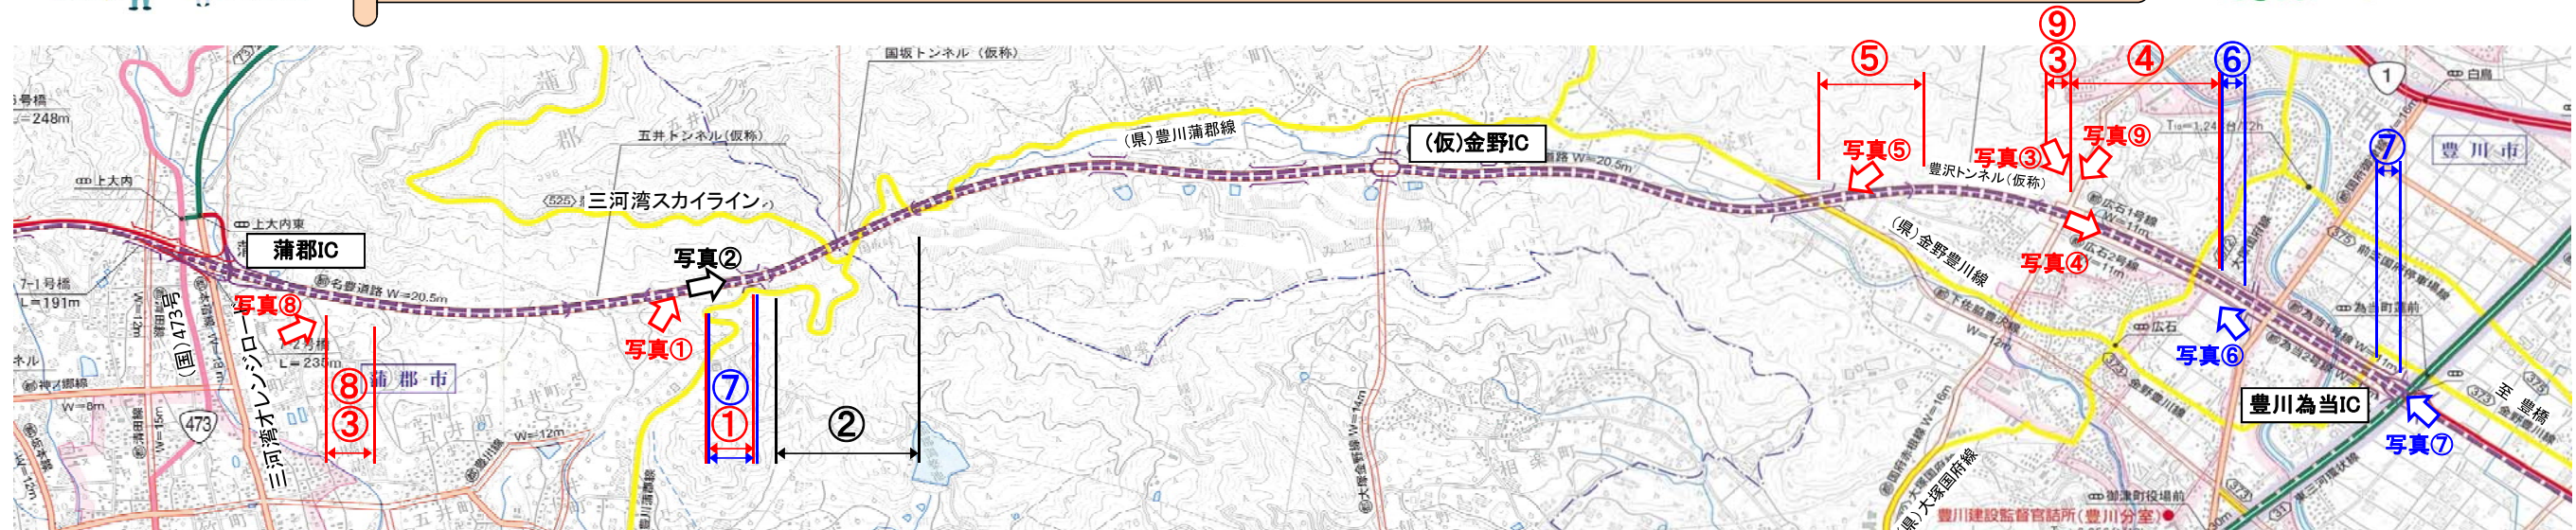

発行 第59号  
平成29年4月1日



凡 例	
○	道路建設工事
○	トンネル工事
○	橋梁下部工事

<p>①</p> <p>工事名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 工 期 平成28年1月13日～平成29年3月24日 施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-56-7613, FAX 0533-56-7614 3月末時点進捗率 100% 4月作業予定 - 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線の盛土工事をしました。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p> <p>完了しました!</p>	<p>②</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事 工 期 平成28年2月26日～平成30年3月20日 施工業者 大日本土木(株) TEL 0533-75-6531, FAX 0533-75-6537 3月末時点進捗率 29.6% 4月作業予定 トンネル掘削工、残土処理工、東側造成工 工事概要 蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗: 237m/678m】</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p> <p>完了しました!</p>	<p>③</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP豊川地区整備工事 工 期 平成28年3月9日～平成29年3月30日 施工業者 (株)ヒメノ TEL 0533-56-7182, FAX 0533-56-7183 3月末時点進捗率 100% 4月作業予定 - 工事概要 豊川市御津町で御津高校のテニスコート移設のための擁壁工事を行いました。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p> <p>完了しました!</p>	<p>④</p> <p>工事名 平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事 工 期 平成28年3月30日～平成29年5月11日 施工業者 岡田建設(株) TEL 0533-56-8582, FAX 0533-56-8583 3月末時点進捗率 61.4% 4月作業予定 道路土工、排水構造物工 工事概要 豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>
---	---	--	---

### 編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、蒲郡市五井町においてバイパス本線の盛土工事と豊川市御津町為当地区で橋梁下部工事をさせていただいております、藤城建設株式会社と申します。

3月より蒲郡市五井町の盛土工事に着手し、豊川市御津町為当地区では測量等の調査を行い、下部工工事の準備を進めています。12月の工事完成を目指し、今後は本格的な工事に着手していく予定です。

工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

また、工事中に何かお気づきな点等がございましたら、気軽にお声掛け下さい。

⑦平成28年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事 藤城建設株式会社 現場代理人 築瀬篤志

<p>⑤</p> <p>工事名 平成28年度 23号蒲郡BP豊川広石道路建設工事 工 期 平成28年9月14日～平成29年3月30日 施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0533-56-9057, FAX 0533-56-9058 3月末時点進捗率 100% 4月作業予定 - 工事概要 豊川市御津町豊川でバイパス本線の道路をつくりました。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p> <p>完了しました!</p>	<p>⑥</p> <p>工事名 平成28年度 23号蒲郡BP広石高架橋下部工事 工 期 平成29年2月17日～平成29年12月15日 施工業者 木村建設(株) TEL 0533-95-1824, FAX 0533-95-1825 3月末時点進捗率 0.0% 4月作業予定 準備工、横断渓流施設工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑦</p> <p>工事名 平成28年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事 工 期 平成29年2月17日～平成29年12月15日 施工業者 藤城建設(株) TEL 0533-95-0636, FAX 0533-95-0637 3月末時点進捗率 8.2% 4月作業予定 道路土工、準備工 工事概要 蒲郡市五井町で盛土工事及び豊川市御津町為当地区で橋梁下部工事をしています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑧</p> <p>工事名 平成28年度 23号五井清田地区道路建設工事 工 期 平成29年3月10日～平成29年12月27日 施工業者 (株)近藤組 TEL 0566-36-1812, FAX 0566-36-1825 3月末時点進捗率 0.0% 4月作業予定 準備工、仮設工 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の盛土工事をしています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑨</p> <p>工事名 平成28年度 23号蒲郡BP金野西地区道路建設工事 工 期 平成29年3月14日～平成29年12月27日 施工業者 (株)ヒメノ TEL 052-935-8571, FAX 052-937-8412 3月末時点進捗率 0.0% 4月作業予定 擁壁工(スキン設置・裏込め) 工事概要 豊川市御津町で御津高校のテニスコートの移設工を行っています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>
--	--	--	--	---

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会  
編集長：藤城建設株式会社 築瀬 篤志  
TEL 0533-95-0636, FAX 0533-95-0637

監修：名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974
