




沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 平成29年5月 工事便り



発行 第60号
平成29年5月1日

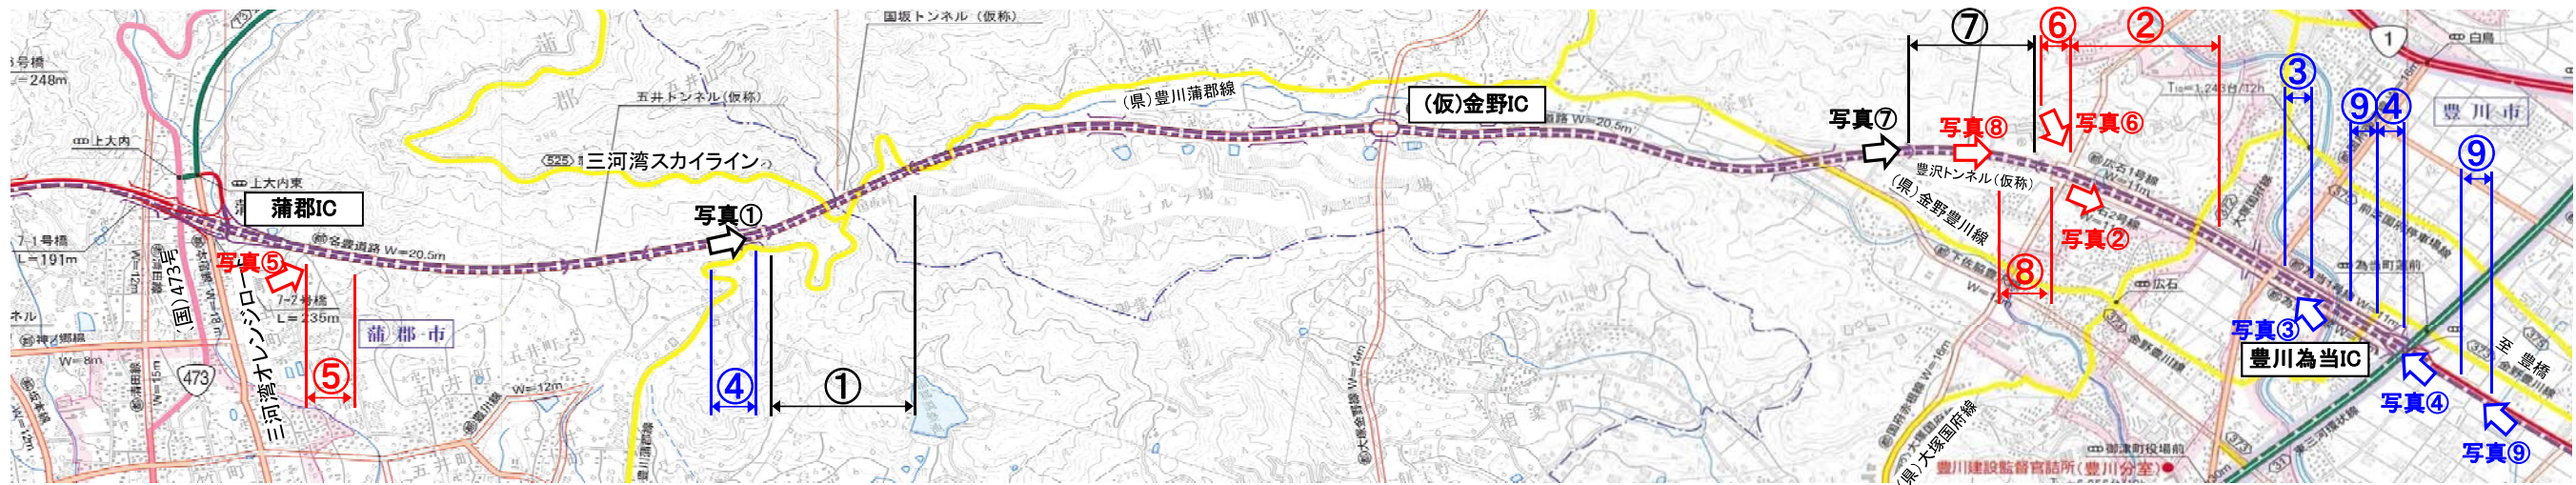

①	②	③	④
工事名 平成27年度 23号蒲郡BP国坂トンネル工事 工期 平成28年2月26日～平成30年3月20日 施工業者 大日本土木(株) TEL 0533-75-6531, FAX 0533-75-6537 4月末時点進捗率 35.5% 5月作業予定 トンネル掘削工、残土処理工、東側造成工 工事概要 蒲郡市五井町(国坂峠)でトンネルをつくっています。 【トンネル進捗：371m/678m】	工事名 平成27年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事 工期 平成28年3月30日～平成29年5月11日 施工業者 岡田建設(株) TEL 0533-56-8582, FAX 0533-56-8583 4月末時点進捗率 71.7% 5月作業予定 道路土工、排水構造物工、舗装工 工事概要 豊川市御津町で切り廻し道路及び仮設グラウンドをつくっています。	工事名 平成28年度 23号蒲郡BP広石高架橋下部工事 工期 平成29年2月17日～平成29年12月15日 施工業者 木村建設(株) TEL 0533-95-1824, FAX 0533-95-1825 4月末時点進捗率 4.8% 5月作業予定 場所打杭工、仮設工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚をつくります。	工事名 平成28年度 23号蒲郡BP為当高架橋下部工事 工期 平成29年2月17日～平成29年12月15日 施工業者 藤城建設(株) TEL 0533-95-0636, FAX 0533-95-0637 4月末時点進捗率 24.5% 5月作業予定 道路土工、準備工 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線の盛土工事及び豊川市為当町でバイパス本線の橋台をつくっています。
名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

この度、豊川市御津町広石地区において、橋脚をつくる工事と豊川市御津町豊沢地区で流路を整備する工事をさせていただきます木村建設(株)と申します。

現在、豊沢地区において、流路の土砂流出を防ぐ工事を行っており、4月末で完成予定です。広石地区においては、工事準備を進めており、5月中旬から橋の杭を作る工事に着手してまいります。

現場周辺には、小学校の通学路があるため、安全に十分配慮し、工事を進めてまいります。

工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

また、工事中に何かお気付きな点等がございましたら、気軽にお声掛け下さい。

③ 平成28年度 23号蒲郡BP広石高架橋下部工事 木村建設株式会社 現場代理人 小沢 剛央

⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
工事名 平成28年度 23号五井満田地区道路建設工事 工期 平成29年3月10日～平成29年12月27日 施工業者 (株)近藤組 TEL 0533-95-1867, FAX 0533-95-1868 4月末時点進捗率 0.0% 5月作業予定 盛土 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の盛土を行います。	工事名 平成28年度 23号蒲郡BP金野西地区道路建設工事 工期 平成29年3月14日～平成29年12月27日 施工業者 (株)ヒメノ TEL 0533-56-7182, FAX 0533-56-7183 4月末時点進捗率 0.0% 5月作業予定 擁壁工 工事概要 豊川市御津町で御津高校のテニスコートの移設工事を行っています。	工事名 平成28年度 23号蒲郡BP豊沢トンネル工事 工期 平成29年3月18日～平成30年12月21日 施工業者 戸田建設(株) TEL 052-951-8543, FAX 052-961-4543 4月末時点進捗率 0.0% 5月作業予定 起工測量、仮設ヤード掘削 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線のトンネルをつくります。	工事名 平成28年度 23号蒲郡BP豊沢道路建設工事 工期 平成29年3月18日～平成31年3月20日 施工業者 戸田建設(株) TEL 052-951-8543, FAX 052-961-4543 4月末時点進捗率 0.0% 5月作業予定 設計照査、施工計画 工事概要 御津高校グラウンドの地下に道路をつくります。	工事名 平成28年度 23号蒲郡BP為当地区下部工事 工期 平成29年3月30日～平成30年3月23日 施工業者 岡田建設(株) TEL 0533-87-5191, FAX 0533-88-5017 4月末時点進捗率 0.0% 5月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚とランプの橋台、橋脚をつくります。
名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会
 編集長：木村建設株式会社 小沢 剛央
 TEL 0533-95-1824, FAX 0533-95-1825

監修：名四国道事務所豊川分室
 (豊川建設監督官詰所)
 TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974
