

宮川通信

宮川出張所
第8号

工事箇所図

明和町川尻
⑤, ⑥



工事一覧表

- | | |
|---------|----------------------|
| ①平成20年度 | 宮川出張所管内河川維持工事 (管内全域) |
| ②平成19年度 | 五十鈴川大切戸排水樋門工事 |
| ③平成19年度 | 宮川大湊地区排水樋門工事 |
| ④平成19年度 | 宮川磯町災害復旧工事 |
| ⑤平成20年度 | 西南海岸 川尻護岸工事 |
| ⑥平成20年度 | 西南海岸 川尻堤防工事 |
| ⑦平成20年度 | 宮川災害復旧工事 |
| ⑧平成20年度 | 宮川東豊浜高潮対策工事 |
| ⑨平成20年度 | 宮川除草工事 (管内全域) |
| ⑩平成18年度 | 宮川大倉川排水樋門工事 (完成) |
| ⑪平成19年度 | 宮川小田古川排水樋門工事 |
| ⑫平成19年度 | 宮川辻久留地区築堤護岸工事 |
| ⑬平成19年度 | 宮川清水川、大倉川排水ひ門機械設備工事 |
| ⑭平成20年度 | 宮川小田古川排水ひ門機械設備工事 |
| ⑮平成20年度 | 宮川中島大倉築堤護岸工事 |

平成20年度 宮川出張所管内河川維持工事

宮川、五十鈴川、勢田川にて、河川の緊急的な工事、及び小規模な維持工事をおこなっています。緊急的な工事等、近隣の皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



進捗率 22%
8月末現在



現場代理人 兼 主任技術者
大友 秀樹

9月の予定工程	1	15	30
フェンス及び側溝設置	[Progress bar from 0 to 15]		
維持修繕	[Progress bar from 0 to 30]		

施工者 藤田土木株式会社
TEL 0598-58-0008

平成19年度 五十鈴川 大切戸排水樋門工事

伊勢市一色町地先にて、老朽化に伴う排水樋門の改築工事を行っています。現在、軟弱地盤対策として地盤改良工を進めております。工事用車両の通行及び堤防道路の規制等により近隣の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願いします。

進捗率 38%
8月末現在




施工者 株式会社 山野建設
TEL 0596-22-3188

今月の予定工程	1	10	20	30
地盤改良工	[Progress bar from 0 to 10]			
樋門・樋管 本体工	[Progress bar from 0 to 30]			

平成19年度 宮川大湊地区排水樋門工事

本工事は、伊勢市大湊町地先において、排水樋門築堤・護岸工事を施工いたします。現在は工事用進入路工が完了し、今月は二重締切工を行っていきます。工事期間中、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。

進捗率 9%



完成予想図

川裏進入路



川表進入路



今月の予定工程	1	10	20	30
二重締切工	[Progress bar from 0 to 10]			

施工者 株式会社 西邦建設
TEL 0596-36-3054

平成19年度 宮川磯町災害復旧工事

進捗率 30%

本工事は、伊勢市磯町地先において、災害復旧工事(築堤・護岸工事(磯町1工区・磯町2工区))約410mを施工いたします。現在は、1工区の法覆護岸工の一部が完了し、引き続き鋼矢板の打設を行っています。近隣住民の皆様、付近を通行される皆様及び、各関係機関の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

今月の予定工程	1	10	20	30
矢板護岸工	[Progress bar from 0 to 30]			

予定工程は天候等により変更となることがあります。



施工者 株式会社 森組
TEL 0596-39-1122

平成20年度 西南海岸 川尻護岸工事

明和町川尻・北藤原地先の2箇所にて堤防の老朽化に伴う工事を行います。
現在、工事を行うための準備をしています。
工事に伴う堤防道路の通行止や工事車両の通行にてご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力をお願いします。



現場代理人 兼 監理技術者
木高 大吾


進捗率 2%
8月末現在



川尻工区



北藤原工区



施工者 中井土木株式会社
TEL 0598-51-7565

平成20年度 西南海岸川尻堤防工事

明和町川尻地先にて、堤防護岸の高潮対策及び老朽化に伴う補強工事を行っています。
現在、基礎嵩上工、表法被覆工及び被覆石工の施工しております。
工事用車両の通行及び堤防道路の規制等により近隣の皆様には、ご迷惑をおかけしていますが、ご理解とご協力をお願いします。





現場代理人
西尾 和仁



監理技術者
南 隆広


進捗率 27%
8月末現在

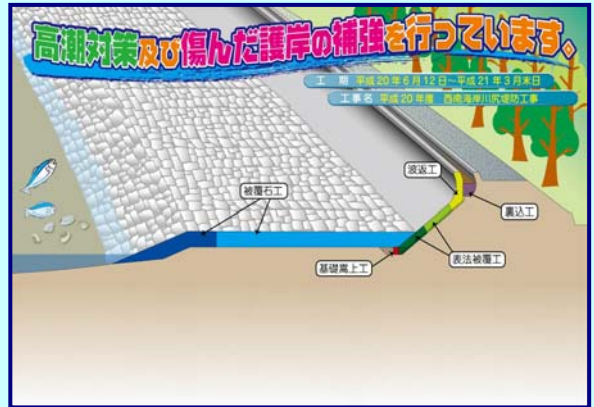


施工者 日本土建株式会社
TEL 0596-55-2826

平成20年度 宮川災害復旧工事

伊勢市御園町上條地先にて、護岸の災害復旧工事を約300m行います。
現在、工事を行うための準備をしております。
工事用車両の通行及び堤防道路、高水敷の規制等により近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



進捗率 0.1%
8月末現在

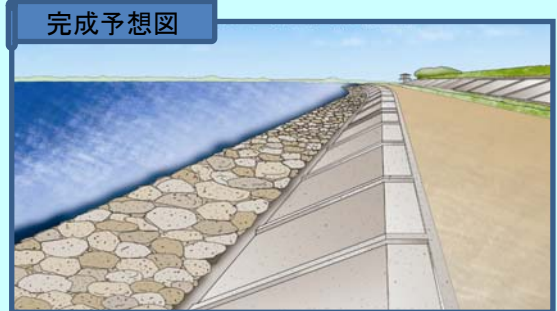

現場代理人 兼 監理技術者
山下 譲

施工者 株式会社 山野建設
TEL 0596-22-3188

平成20年度 宮川東豊浜高潮堤防工事

伊勢市東豊浜地先にて、高潮対策に伴う整備工事を行います。現在、工事を行うための準備をしております。工事用車両の通行及び堤防道路の規制等により近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。




現場代理人
谷本 和也



監理技術者
西浜 宏

進捗率 0.2%
8月末現在

今月の予定工程



施工者 日本工業 株式会社
TEL 0596-39-7333

平成20年度 宮川出張所管内堤防除草工事

堤防管理の為、宮川、五十鈴川、勢田川の堤防の除草作業を行っております。現在1回目の除草を完了し、10月から2回目の除草作業を行います。工事用車両の通行及び道路の規制等により近隣の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



除草作業状況




除草作業完了



現場代理人
永田 元彦

進捗率 58%
8月末現在

今月の予定工程



施工者 海老屋建設株式会社
TEL 0596-22-4958

平成18年度 宮川大倉川排水樋門工事

伊勢市大倉町地先にて施工しておりました、大倉川排水樋門が完成しました。工事施工中は地域の皆様にはご協力、ご理解いただき、大変ありがとうございました。



現場代理人 兼 監理技術者
森畑 文雄

進捗率 100%
完成!

工事完成写真



施工者 大富建設株式会社
TEL 059-227-3205

平成19年度 宮川小田古川排水樋門工事

進捗率 95%

伊勢市佐八町の小田古川において、樋門をつくっています。9月中旬の完成予定です。工事にあたり皆様には何かとご迷惑をおかけしておりますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。



施工者 株式会社 森組
TEL 0596-39-1122

平成19年度 宮川辻久留地区築堤護岸工事

現在佐八工区を施工しており、9月末に完成する予定です。

また、辻久留工区については9月中旬から施工致します。

つきましては近隣の皆様、県道を通行される皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、一般車両優先かつ安全を心掛け工事を行いますので皆様のご理解ご協力をお願いいたします。




下流より上流を進む



下流より上流を進む

施工者 宮本建設 株式会社
TEL 0596-28-6131

進捗率 60%
8月末現在



平成19年度 宮川 清水川、大倉川排水ひ門機械設備工事

清水川排水ひ門・大倉川排水ひ門の機械設備の取り付け工事を行っています。9月上旬の完成予定です。

工事用車両の通行等により近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

進捗率 99%
8月末現在



清水川排水ひ門



大倉川排水ひ門

施工者 宇野重工株式会社
TEL 0598-58-1313

平成20年度 宮川小田古川排水ひ門機械設備工事



伊勢市佐八町地先にて、小田古川排水樋門のゲート設備製作・据付工事を施工致します。

現在は製作前の準備工を行っています。

現場作業は11月頃を予定しております。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



進捗率 7%
8月末現在

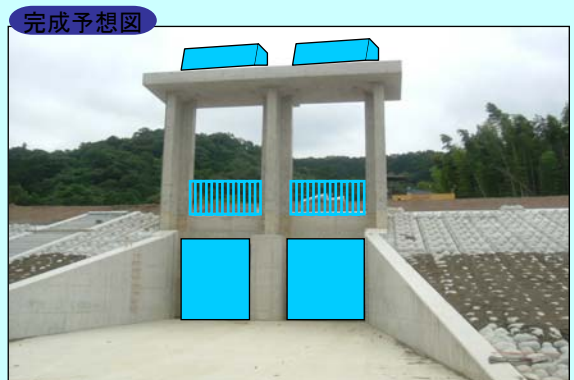

現場代理人 三好 洋 主任技術者 坂本 啓介

施工者 開成工業株式会社
TEL 096-272-5521

平成20年度 宮川中島大倉築堤護岸工事

本工事は、伊勢市中島町及び佐八町地先において、築堤・護岸工事を約180m施工します。

現在、工事を行うための準備をしています。近隣の皆様、県道通行の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。



現場代理人 兼 監理技術者

奥本 竜二



佐八工区

進捗率 0.5%

施工者 株式会社 森 組
TEL 0596-39-1122

今月の予定工程 予定工程は天候等により変更となることがあります。

	1	10	20	30
準備工	[Progress bar from 1 to 20]			
掘削工	[Progress bar from 20 to 30]			

安全対策と環境対策

- ◎工事安全衛生協議会（宮川）
- ◎過積載の一斉点検
- ◎三重県防災訓練
- ◎宮川床上監理委員会
- ◎宮川床上現地見学会
- ◎宮川河川敷安全利用点検
- ◎JICA見学会

- 毎月第4木曜日
(不定期)
9月7日
9月16日
9月27日
9月29日
10月下旬予定

トピックス

西南海岸
危険箇所マップ


三重河川国道事務所では、伊勢湾西南海岸におきまして、週1回の海岸巡視をしております。巡視にて海岸利用者の皆様に特に注意をしていただき、又は、近づかないようしていただきたい危険箇所を危険箇所マップとして作成しておりますので、参考にしてください。また、海岸利用の際には利用者自ら安全の確認をしていただき、ご利用されるようお願いいたします。

注意が必要な箇所位置図（伊勢湾西南海岸）



河川における水難事故について

今年度においても全国的に水難事故が多発しております。河川の利用の際に利用者自らも安全を確認のうえご利用をお願いします。三重河川国道事務所では河川情報が見られるモバイルサイト<http://ns.mdrc.go.jp/m/>を設けていますので、参考にしてください。また、水難防止アクションプランとして、河川の近くのコンビニ等へのチラシの配布や河川利用者の多い場所への注意看板の設置等を行っています。



携帯電話用QR
コード

「河川防災情報」の
チラシ掲示のご協
力頂いています。



注意！

河川では急な
増水に注意
してください。



☆携帯電話でみる河川防災情報

<http://ns.mdrc.go.jp/m/>

国土交通省 三重河川国道事務所 宮川出張所
TEL 0596-25-1018



携帯電話用QR
コード

宮川の水質が今年も全国1位！

先日、平成19年度の宮川の水質調査の結果が発表されました。宮川の水質はBOD値0.5mg/lと去年に引き続き全国1位になりました。

ご意見・ご感想がございましたら
連絡先までお寄せください。

連絡先

国土交通省
三重河川国道事務所
宮川出張所
伊勢市船江町1-11-25
TEL 0596-25-1018

位置図



* お役立ち情報

◎三重河川国道事務所モバイルサイト

<http://ns.mdrc.go.jp/m/>

◎河川の水位や雨の情報

<http://www.river.go.jp/>

◎宮川の浸水想定区域・宮川の重要水防箇所

<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

◎道の相談室

☎0120-106-497 (三重県内)

◎宮川流域ルネッサンス協議会

<http://www.miyarune.jp/>

◎鮎遡上情報 宮川漁業協同組合 ☎0596-39-1500

◎日本野鳥の会 三重県支部

http://www.geocities.jp/sirochidori_mie/

度会橋の水位表示

・計画高水位(HWL)

河川整備の目標としている水位

・氾濫危険水位(危険水位)

堤防の決壊等により家屋浸水等の被害を生ずる恐れのある水位

・避難判断水位(特別警戒水位)

避難勧告等の判断の参考となる水位

・氾濫注意水位(警戒水位)

水害に備え各水防機関が警戒にあたる水位(水防団が出動の準備をする水位)



【参加者募集のお知らせ】
川と海のクリーン大作戦
平成20年10月26日(日)

《集合場所》

(伊勢市) 8時

宮川右岸堤公園(度会橋)

(玉城町) 8時半

宮川左岸10.0km付近河川敷
