


宮川通信

宮川出張所
第9号

工事箇所図

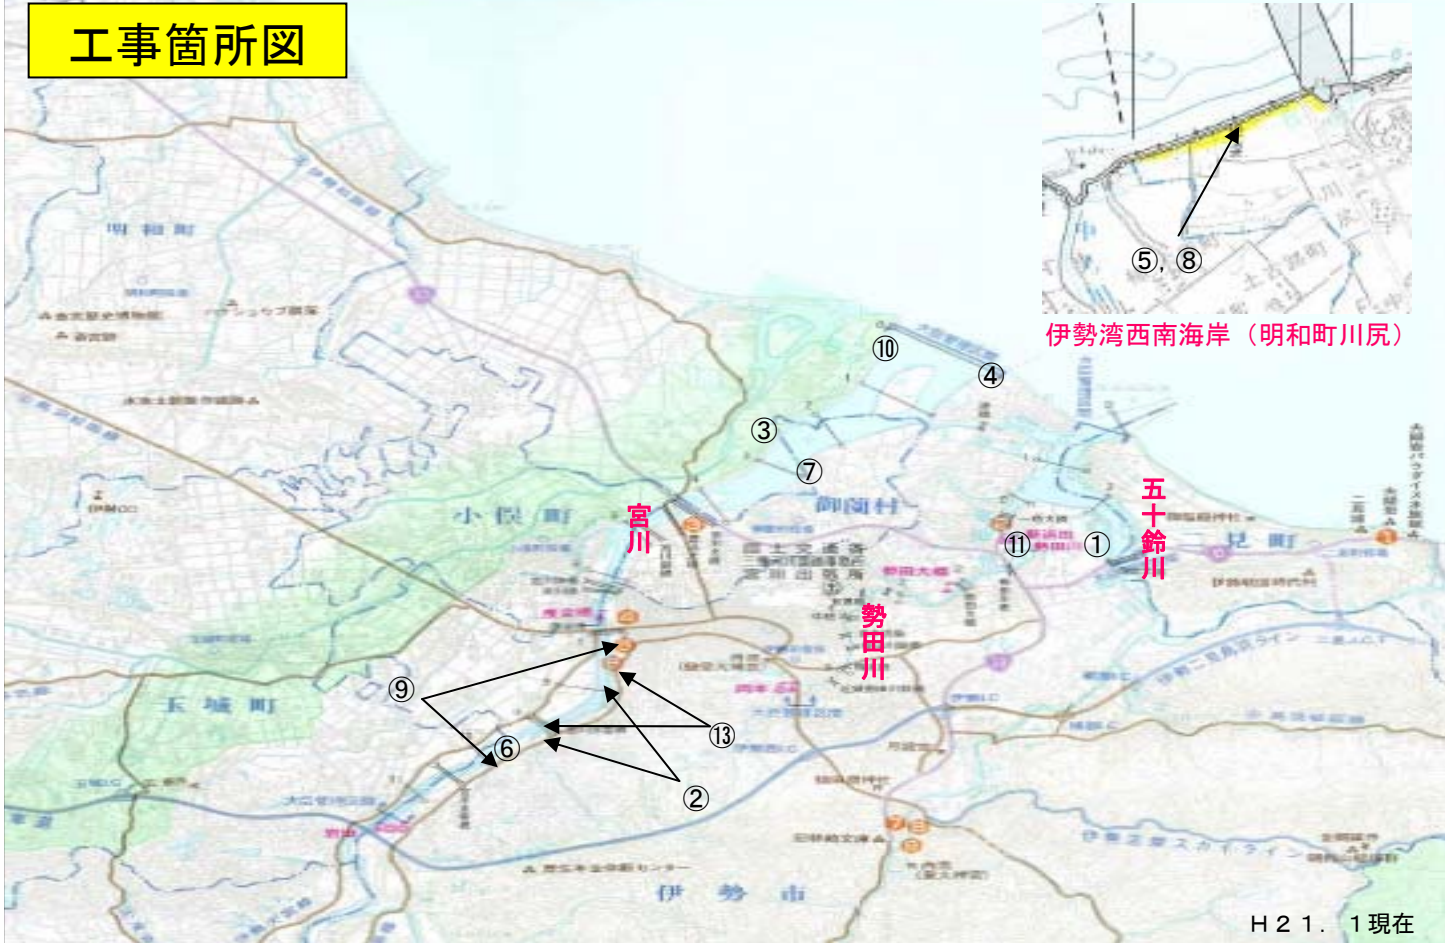

工事一覧表

- | | |
|---------|------------------|
| ①平成19年度 | 五十鈴川大切戸排水樋門工事 |
| ②平成19年度 | 宮川辻久留地区築堤護岸工事 |
| ③平成19年度 | 宮川磯町災害復旧工事 |
| ④平成19年度 | 宮川大湊地区排水樋門工事 |
| ⑤平成20年度 | 西南海岸 川尻堤防工事 |
| ⑥平成20年度 | 宮川小田古川排水樋門機械設備工事 |
| ⑦平成20年度 | 宮川災害復旧工事 |
| ⑧平成20年度 | 西南海岸 川尻護岸工事 |
| ⑨平成20年度 | 宮川中島大倉築堤護岸工事 |
| ⑩平成20年度 | 宮川東豊浜高潮対策工事 |
| ⑪平成20年度 | 勢田川排水機場機械設備修繕工事 |
| ⑫平成20年度 | 西南海岸整備工事 |
| ⑬平成20年度 | 三重河川国道管内営繕関係整備工事 |
| ⑭平成20年度 | 宮川出張所管内維持修繕工事 |

工事完了箇所



小田古川排水樋門



大倉川排水樋門


平成19年度 五十鈴川 大切戸排水樋門工事

伊勢市一色町地先にて、排水樋門・樋管の老朽化に伴う整備を行っています。現在、樋門・樋管本体工として本体の築造が完了し、堤護岸の施工をしています。工事用車両の通行及び堤防道路の規制等により近隣の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願いします。

現場代理人 兼 監理技術者 中井 伸幸



進捗率 72% 12月末現在




施工者 株式会社 山野建設

平成19年度 宮川辻久留地区築堤護岸工事

現在の進捗としまして、佐八工区が完成し辻久留工区につきましては11月中旬から着手しました。現在、法覆護岸工施工中ですが、12月中旬～1月末にかけて河川土工の盛土工の施工の為、辻久留工区につきまして大型ダンプの出入りが増加します。近隣または県道を通行される皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、一般車両優先かつ安全を心掛け工事を行いますので皆様のご理解ご協力お願いいたします。

現場代理人 杉本 晴紀
監理技術者 島田 徹

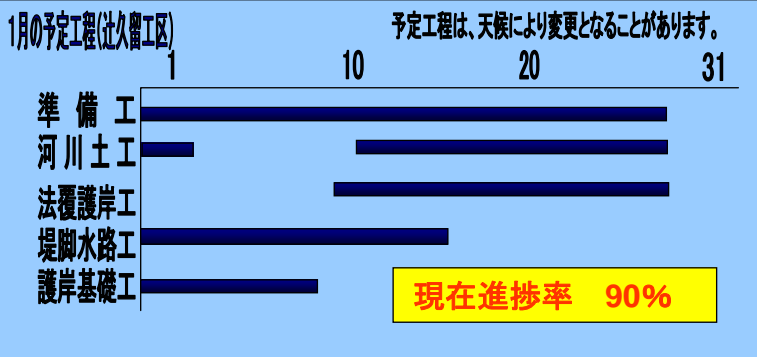

施工者 宮本建設 株式会社

平成19年度 宮川磯町災害復旧工事


本工事は、伊勢市磯町地先において、築堤・護岸工事（磯町1工区・磯町2工区）約410mを施工いたします。現在は、1工区が完了し、引き続いて2工区の施工を行っています。近隣住民、付近を御通行される皆様及び、各関係機関の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

現場代理人 中川 巧
監理技術者 出口裕茂



磯町2工区

進捗率
93.6%




施工者 株式会社 森組

平成19年度 宮川大湊地区排水樋門工事

本工事は、伊勢市大湊町地先において、排水樋門築堤・護岸工事を施工いたします。現在は樋門本体工事をしています。工事期間中、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。


完成予想図

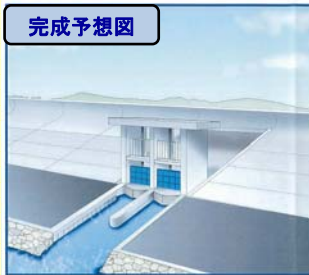

施工者 株式会社 西邦建設

進捗率
35%


1月の予定工程



平成20年度 西南海岸川尻堤防工事


明和町川尻地先にて、堤防護岸の高潮対策及び老朽化に伴う補強工事を行っています。現在、波返工、被覆石工の施工をしております。工事用車両の通行及び堤防道路の規制等により近隣の皆様には、引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

進捗率81.7%
12月末現在



施工者 日本土建株式会社

1月の予定工程




平成20年度 宮川小田古川排水ひ門機械設備工事

伊勢市佐八町地先にて、排水樋門のゲート設備製作・据付工事を施工しております。現在はゲート本体の施工が完了しております。平成21年より管理橋及び防護柵の施工を行う予定にしております。皆様方にはご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。

現場代理人 三好 洋
主任技術者 坂本 啓介

平成21年1月の予定工程



進捗率 95%
12月末現在



施工者 開成工業株式会社

平成20年度 宮川災害復旧工事

工事用車両の堤防道路の通行及び、高水敷の規制等により近隣の皆様にはご迷惑をおかけします。現在護岸の最前部の捨石工事をしています。工事完成後、釣りに来た人達が安全に遊べるようにと心掛け施工しています。工事はこの先も続きますが、皆様の理解とご協力をお願いします。

現場代理人 兼 監理技術者 山下 譲

施工者 株式会社 山野建設

進捗率 81%
12月末現在



平成20年度 西南海岸 川尻護岸工事

明和町川尻・北藤原地先の2箇所
堤防の老朽化に伴う工事行っています。
現在、川尻工区は波返工の施工
をしています。ひきつづき、堤防の
裏側 裏法被覆を施工する予定です。
北藤原は階段工を引き続き施工して
ます。工事に伴う堤防道路の通行止
や工事車輛の通行にてご迷惑をおか
けしますが、ご理解と御協力をお願い
します。



川尻工区




北藤原工区

現場代理人 木下 幸宏
監理技術者 木高 大吾

**進捗率
59%
12月末現在**

1月の作業工程



施工者 中井土木株式会社

平成20年度 宮川中島大倉築堤護岸工事


本工事は、伊勢市佐八町及び中島町地先において、
築堤・護岸工事（佐八町）約180mを施工します。
現在、河川土工、法覆護岸工を施工しています。近
隣の皆様、県道通行の皆様には大変ご迷惑をお掛け
しますが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

**進捗率 72%
12月末現在**



佐八工区

現場代理人兼監理技術者 奥本 竜二



施工者 株式会社 森 組

平成20年度 宮川東豊浜高潮堤防工事

伊勢市東豊浜地先にて、高潮対策に伴う整備工事を行って
います。

進捗率 12.2% 12月末現在

現場代理人 谷本 和也
主任技術者 西浜 宏



施工者 日本工業 株式会社

平成20年度 勢田川排水機場機械設備修繕工事

伊勢市田尻町、勢田川排水機場の除塵設備更新工事を実施しております。近隣の皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。




平成20年12月
現在写真、現場
未着工です。

進捗率62%
12月末現在



現場代理人・監理技術者
内田 健一



施工者 宇野重工株式会社


平成20年度 西南海岸整備工事

伊勢湾西南海岸松名瀬工区～北浜工区までの海岸の工事及び緊急的な維持工事をおこなっています。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

進捗率 30%
12月末現在



現場代理人 兼 主任技術者
高瀬 了吉



施工者 株式会社 宮本組

平成20年度 三重河川国道管内営繕関係整備工事

進捗率 1%


本工事は、伊勢市辻久留3丁目地先、大倉町字天竺田地先、大倉町地先、大倉町字八反垣外地先において、水門用操作室を4箇所施工いたします。現在は、材料加工準備中です。本工事は、2月から作業行います。近隣住民、付近を御通行される皆様及び、各関係機関の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。



現場代理人
中西 章太



主任技術者
山本 昇



施工者 株式会社 山口工務店

平成20年度 宮川出張所管内維持修繕工事

この度、上記工事を受注いたしました。宮川や伊勢湾西南海岸の緊急的な工事や維持修繕を施工いたします。近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力の程お願いいたします。

施工箇所

進捗率 0%



現場代理人 兼 主任技術者
中谷 稔

施工者 株式会社 前田組

安全対策と環境対策

- ◎安全協議会第2回総会
 - ◎工事安全衛生協議会（宮川）
 - ◎過積載の一斉点検
- 12月4日
毎月第4木曜日
（不定期）



12月4日安全協議会総会の様子

トピックス

海岸ゴミマップ作成しました。

伊勢湾西南海岸ゴミマップ

不法投棄は犯罪です。海にゴミを捨てないで下さい。



海岸清掃の活動状況

H20.10.4 松名瀬地区で実施されたクリーン大作戦の様子

H20.11.9 北浜～東大淀地区で実施されたクリーン大作戦の様子

とおりゃん瀬の清掃がありました

11月29日(土)勢田川とおりゃん瀬の清掃をしました。当日は天気にも恵まれ、地元ボランティアの方をはじめ50名程度が参加しました。干潮で川の水が引く11時半頃より約1時間飛び石に付いた汚れを落としたり、浄化材の交換の作業をしました。



位置図



ご意見・ご感想がございましたら
連絡先までお寄せください。

連絡先

国土交通省
三重河川国道事務所
宮川出張所
伊勢市船江町1-11-25
TEL 0596-25-1018

* お役立ち情報

◎三重河川国道事務所モバイルサイト

<http://ns.mdrc.go.jp/m/>

◎河川の水位や雨の情報

<http://www.river.go.jp/>

◎宮川の浸水想定区域・宮川の重要水防箇所

<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

◎道の相談室

☎0120-106-497 (三重県内)

◎宮川流域ルネッサンス協議会

<http://www.miyarune.jp/>

◎鮎遡上情報 宮川漁業協同組合 ☎0596-39-1500

宮川床上浸水対策特別緊急事業の進捗状況

宮川床上浸水対策特別緊急事業の進捗状況 (平成20年12月末時点)

