


# 宮川通信

宮川出張所  
第11号

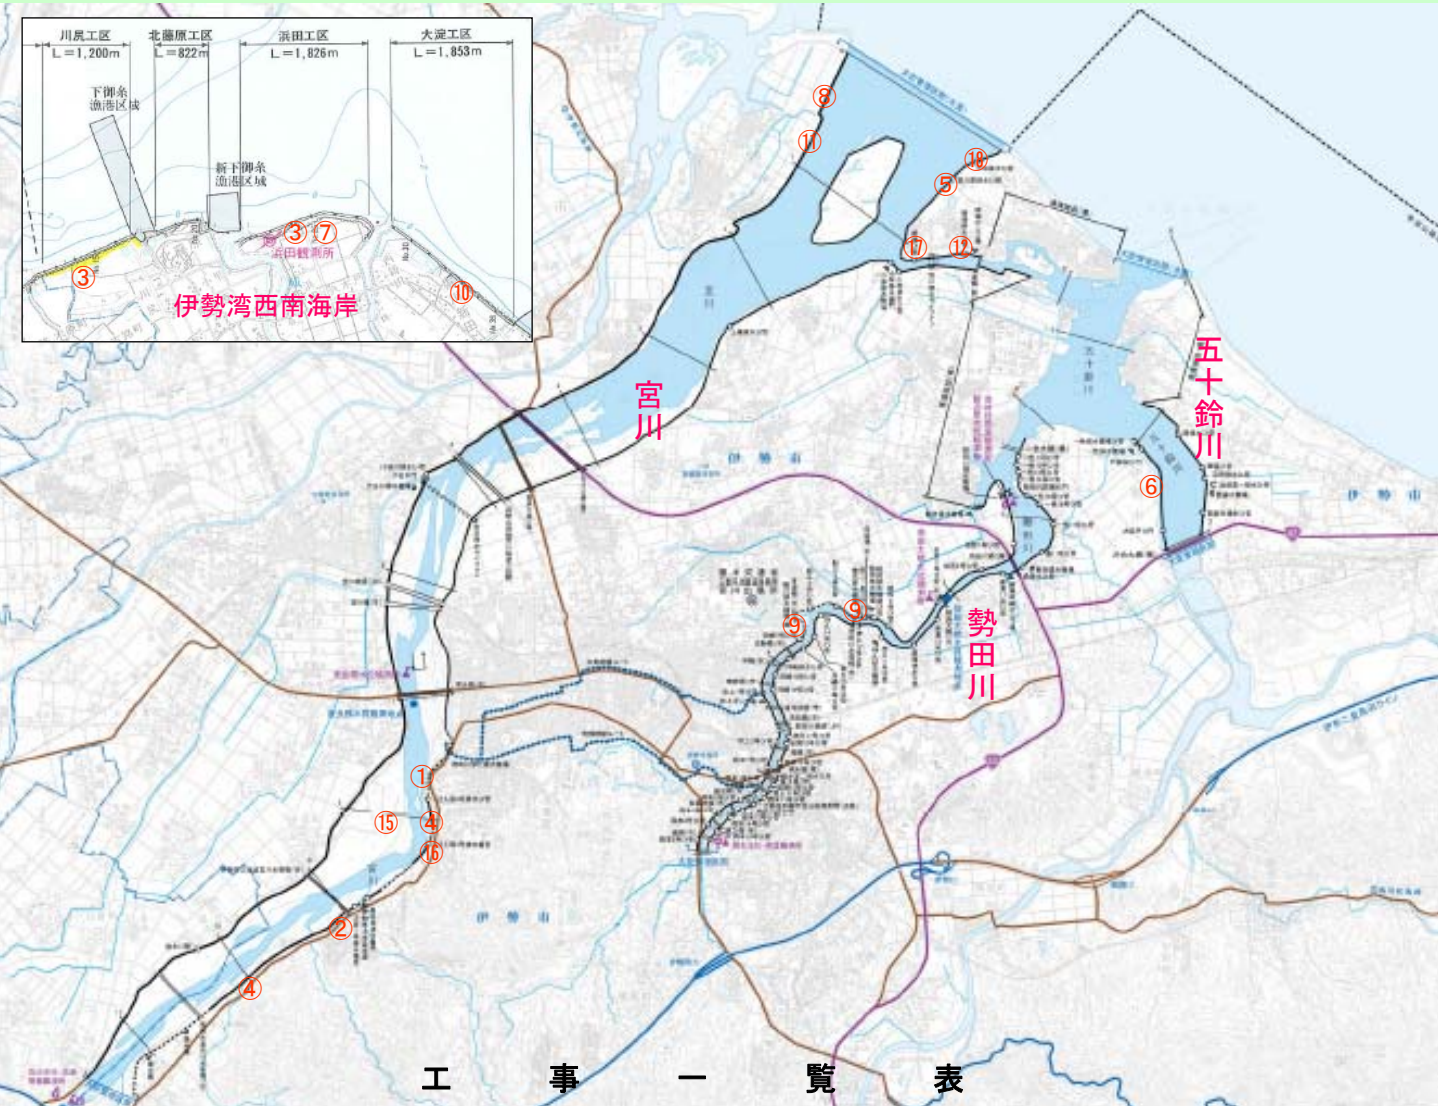

## 工事一覧表

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ①平成20年度<br>宮川中島1号排水樋管工事   | ⑩平成20年度<br>西南海岸大湊堤防工事     |
| ②平成20年度<br>宮川大倉水源地築堤工事    | ⑪平成20年度<br>宮川東豊浜高潮護岸工事    |
| ③平成20年度<br>西南海岸浜田・川尻堤防工事  | ⑫平成20年度<br>大湊川大湊地区堤防護岸工事  |
| ④平成20年度<br>宮川辻久留築堤護岸工事    | ⑬平成21年度<br>宮川維持管理工事(管内全域) |
| ⑤平成20年度<br>宮川野川原樋管撤去工事    | ⑭平成21年度<br>西南海岸整備工事(西南海岸) |
| ⑥平成20年度<br>五十鈴川一色堤防護岸工事   | ⑮平成21年度<br>宮川川端河道掘削工事     |
| ⑦平成20年度<br>西南海岸浜田堤防工事     | ⑯平成21年度<br>宮川辻久留3号排水樋管工事  |
| ⑧平成20年度<br>宮川東豊浜河口部高潮堤防工事 | ⑰平成21年度<br>大湊災害復旧工事       |
| ⑨平成20年度<br>勢田川船江護岸工事      | ⑱平成21年度<br>宮川大湊堤防護岸工事     |

平成20年度 宮川中島1号排水樋管工事

伊勢市辻久留2丁目地先において、樋管（1基）及び築堤護岸工事を施工しました。工事期間中は、近隣住民、付近を御通行される皆様及び各関係機関の方々には、大変ご迷惑をお掛けいたしました。ご理解ご協力、有難うございました。



現場代理人  
成田 雅紀



監理技術者  
達井 均

工事完成

《 着手前 》



《 完成 》



工事完成までの  
期間、ご理解、  
協力頂き有難う  
ございました。



施工者  株式会社 森 組

平成20年度 宮川大倉水源地築堤工事

伊勢市大倉町地先にて、築堤・護岸工事及び宮川水源地の取水井戸の改築工事を施工しています。現在、工事は最盛期を向かえて、平成22年3月末の完成を目標に全力で取り組んでおります。大型車両の出入り等、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

進捗率 58.4%  
12月末現在



現場代理人 兼 監理技術者  
西 勝浩



築堤護岸施工状況

施工者 日本工業 株式会社

## 平成20年度 西南海岸 浜田・川尻堤防工事

完 成

明和町浜田地先・川尻地先の2箇所です。堤防の老朽化に伴う工事を行っていました。工期期間中は工事車両通行及び堤防道路通行止によりご迷惑を御掛け致しましたが、ご理解ご協力有難うございました。

### 現場写真

浜田A-1工区



浜田A-2工区



浜田B工区



川尻工区



現場代理人  
竹谷 臣央



監理技術者  
中西 直樹

施工者 中井土木株式会社

## 平成20年度 宮川辻久留築堤護岸工事

佐八工区は完成いたしました。辻久留工区においてはただいま階段ブロック施工中です。引き続き盛土を行いますので、大型車両等の工事現場への出入りが増加すると思われま。近隣住民の皆様、県道を御通行される皆様には大変ご迷惑をお掛けしていますが、一般車両優先で安全を心掛けて作業をしますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。



現場代理人  
杉本 晴紀



監理技術者  
島田 徹

施工者  
宮本建設株式会社



辻久留工区



進捗率  
90.3%

佐八工区(完成)



## 平成20年度 宮川野川原樋管撤去工事

本工事は、伊勢市大湊町地先において、樋管撤去築堤・護岸工事を施工いたします。今後は、海岸土工・護岸基礎工・波返工・護岸工・高水敷被覆工の施工を予定しています。工事期間中、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

進捗率 93.3%  
12月末現在

施工者 株式会社 西邦建設

下流部 完成



上流部 施工中



## 平成20年度 五十鈴川一色堤防護岸工事

五十鈴川における伊勢市一色町地先において、堤防・護岸工事を施工しております。

11月末に張コンクリートが完了し、引き続き堤防天端の舗装を行ってまいります。ご通行の皆様にはご迷惑をお掛けする事となりますが、交通安全には十分に注意を払いますので、ご理解を賜りご協力お願い致します。

**進捗率 92.1%**  
**12月末現在**

**施工者**  
**株式会社 森 組**



## 平成20年度 西南海岸浜田堤防工事

本工事は、多気郡明和町浜田地先において、老朽化した堤防を新しい堤防にする工事を行っています。現在は、新波返工と旧波返工との間詰工を行っています。引き続き、年内は既設構造物撤去工及び新年から堤防天端舗装工を行う予定です。

工事に伴う堤防道路の通行止や工事車両の通行にてご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願い致します。

**進捗率 94.1%**  
**12月末現在**

**施工者 株式会社 カドヤ**



## 平成20年度 宮川東豊浜河口部高潮堤防工事

伊勢市東豊浜町地先 河口部において、堤防護岸工事を施工しております。近隣住民皆様には、大変ご迷惑をお掛けしておりますが御理解御協力お願いします。



**進捗率 70%**  
**12月末現在**

**施工者 株式会社 丸宗土建**



## 平成20年度 勢田川船江護岸工事

伊勢市田尻、船江地先(伊勢河崎商人館駐車場)の2箇所で護岸工事を行なっています。田尻工区については完成しました。施工中におきましては、交通規制などご不便をお掛けしましたが、ご協力頂き有難う御座いました。引き続き「伊勢河崎商人館」駐車場の護岸工事を進めてまいります。近隣並びに付近を通行される方には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

**現在の進捗率は  
88.1% (12月末)**

現場代理人 兼 監理技術者  
村田 元 (朝日丸建設)

### 施工者

朝日丸・前田経常建設共同企業体



田尻工区

神久工区(伊勢河崎商人館駐車場)



## 平成20年度 西南海岸大淀堤防工事

明和町大淀地先において、海岸堤防が老朽化しているため、堤防護岸の改修工事を行っています。

現在、波返工の施工が終り、堤防の裏側 裏法被覆の施工を行っています。年始の1月~2月については堤防道路の舗装を行う予定です。

皆様には工事に伴う通行止や工事車両の通行にてご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

現場代理人 木高 大吾  
監理技術者 今村 真介

**施工者  
中井土木株式会社**

**12月末現在  
進捗率 88.3%**

### 工事進捗写真

波返工 完了



裏法被覆工 施工中



## 平成20年度 宮川東豊浜高潮護岸工事

伊勢市東豊浜町地先にて、高潮対策に伴う整備を行っています。現在、川表側にて、基礎工・捨石工・護岸工の施工を行っております。

工事用車両の通行及び堤防道路の規制等により近隣の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願いします。

**進捗率  
56.1%  
12月末現在**

現場代理人 上村 憲司  
監理技術者 中井 伸幸

**施工者  
株式会社 山野建設**



高潮護岸施工状況

## 平成20年度 大湊川大湊地区堤防護岸工事

伊勢市大湊町地先にて、護岸工事を約350m行っています。  
現在、広幅鋼矢板工、高水敷被覆工、プレキャスト被覆工  
しております。  
工事車両の通行及び堤防道路の規制等により近隣の皆様には  
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



鋼矢板打設状況



現場代理人  
赤堀 和哉



監理技術者  
山下 譲

進捗率 66.3%  
12月末現在

施工者  
株式会社 山野建設

## 平成21年度 宮川維持管理工事

宮川、五十鈴川、勢田川、西南海岸  
の緊急的な維持工事、小規模な維持  
工事、堤防管理の為の除草工事を  
行っています。  
緊急的な工事の為、突発的に発生す  
る交通障害、工事車両の運行等、近  
隣の皆様にはご迷惑をお掛けいたし  
ますが、ご理解ご協力を賜りますよ  
うお願いいたします。

進捗率 95%  
12月末現在



現場代理人 兼 監理技術者  
永田 元彦

施工者  
海老屋建設株式会社

### 除草作業状況



## 平成21年度 西南海岸整備工事

西南海岸（松名瀬～北浜）の海岸の整  
備・補修工事を行っています。松名瀬  
海岸の除草については完了しました。  
現在、間詰石・天端被覆・土砂整正工  
の施工準備を行っています。準備が、  
終わり次第、施工させていただきます。

皆様には工事に伴う通行止や工事車両  
の通行にてご迷惑をおかけしますが、  
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

現場代理人 兼 主任技術者：鈴木 清巳

12月末現在  
進捗率 42.5%

施工者 中央土木株式会社



除草工 完了



被覆工 施工中

## 平成21年度 宮川川端河道掘削工事

現在の状況

本工事は、伊勢市川端町地先において、河道掘削工事約250000m<sup>2</sup>を施工しています。  
現在、河道掘削工、低水護岸工を施工しています。近隣の皆様、県道通行の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。



進捗率 36.4%  
12月末現在



現場代理人 兼 監理技術者  
奥本 竜二

施工者 株式会社 森 組

## 平成21年度 宮川辻久留3号排水樋管工事

完成予想図

伊勢市辻久留二丁目地先にて、洪水対策のため排水樋管を新しくする工事を行っています。

進捗率 52%  
12月末現在

現在、樋門・樋管本体工を施工しております。

工事用車両の通行及び施工機械の騒音により近隣の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



現場代理人 兼 監理技術者  
西山 高弘



施工者 株式会社 山野建設

## 平成21年度 大湊川災害復旧工事

本工事は伊勢市大湊地先において、大湊川の左岸及び宮川の右岸の護岸工事を行っています。

現在、大湊川側で護岸基礎工である鋼矢板の打込み作業、宮川側では法覆護岸工であるコンクリート被覆の施工を進めております。

工事期間中に於きましては、堤防道路を通行止めにて施工しており、近隣住民の皆様並びに沿道を通行される皆様に対し 大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人  
浦田 直之




監理技術者  
伊藤 元彦

進捗率 52.5%  
12月末現在




現場状況

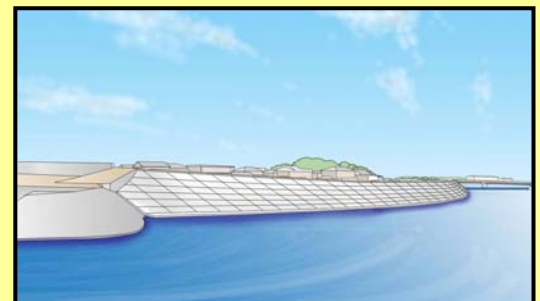

完成予想図

施工者 朝日丸建設 株式会社

伊勢市大湊町地先にて、老朽化した堤防の補強を行っています。現在、川裏側において法面部の施工を行っております。工事に伴う工事用車両の通行及び堤防道路の規制等により近隣の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願いします。

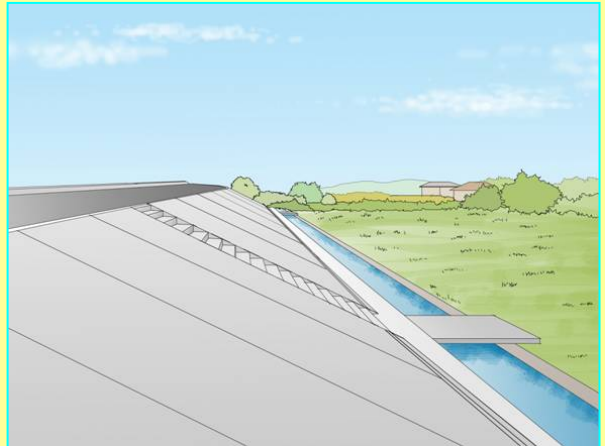

現場代理人  
西口 陽介  
(下建設)



監理技術者  
橋爪 一明  
(浜口土木)

進捗率 54.8%  
12月末現在

施工者  
浜口・下経常建設共同企業体

## トピックス

# お伊勢さん健康マラソン大会 に出場しました

平成21年11月29日(日)に第28回 お伊勢さん健康マラソン大会に宮川出張所から(少数精鋭?ながら)出場しました。

5kmの部

氏名	所属	タイム	総合順位
村田 元	朝日丸・前田JV (平成20年度 船江護岸工事)	34' 54"	1042/1488

10kmの部

氏名	所属	タイム	総合順位
小島 慎也	宮川出張所	42' 8"	66/1444
西 勝浩	日本工業(株) (平成20年度 大倉水源地築堤工事)	51' 52"	463/1444
杉本 晴紀	宮本建設(株) (平成20年度 辻久留築堤護岸工事)	1:8' 1"	1299/1444

### 出場者成績

日頃の工事で流す汗とは全く違う爽やかな(?)汗を流しました。

明日から、また仕事に励みましょう。

(松阪シティマラソンに向けて練習も再開!)



5kmの部に出場の村田選手  
(朝日丸前田JV)



10kmの部に出場の杉本選手  
(宮本建設(株))



10kmの部に出場の西選手  
(日本工業(株))



ゴール後にパチリ!  
【TEAM MIYAGAWA?】



## 勢田川等水面利用 対策協議会が発足 しました

昨年11月18日勢田川・五十鈴川・大湊川と宇治山田港との重複区域を対象とする放置船舶是正のため「勢田川等水面利用対策協議会」が設立されました。協議会は、国・県・市・地元自治会等の関係組織で構成されており、今回は、会長の選出や規約制定・協議会で協議・検討していく基本事項の確認がなされました。昨年12月16日からは、放置船舶対策の基礎調査となる船舶調査を行っております。



勢田川等水面利用対策協議会の様子

詳しくは三重河川国道事務所ホームページ（下記のアドレス）で  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/jigyo/kasen/houchisen/index.html>

お知らせ

『船舶調査を実施します!』のご協力下さい。

勢田川、五十鈴川及び大湊川と宇治山田港における安全かつ秩序ある宇治山田港の維持・増進を図っていくため、「勢田川等水面利用対策協議会」を設立しました。今回、**無秩序に放置されている船舶（放置船舶）の対策を実施していくための基礎調査**として、船舶調査を実施します。

1. 調査実施期間  
1 回目：2009年12月16日(水)～17日(木) 8:00～17:00  
2 回目：2010年 1月13日(水)～18日(月) 8:00～17:00  
※調査実施を希望し、予部申込みが期限内にしています。
2. 調査場所  
宇治山田港、勢田川、五十鈴川、大湊川（下図参照）

お問い合わせ先：国土交通省 三重河川国道事務所 三志河川管理官事務所 河川課河川監視班  
〒514-0850 三重県津市河原町2-1 電話：0596-25-1018

## 川と海のクリーン大作戦を実施しました

毎年恒例となっている川と海のクリーン大作戦を実施しました。今年は伊勢市が御薊町高向のラブリバー公園で10月25日に、玉城町が玉城町屋田の宮川左岸10k付近（養殖研究所あたり）の堤防敷で11月8日に実施しました。両日も当日はお天気にも恵まれ、朝早くにもかかわらずたくさんの方にご参加いただき、河川公園・河川敷の清掃を行いました。ご協力ありがとうございました。



ラブリバー公園での実施状況



玉城町での実施状況

ご意見・ご感想が  
ございましたら  
**連絡先**までお寄せ  
ください。

### 連絡先

国土交通省  
三重河川国道事務所  
宮川出張所  
伊勢市船江1-11-25  
Tel 0596-25-1018

### 位置図



### \* お役立ち情報

- ◎三重河川国道事務所モバイルサイト  
<http://ns.mdr.c.go.jp/m/>
- ◎川の防災情報（河川の水位や雨の情報）  
<http://www.river.go.jp/>
- ◎宮川の浸水想定区域・宮川の重要水防箇所  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html>
- ◎道の相談室  
☎0120-106-497（三重県内）
- ◎宮川流域ルネッサンス協議会  
<http://www.miyarune.jp/>
- ◎鮎上情報 宮川漁業協同組合  
☎0596-39-1500
