



ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会

いまだ暑さが残ります今日この頃、ますますご健勝のほどお喜び申し上げます。今月はいろいろあったので、原稿を書くのが遅くなってしまっています。頑張って印刷して今月中に配る予定です。

天気も不安定ですね。台風も18号がまた発生したようです。各地に影響がない事を祈っています。鈴鹿国道出張所の工事業者も今月はまだ5日くらいしか現場が稼働していないと嘆いていました。天気が悪いのは土木業には痛手です。



今月は珍しい建設機械の紹介をします。写真①の車輛は「橋梁点検車」といいます。クレーンの先についているバケットに人が乗って橋の裏側の点検をします。今の時期にはアチラコチラの事務所から貸して欲しいという希望が殺到して引っ張りだこの人気者です。写真②の車輛は舗装が傷んで凸凹になった時に舗装を5cm~10cm削って、新しいアスファルトを敷設するという工事をするのですが、その時に舗装を削る機械で「路面切削機」といいます。

アスファルトを削り（写真③）長い首についているベルトコンベアで削りかすをダンプトラックに積んでいきます。（写真④）

2台とも長い首を持っているという事で紹介させてもらいました。



珍風景




白い彼岸花が近所で咲き始めたので、パチリとしてきました。珍しいと思いませんか？20年ほど前にJR関駅前で咲くという話を聞きましたが……、実物は初めて見ました。インターネットで検索すると、白い彼岸花は珍しくないような書き方だったので少しショックでした。珍風景ではないでしょうか？

田の畦などでよく見る赤い彼岸花は別名「曼珠沙華」ですが、山口百恵さんが歌っていらしたので御存じのかたは多いと思います。でも百恵さんは「まんじゅーしゃかー」って歌ってましたね

① 平成27年度 23号中ノ川高架橋下部左岸工事

NO.346~NO.350付近(県道鈴鹿環状線~中ノ川)

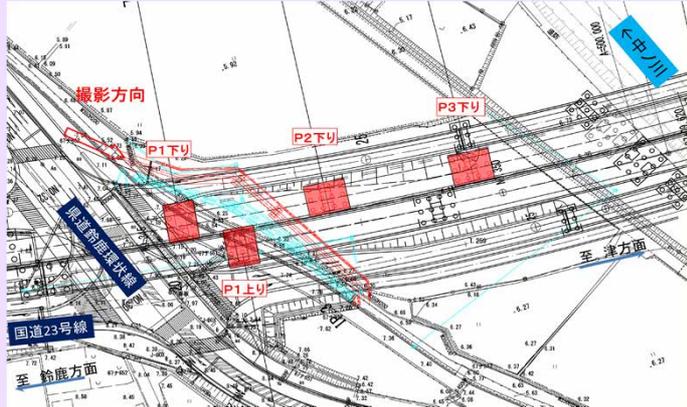

下りP1橋脚



下りP2橋脚



下りP3橋脚



上りP1橋脚

中勢BPの中ノ川高架橋の下部工事をします日本土建株式会社です。
 下り線P1、P2、P3橋脚は埋戻しまで完了。上り線P1は仮締切の施工を実施しており、9月中頃には床掘りとなる予定です。
 10月中旬には底版のツケを打設する予定です。
 工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 日本土建(株)
 TEL059-229-5656
 現場代理人 中川 基司
 監理技術者 堀本 和宏

	9月	10月	11月
橋脚工	[Progress bar across all months]		
仮締切工	[Progress bar in 9月]		[Progress bar in 11月]

② 平成27年度 23号中勢BP整備工事

4工区(鈴鹿市安塚) 中勢BP整備



9工区(津市納所交差点) 舗装修繕



主に鈴鹿中央総合病院南側の鈴鹿市安塚町地内にて市道切替前の付替え道路工事における、排水工・地盤改良工事です。

中勢BPと県道42号(津伊ヶ線)立体交差点の交差点舗装修繕工事です。工事区間においては、夜間作業にて**県道部は車線減少**、**BP上り**は通行止めを行いますので、ご協力願います。

3ヶ月予定工程

施工者 東海土建(株)
 TEL059-227-6101
 現場代理人 若林 孝幸
 監理技術者 巾 勇次

	9月	10月	11月
4工区(鈴鹿市安塚)	[Progress bar across all months]		
5工区(鈴鹿市稲生)	[Progress bar across 9月 and 10月]		
9~12工区(津市納所~高茶屋)	[Progress bar across all months]		

③ 平成27年度 23号御園地区道路建設工事

現在、No.335～No.338区間及びNo.330～No.335区間の擁壁工の施工を行っており、9月末に完了予定しております。その後、10月上旬より表層安定処理工の施工を行う予定です。場内での作業となりますが、施工箇所は側道へ隣接しており、十分な安全を配慮して施工を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。




3ヶ月予定工程

施工者 信藤建設株式会社
TEL059-345-3171

現場代理人 伊東 裕明

監理技術者 岡田 憲彦



④ 平成27年度 23号田中川高架橋下部工事

県道三行上野線北側




現在、本線(上下線)A1橋台の躯体の施工を行っております。9月中旬に縦壁コンクリート打設を行い、10月以降は、縦壁及び胸壁の施工を予定しております。10月中旬より田中川左岸の上り線P1橋脚におけるPHC杭の施工を予定しております。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設株式会社
TEL059-232-0603

現場代理人 西川 保

監理技術者 大家 裕貴



⑤ 平成27年度 23号徳居地区道路建設工事




7月末より始まった地盤改良工(深層混合処理)の施工が、おかげさまで順調に進み、8月末でようやく完了となりました。今月からは側道部の盛土や伐採を行います。地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、引続きご理解ご協力の程、宜しくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 アイトム建設株式会社
TEL059-389-5757

現場代理人 森田 大介

監理技術者 堀 大志



⑥ 平成27年度 23号徳居道路建設工事

西側 (本線NO.370付近)



市道御薗125号線 (本線NO.372付近)




現在、道路土工として掘削・残土搬出及び大型水路の施工を行っています。
 今後は、表層安定処理・カルバート工と順次、行っていく予定です。
 また、8月29日より、市道御薗125号線を通行止めさせて頂いております。
 通行止め期間中は、ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 アイトム建設株式会社
TEL059-389-5757

現場代理人 岡 洋佑

監理技術者 田中 大樹




⑦ 平成27年度 23号御園道路建設工事



中勢バイパス御園道路建設工事を行っております東海土建(株)です。
 施工は、地盤改良工が9月中旬頃完了し、引続き、道路土工・4号補強土壁を行っていきます。
 10月下旬頃からは、2号補強土壁を行っていきます。
 工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一を考えて工事を進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 東海土建(株)
 TEL059-227-6101
 現場代理人 南 隆広
 監理技術者 内山 英久



⑧ 平成27年度 23号三行南地区道路建設工事



現在、道路土工を行うため、排水構造物工として、地下排水作業を行っています。
 市道三行郡山線の通行止作業は終了しました。通行止め期間中は、大変ご不便をおかけ致しました。
 今後も安全には十分注意して進めていきますので、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
 TEL059-253-5337
 (現場事務所)
 現場代理人 丹所 昇
 監理技術者 小島 久典




◎ 平成27年度 23号三行地区道路建設工事

No.461付近～起点側を望む



No.470付近～起点側を望む

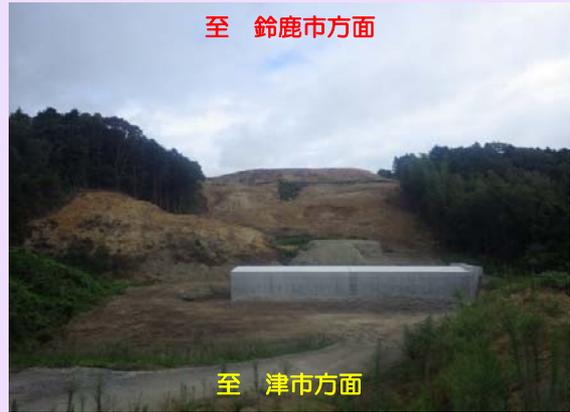

中勢バパスの工事をします三重農林建設(株)です。工事内容は三行地区で、区間の約0.9kmの
工事用道路を作る作業をしています。現在は、伐採作業が終了し、排水構造物作業を行っています。
工事は安全第一で進めていきますので、宜しくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
Tel.059-232-0555

現場代理人 内田 啓介

監理技術者 青木 則正

道路土工
排水構造物工
準備工(伐採工)



国土交通省


新規工事のご紹介です！

平成28年8月中旬から9月中旬に8件の工事が決定致しました。
開通に向けて工事が更に加速して来ました。工事件数が増え、ますます忙しくなりますが、
今一度、気を引き締め工事を進めて行きたいと思えます。
地域住民の皆様には、大変ご迷惑をお掛け致しますがご理解ご協力の程お願い致します。

- 平成28年度 23号三行南地区道路建設工事 (株)松本組
- 平成28年度 23号田中川橋鋼上部工工事 瀧上工業(株)
- 平成28年度 23号中ノ川高架橋下部右岸工事 日本土建(株)
- 平成28年度 23号山越知道路建設工事 岡田工業(株)
- 平成28年度 23号郡山南地区道路建設工事 (株)北村組
- 平成28年度 23号越知地区道路建設工事 (株)森組
- 平成28年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事 (株)杉本組
- 平成28年度 23号御薊地区道路建設工事 中井土木(株)



施工箇所見取図

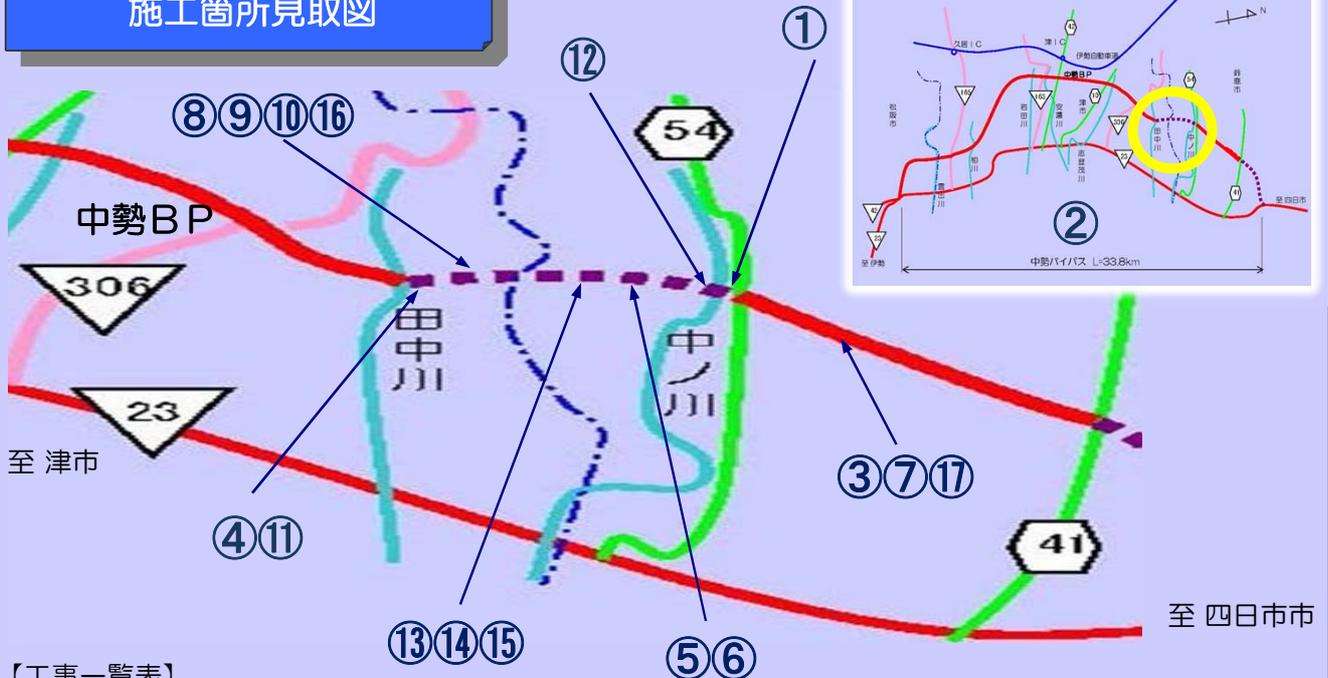

【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成27年度 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	H28.12.15	橋梁下部工	日本土建(株)
②	平成27年度 23号中勢BP整備工事	H28.10.31	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建(株)
③	平成27年度 23号御園地区道路建設工事	H28.11.25	地盤改良工・擁壁工	信藤建設(株)
④	平成27年度 23号田中川高架橋下部工事	H29.3.15	橋梁下部工	三重農林建設(株)
⑤	平成27年度 23号徳居地区道路建設工事	H28.9.30	地盤改良工・工事用道路	アイトム建設(株)
⑥	平成27年度 23号徳居道路建設工事	H29.3.10	加幅工・水路付替工・地盤改良工	アイトム建設(株)
⑦	平成27年度 23号御園道路建設工事	H28.12.22	道路土工・擁壁工	東海土建(株)
⑧	平成27年度 23号三行南地区道路建設工事	H29.2.20	道路土工	三重農林建設(株)
⑨	平成27年度 23号三行地区道路建設工事	H28.12.20	工事用道路工	三重農林建設(株)
⑩	平成28年度 23号三行南地区道路建設工事	H29.3.17	道路土工・カルバート工	株松本組
⑪	平成28年度 23号田中川橋鋼上部工工事	H30.3.20	鋼橋架設工・合成床版工	瀧上工業(株)
⑫	平成28年度 23号中ノ川高架橋下部右岸工事	H29.12.20	RC 橋脚工	日本土建(株)
⑬	平成28年度 23号山越知道路建設工事	H29.6.30	地盤改良工	岡田工業(株)
⑭	平成28年度 23号郡山南地区道路建設工事	H29.3.10	道路土工	株北村組
⑮	平成28年度 23号越知地区道路建設工事	H29.6.30	地盤改良工・付替河川	株森組
⑯	平成28年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H29.3.10	道路土工	株杉本組
⑰	平成28年度 23号御園地区道路建設工事	H29.8.31	地盤改良工・橋台工	中井土木(株)

【発行】【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
 〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
 tel : 059-387-8470 fax : 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局 (日本土建(株)内)
 tel : 059-229-5656

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル **#9910** (通話料無料・24時間受付)



※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
