



ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会

晩秋の候、皆様にはおかわりございませんでしょうか。いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。

前号でもお知らせしましたが、8月末から9月にかけて8件の工事が始まりました。一部の工事は着工していますが、そのほかの工事は現在準備中です。着工する時には回覧板などでお知らせしていきます。工事関係車両が増えて周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。



10月17日に天名地区市民センターの会議室をお借りして中勢バイパス工事連絡協議会の勉強会を行いました。建設業界もITの波が押し寄せております。

「i-Construction」として建設現場の生産性向上を目的にICT技術を利用して工事に取り組み始めています。今回は、日本土建(株)の主催で総勢25名の参加者がありました。

右の写真は津市河芸町三行地区で(株)松本組が実際に使用したドローンです。一般に売っているものと違い1台数百万円！！するそうです。



このカメラをドローンに装着し撮影

飛行中!



～ i-Construction (アイ・コンストラクション) ～

国土交通省では「ICTの全面的な活用 (ICT 土工)」等の施策を建設現場に導入することによって建設生産システム全体の生産性向上を図り、もっと魅力ある建設現場を目指す取組である i-Construction を進めています。


珍風景

久しぶりに、かかしが替わっていたので写真を撮りに車を降りると、畑の手入れをしている方がみえました。たぶん、この方が制作者だろうと思い、「写真を撮らせて下さい」と尋ねましたら、「どうぞ」と気さくに返事をされました。写真を撮った後には「いつも楽しみにしています」とお礼を言って車に乗り込みました。初めてお会いしましたが、前からの知り合いのような不思議な感じでした。



① 平成27年度 23号中ノ川高架橋下部左岸工事

NO.346~NO.350付近（県道鈴鹿環状線~中ノ川）

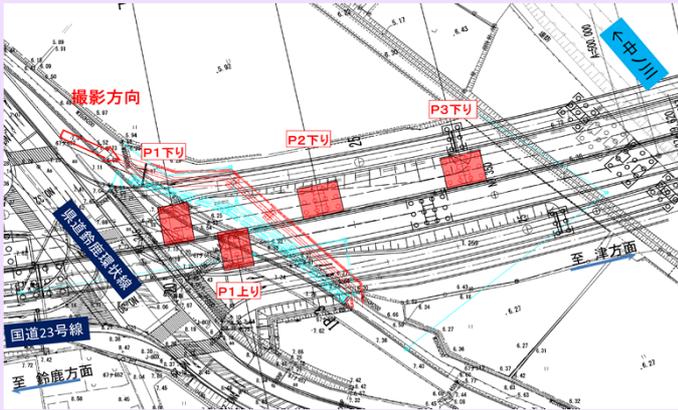

全景



上りP1橋脚
柱鉄筋建込(遠景)



上りP1橋脚
柱鉄筋建込(足場の上)



上りP1橋脚
柱鉄筋建込(底板付近)
足場上からの写真

中勢ハイパスの中ノ川高架橋の下部工をしています日本土建株式会社です。
下り線P1、P2、P3橋脚は埋戻しまで完了、上り線P1は、鉄筋・型枠組立が完了し、10月中頃に底板コンクリート打設予定です。
11月には埋戻し→鋼矢板引抜の予定です。(今回の写真は、柱鉄筋建込の様子を添付します。)
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。


施工者 日本土建株式会社
TEL059-229-5656

現場代理人 中川 基司
監理技術者 堀本 和宏

3ヶ月予定工程

橋脚工
仮締切工
準備工

10月 11月 12月



② 平成27年度 23号中勢BP整備工事

4工区(鈴鹿市安塚町) 中勢BP整備



主に鈴鹿中央総合病院南側の鈴鹿市安塚町地内にて、市道切替前の付替え道路工事における、道路土工・構造物取壊し工・地盤改良工事です。

9工区(津市納所交差点) 舗装修繕



中勢BPと県道42号(津伊ヶ線)立体交差点の交差点舗装修繕工事です。工事区間においては、夜間作業にて交通規制を行い完了しました。ご協力ありがとうございました。


施工者 東海土建株式会社
TEL059-227-6101

現場代理人 若林 孝幸
監理技術者 巾 勇次

3ヶ月予定工程

4工区(鈴鹿市安塚)
5工区(鈴鹿市稲生)
9~12工区
(津市納所~高茶屋)

10月 11月 12月




③ 平成27年度 23号御薊地区道路建設工事

現在、擁壁工の笠コンクリートの施工を行っており、10月中旬に完了予定しております。その後、10月下旬より路床盛土の施工を行い、11月上旬より表層安定処理工の施工を行って中旬頃工事完成予定です。場内での作業となりますが、施工箇所は側道へ隣接しており、十分な安全を配慮して施工を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。



3ヶ月予定工程

施工者 信藤建設株式会社
TEL059-345-3171
現場代理人 伊東 裕明
監理技術者 岡田 憲彦



④ 平成27年度 23号田中川高架橋下部工事

県道三行上野線北側




田中川左岸



現在、本線(上下線)A1橋台の躯体の施工を行っております。10月は埋戻しを行い、中旬以降に再度躯体の施工を予定しています。12月中旬完了予定です。田中川左岸については、10月下旬より上り線P1橋脚におけるPHC杭の施工を予定しております。その後、11月よりオンランプA1橋台の施工となります。引き続きご協力よろしくをお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設株式会社
TEL059-232-0603
現場代理人 西川 保
監理技術者 大家 裕貴



⑤ 平成27年度 23号徳居地区道路建設工事

本線NO.405付近

至 津市方面




至 四日市市方面

9月より側道部における盛土・伐採の施工が始まりました。9月は雨が多かった為、施工に時間がかかってしまいましたが12月の完成を目指し、引続き工事を行っていきます。地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、引続きご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 アイトム建設株
TEL059-389-5757
現場代理人 森田 大介
監理技術者 堀 大志




⑥ 平成27年度 23号徳居道路建設工事

西側 (本線NO.370付近)




市道御園125号線 (本線NO.372付近)

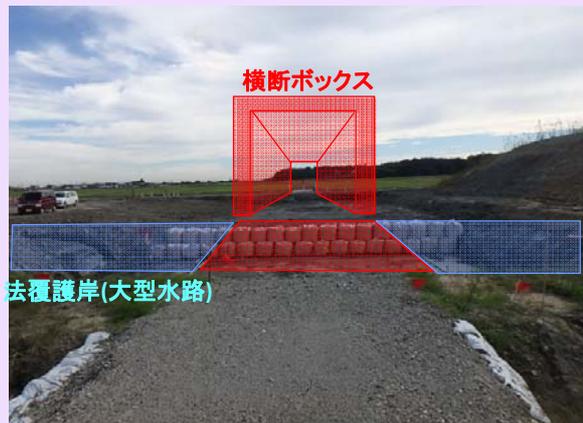

現在、掘削・残土搬出及び大型水路・カルバート工の施工を行っています。今後は、表層安定処理と順次、行っていく予定です。また、8月29日より市道御園125号線を通行止めさせて頂いております。通行止め期間中は、ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますよう、お願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 アイトム建設株
TEL059-389-5757
現場代理人 岡 洋佑
監理技術者 田中 大樹

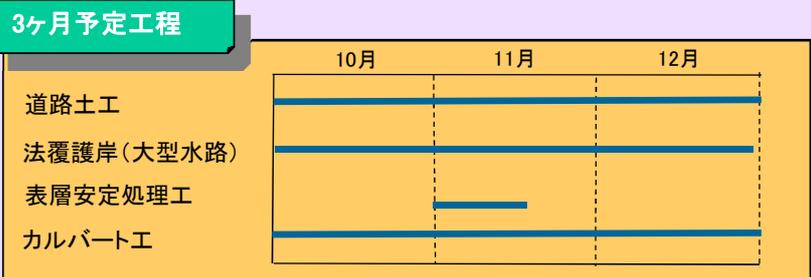


⑦ 平成27年度 23号御園道路建設工事



中勢バ1の御園道路建設工事を行っております東海土建(株)です。
 施工は、引続き道路土工、4号補強土壁を行っていきます。11月上旬頃からは2号補強土壁、
 12月上旬頃には舗装を行っていきます。
 工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一を考えて工事を
 進めていきますので、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 東海土建(株)
 TEL059-227-6101
 現場代理人 南 隆広
 監理技術者 内山 英久



⑧ 平成27年度 23号三行南地区道路建設工事

①工事起点から




②工事中間点から




現在、伐採及び地下排水の施工が終わり、道路土工を行っていくところです。
 ②の写真の正面に見える山を掘削して手前に盛土をおこなっていきます。
 安全には十分注意して進めていきますので、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
 TEL059-253-5337
 (現場事務所)
 現場代理人 丹所 昇
 監理技術者 小島 久典




⑨ 平成27年度 23号三行地区道路建設工事

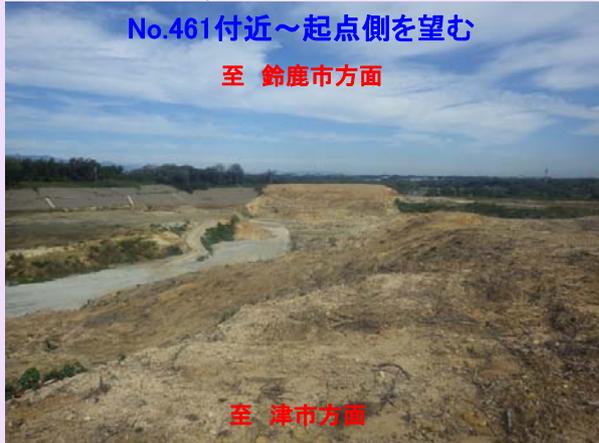

中勢パイルの工事をします三重農林建設(株)です。工事内容は三行地区で、区間の約0.9kmの工事用道路を作る作業していきます。現在は、排水構造物作業が終了し、道路土工の準備作業を行っています。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
Tel059-232-0555
現場代理人 内田 啓介
監理技術者 青木 則正


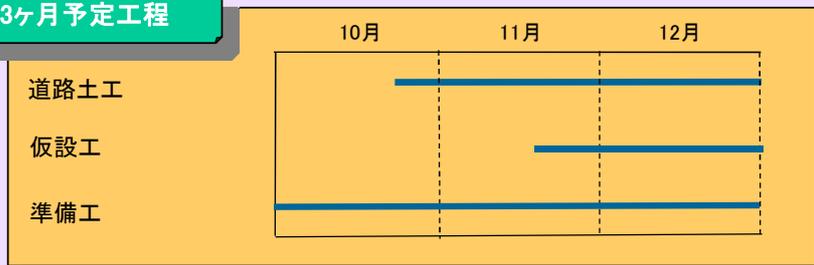


⑩ 平成28年度 23号三行南地区道路建設工事

新規工事

本線NO.475から


完成予想図

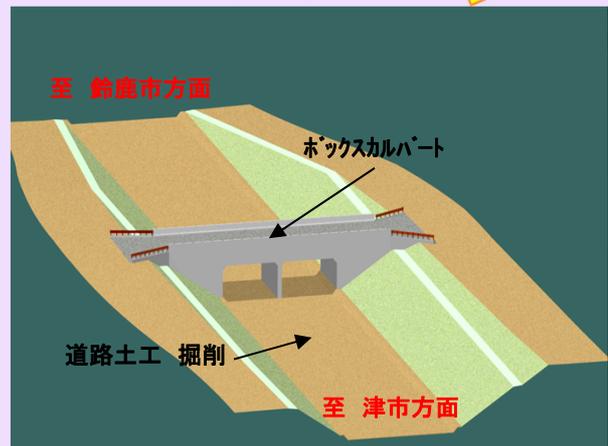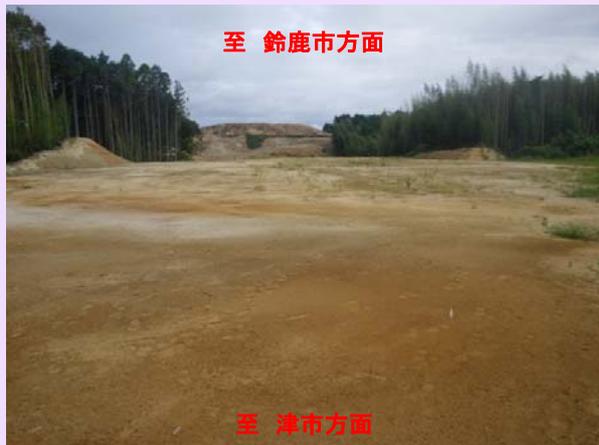

中勢パイルのボックスカルバートの施工を行う(株)松本組です。工事内容は工事延長130m区間の掘削工事を行い、その後、ボックスカルバートの施工を行います。工事は安全第一で進めていきますので、宜しくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)松本組
Tel0598-42-2266
現場代理人 前納 伸太郎
監理技術者 上野 正豊



⑪ 平成28年度 23号中ノ川高架橋下部右岸工事

新規工事

NO.355~357付近



中ノ川右岸にて、中勢バイパスの下部工事を施工致します日本土建(株)です。
今回の工事でオンランプP3、下りP6、上りP5、オフランプP3橋脚を施工します。11月の上旬より場所打杭を開始する予定です。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いします。


施工者 日本土建(株)
TEL059-229-5656
現場代理人 小林 善光
監理技術者 小林 善光

3ヶ月予定工程



⑫ 平成28年度 23号山越知道路建設工事

新規工事




中勢バイパス(鈴鹿市越知町~山越知町)において「地盤改良工事」を施工する事となりました岡田工業(株)です。
皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
また、工事中は責任者が現地に常駐しますので、工事に関してお気付きの点がございましたらお知らせください。

施工者 岡田工業(株)
TEL059-346-7121
現場代理人 大西 一也
監理技術者 網木 誠悟

3ヶ月予定工程

工事期間 : 平成28年 9月 27日 ~ 平成29年 6月 30日



⑬ 平成28年度 23号郡山南地区道路建設工事

新規工事

工事起点(本線NO.422付近)から工事終点望む




工事終点(本線NO.437付近)から工事起点望む



中勢パナソニック郡山南地区道路建設工事をします(株)北村組です。工事内容は郡山地区0.3kmの区間の道路改良を行います。工事は安全第一で施工致しますので、宜しくお願い致します。

施工者 (株)北村組
TEL0598-51-3800
現場代理人 松井 謙忠
監理技術者 今西 泰彦


3ヶ月予定工程



⑭ 平成28年度 23号越知地区道路建設工事

新規工事


本線NO.395付近

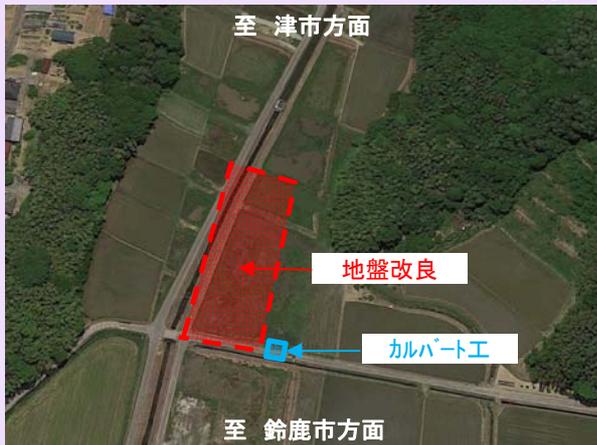

中勢パナソニックの越知地区道路建設工事をを行います(株)森組です。工事内容は地盤改良工と水路のカルバートを施工します。工事は安全第一で施工致しますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。


施工者 (株) 森組
TEL0596-39-1122
現場代理人 松田 孝広
監理技術者 瀧 光幸

3ヶ月予定工程



⑮ 平成28年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事

新規工事

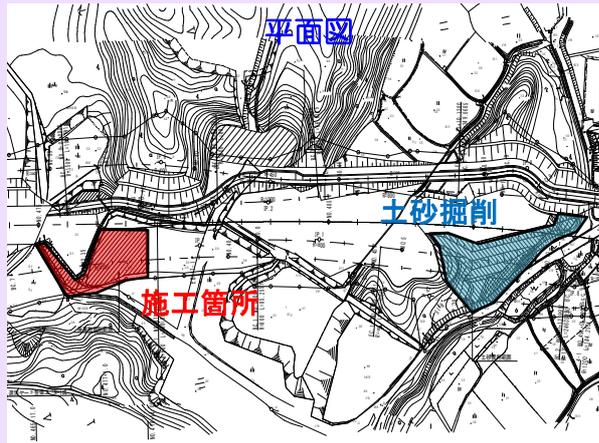


中勢バイパスの23号鈴鹿・津地区道路建設工事を行います(株)杉本組です。
10月下旬より工事を行っていく予定となっています。隣接する工事もありますので、調整しながら進めていきます。
安全には十分注意して進めていきますので宜しくお願い致します。

施工者 (株)杉本組
TEL(059)389-6020
(鈴鹿支店)

現場代理人 榑原 義之
監理技術者 玉置 陽介

3ヶ月予定工程

道路土工
産廃処理工
準備工



⑯ 平成28年度 23号御園地区道路建設工事

新規工事




中勢バイパス御園地区道路建設工事を行う中井土木(株)です。工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。
工事内容は、本線部の道路土工(掘削・盛土)・地盤改良工と本線A1橋台(上り)の施工を予定しております。

施工者 中井土木(株)
TEL0598-51-7565

現場代理人 大庭 健輔
監理技術者 今村 真介

3ヶ月予定工程


道路土工
準備工



⑪ 平成28年度 23号中勢バイパス整備工事

新規工事

工期：H28年10月1日～H29年3月23日 工事延長：L=33.8km

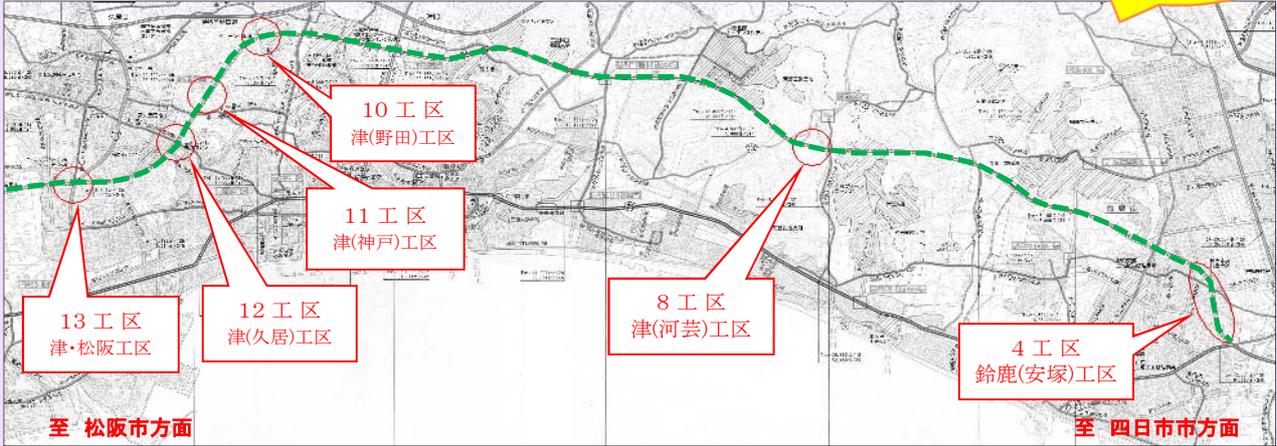


中勢バイパスの整備工事を行います藤田土木(株)です。
現在は準備工の段階です。工事内容は主に側道を約3.4kmに渡り、整備工事をしていきます。
工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 藤田土木(株)
TEL0598-58-0008

現場代理人 坂口 圭司

監理技術者 辻 忠治




国土交通省



国土交通省

施工箇所見取図

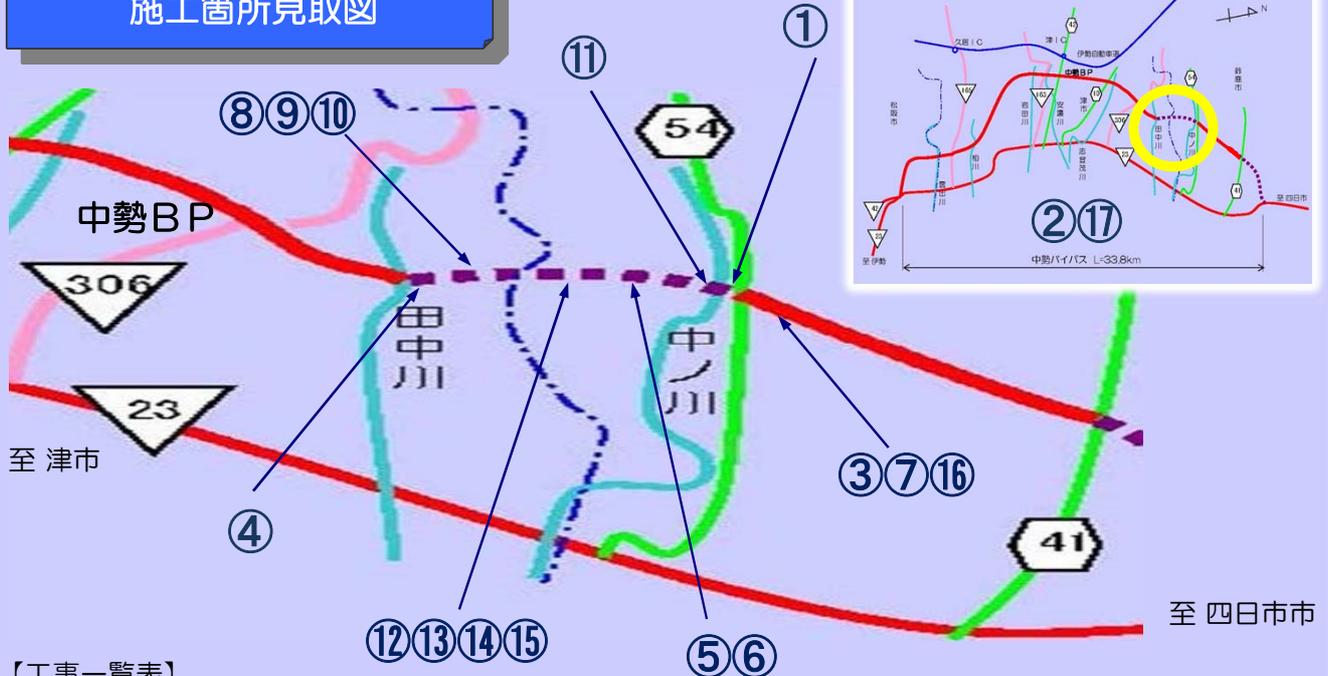

【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成27年度 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	H28.12.15	橋梁下部工	日本土建(株)
②	平成27年度 23号中勢BP整備工事	H28.10.31	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建(株)
③	平成27年度 23号御園地区道路建設工事	H28.11.25	地盤改良工・擁壁工	信藤建設(株)
④	平成27年度 23号田中川高架橋下部工事	H29.3.15	橋梁下部工	三重農林建設(株)
⑤	平成27年度 23号徳居地区道路建設工事	H28.9.30	地盤改良工・工事用道路	アイトム建設(株)
⑥	平成27年度 23号徳居道路建設工事	H29.3.10	加パ-ト工・水路付替工・地盤改良工	アイトム建設(株)
⑦	平成27年度 23号御園道路建設工事	H28.12.22	道路土工・擁壁工	東海土建(株)
⑧	平成27年度 23号三行南地区道路建設工事	H29.2.20	道路土工	三重農林建設(株)
⑨	平成27年度 23号三行地区道路建設工事	H28.12.20	工事用道路工	三重農林建設(株)
⑩	平成28年度 23号三行南地区道路建設工事	H29.3.17	道路土工・カルバート工	(株)松本組
⑪	平成28年度 23号中ノ川高架橋下部右岸工事	H29.12.20	RC 橋脚工	日本土建(株)
⑫	平成28年度 23号山越知道路建設工事	H29.6.30	地盤改良工	岡田工業(株)
⑬	平成28年度 23号郡山南地区道路建設工事	H29.3.10	道路土工	(株)北村組
⑭	平成28年度 23号越知地区道路建設工事	H29.6.30	地盤改良工・付替河川	(株)森組
⑮	平成28年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H29.3.10	道路土工	(株)杉本組
⑯	平成28年度 23号御園地区道路建設工事	H29.8.31	地盤改良工・橋台工	中井土木(株)
⑰	平成28年度 23号中勢バイパス整備工事	H29.3.23	舗装工・排水工・道路付属施設工・除草	藤田土木(株)

【発行】 【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
 〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
 tel: 059-387-8470 fax: 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局 (日本土建(株)内)
 tel: 059-229-5656

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル #9910 (通話料無料・24時間受付)



※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
