

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

- 末広地区で初めて橋が架かりました。（末広跨道橋）安全確保の為に二日間に渡り、通行止めを実施しましたが、無事完了することができました。ご協力、誠にありがとうございました。
- 厳しい残暑が続く見込みですが、これから台風シーズンにも入ってきます。防災非常袋の点検や避難場所の確認など、今一度ご家族と確認し合ってみましょう。

中勢バイパス（4工区）の完成イメージを順次紹介します！

中勢バイパス（4工区）の完成イメージを 北から南に 順次ご紹介。

今回は、**中勢バイパス 末広千代崎線 交差点 付近** のイメージです。
（前回の鈴鹿中央総合病院付近よりも、少し南へ進みました。）

イメージ図



※画像は、あくまでもイメージです
（関係機関との協議等により道路構造の変更の可能性があります）
イメージ画像作成：「令和元年度23号安塚跨道橋下部工事」日本土建(株)

中勢バイパス4工区で初めての橋桁が架かりました！（末広跨道橋）



昭和コンクリート工業(株)により、中勢バイパス（4工区・末広町）で初めて橋桁が架かりました。

- ①トレーラーにより工場から運搬
- ②桁を吊る
- ③桁仮置き・表面保護剤の塗布
- ④桁吊り下げ・据え付け
- ⑤主桁転倒防止措置



運搬中



②～⑤の工程を繰り返し行い、9本の主桁を設置しました。

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和2年8月25日撮影】

野町・末広地区

工事⑦ 23号末広西道路建設工事
堀田建設(株)

進捗率 80%

9月も引き続き**補強土壁工事**と**盛土工事**を行っていきます。安全第一で工事を進めます。よろしくお願いいたします。

末広地区

工事⑧ 23号末広南道路建設工事
東海土建(株)

進捗率 99%

工事もいよいよ最終段階となりました。最後まで気を抜かず完了出来るよう工事を進めていきます。

安塚地区

工事⑥ 23号安塚・末広北道路建設工事
アイトム建設(株)

進捗率 99%


去年の11月頃から現場を稼働して約10か月間工事をさせて頂きました。8月末に無事工事完了となりました。安塚町・末広町の皆様にはご理解・ご協力の程ありがとうございました。

玉垣地区

工事⑬ 23号玉垣地区西道路建設工事
(株)杉本組

進捗率 17%

9月も引き続き**補強土壁工事**と**盛土工事**を行っていきます。大型ダンプトラックが頻繁に通行し、ご迷惑をお掛けしますが、ご協力よろしくお願い致します。

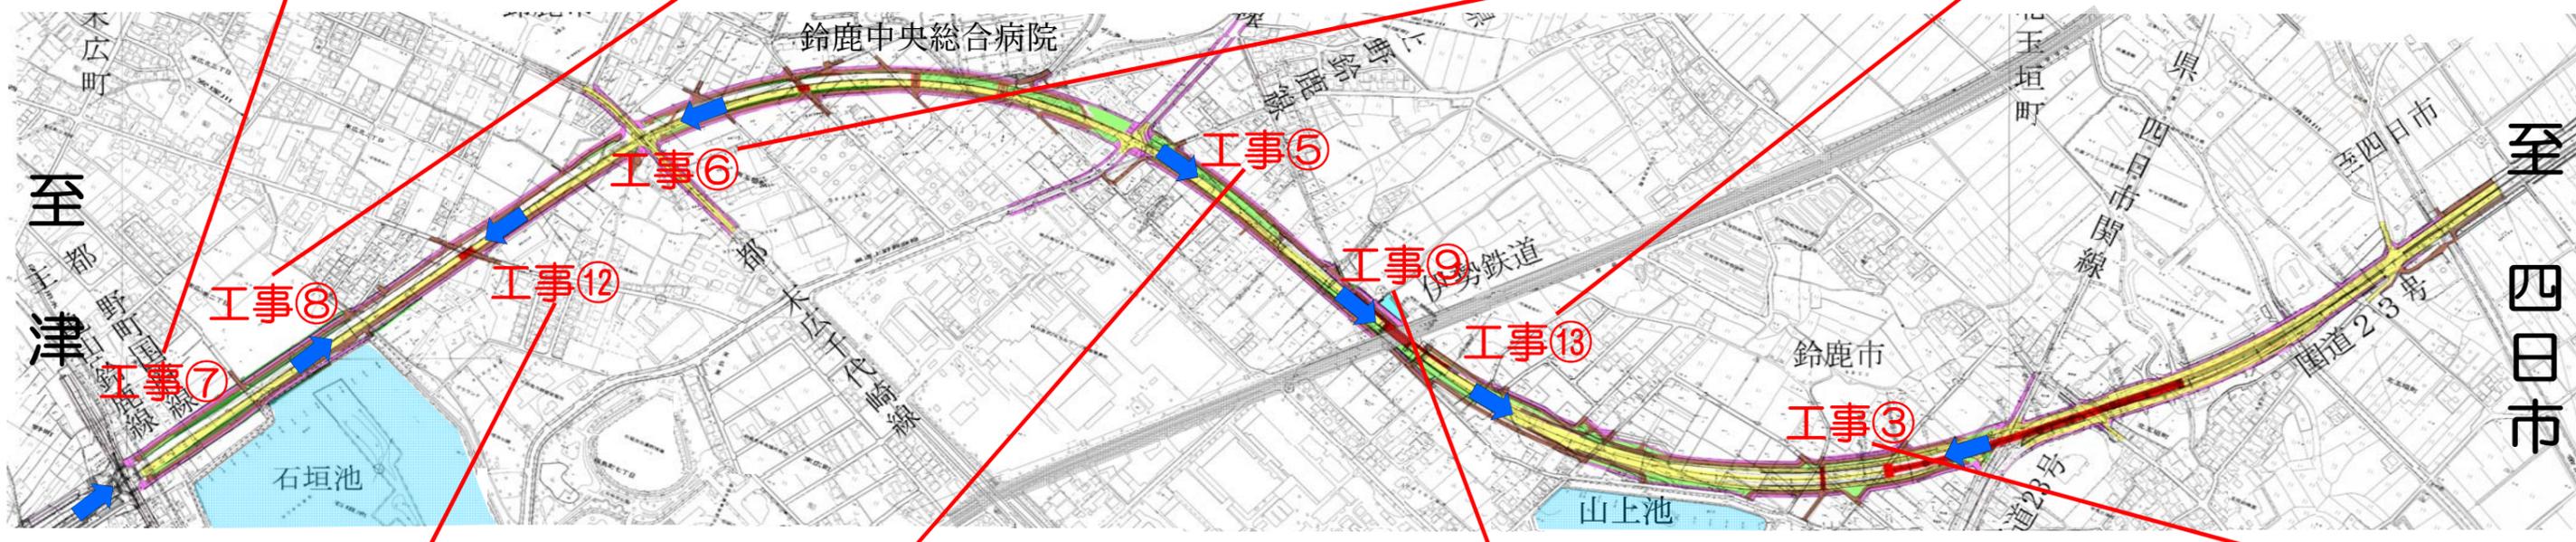

安塚・末広地区

工事⑫ 23号安塚・末広跨道橋PC上部工事
昭和コンクリート工業(株)

進捗率 38%

9月29日と30日に市道安塚149号線を一時通行止規制し、大型クレーンによる安塚跨道橋のPC桁架設を行います。その後10月1日～3日に片側交互通行規制にて吊り足場組立を行います。交通規制により大変ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。高所での作業になりますので特に墜落災害には注意し、安全第一で作業を進めます。

玉垣・安塚地区

工事⑤ 23号玉垣・安塚道路建設工事
(株)谷口建設

進捗率 65%

9月は**補強土壁工事**を行っていきます。引き続き防塵対策に注意して安全第一で作業を進めていきます。よろしくお願いいたします。

安塚地区

工事⑨ 23号安塚北地区道路建設工事
大旺新洋(株)

進捗率 26%

鋼矢板の打設が終わり**調整池の掘削作業**にかかります。残土のため車両が安塚南交差点から出入りします。交通災害、防塵対策を行いながら作業を進めてまいります。

玉垣地区

工事⑬ 23号玉垣道路建設工事
松岡建設(株)

進捗率 78%

8月から**カルバート**の工事を開始し12月末まで足場・鉄筋・型枠・コンクリート打設(5回)の施工を行います。引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。

③23号玉垣 道路建設工事 松岡建設(株) 	⑤23号玉垣・安塚 道路建設工事 株)谷口建設 	⑥23号安塚・末広北 道路建設工事 アイトム建設(株) 	⑦23号末広西 道路建設工事 堀田建設(株) 	⑧23号末広南 道路建設工事 東海土建(株) 
				
地域の皆様が安心できる 安全な工事現場を目指します。	無事故・無災害での完成を 目指して頑張ります。	安全第一で 工事を完成させます。	安全第一で工事を進めます。 工事中はご迷惑をお掛けしますが、 よろしくお願ひします。	安全を最優先に、無事故・ 無災害目指して工事を進めます。
⑨23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株) 	⑩23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 株)駒井ハルテック 	⑪23号安塚・野町 道路建設工事 アイトム建設(株) 	⑫23号安塚・末広 跨道橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株) 	⑬23号玉垣地区 西道路建設工事 株)杉本組 
				
安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。	地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一!!	安全第一で 工事完成を目指します。	地域の皆様には御迷惑を お掛けしますが、安全第一で 工事を進めます。	安心・安全・高品質で 工事を進めていきます。

⑮23号中勢道路 新 整備工事 株)松本組 	⑯23号玉垣地区東 新 道路建設工事 朝日土木(株) 
	
安全第一を心がけます。 ご協力よろしくお願いいたします。	無事故無災害での完成を目指し、 安全第一で工事を進めます。



 **新規工事が始まります** 

23号中勢道路整備工事 (株)松本組
23号玉垣地区東道路建設工事 朝日土木(株)

ご理解・ご協力の程、宜しくお願ひ致します。

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



全線33.8kmのうち、約31km(約92%)が開通しています。
今後の早期開通を目指し、事業を推進していきます。

発行/連絡先 (バックナンバー配布可能です)

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
- 中勢BP工事連絡協議会
- 〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
- TEL : 059-387-8470 FAX : 059-387-8471

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

ホームページからでも、**バックナンバーを、ご覧いただけます**

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>



道路の現状を発見したら・・・
道路緊急ダイヤル「#9910」
通話料無料24時間受付

