

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

- ようやく秋らしい、過ごしやすい気候となってきました。朝晩は冷える日も増えてくる頃ですので、体調管理にはどうぞお気をつけください。
- 中勢バイパス工事に使う土砂運搬車両（ダンプ）には、**黄色いゼッケン**をつけて、安全運転で土の運搬をしています。お気づきの点があれば、鈴鹿国道出張所までご連絡ください。

23
中勢BP
工事関係車両
三重河川国道事務所




中勢バイパス（4工区）の完成イメージを順次紹介します！

中勢バイパス（4工区）の完成イメージを 北から南に 順次ご紹介。

今回は、**中勢バイパス 末広跨道橋 付近** のイメージです。
（前回の末広千代崎線よりも、少し南へ進みました。）

イメージ図

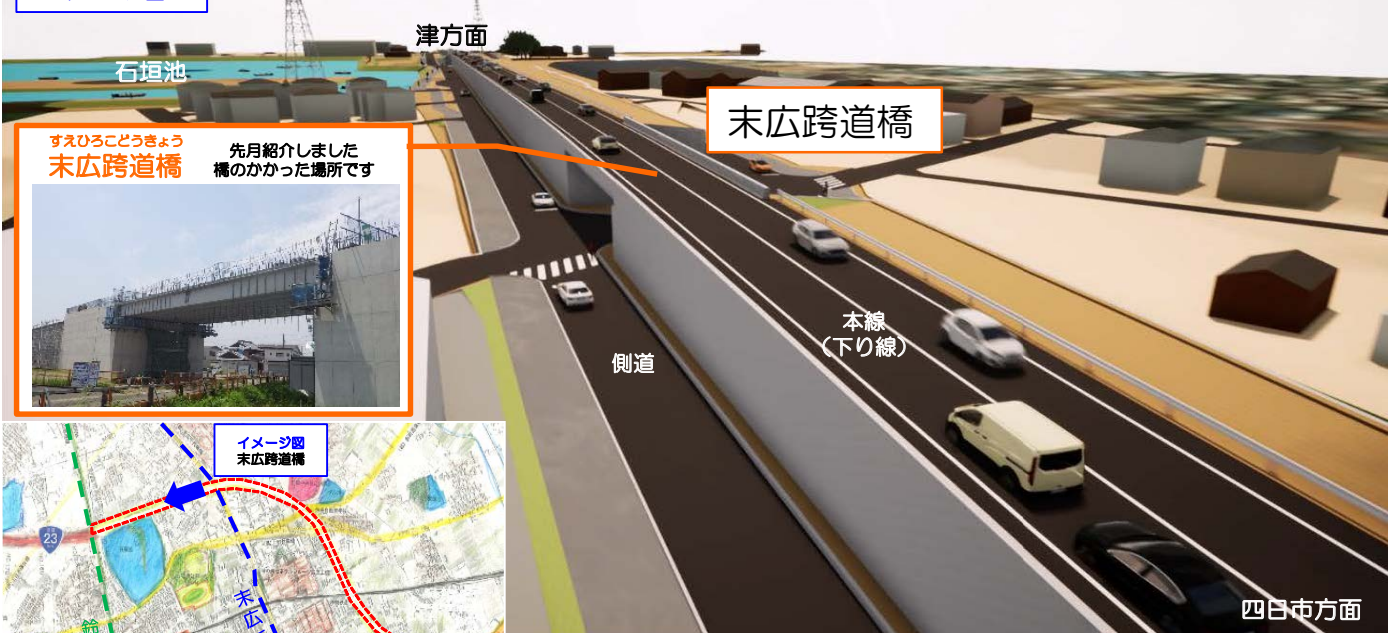

※画像は、あくまでもイメージです

（関係機関との協議等により道路構造の変更の可能性があります）

イメージ画像作成：「令和元年度23号安塚跨道橋下部工事」日本土建(株)

新規工事が始まります！

ご通行の皆様、近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。

23号玉垣跨線橋A2下部工事
23号玉垣地区南道路建設工事
23号末広・野町地区道路建設工事
23号北玉垣地区道路建設工事
23号安塚・末広地区道路建設工事
23号末広地区道路建設工事

日本土建(株)
東海土建(株)
三重農林建設(株)
(株)アイケーディ
三重農林建設(株)
アイトム建設(株)



中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和2年9月23日撮影】

野町・末広地区



工事⑦ 23号末広西道路建設工事
堀田建設(株)
進捗率 94%

工事もいよいよ最終段階となりました。最後まで安全第一で工事を進めます。よろしくお願いします。


玉垣・安塚地区



工事⑤ 23号玉垣・安塚道路建設工事
(株)谷口建設
進捗率 78%

10月は補強土壁工、路体盛土工となります。大型車両の出入りが多くなりますので防塵対策に重点をおいて安全作業にて進めていきます。よろしくお願いします。


玉垣地区

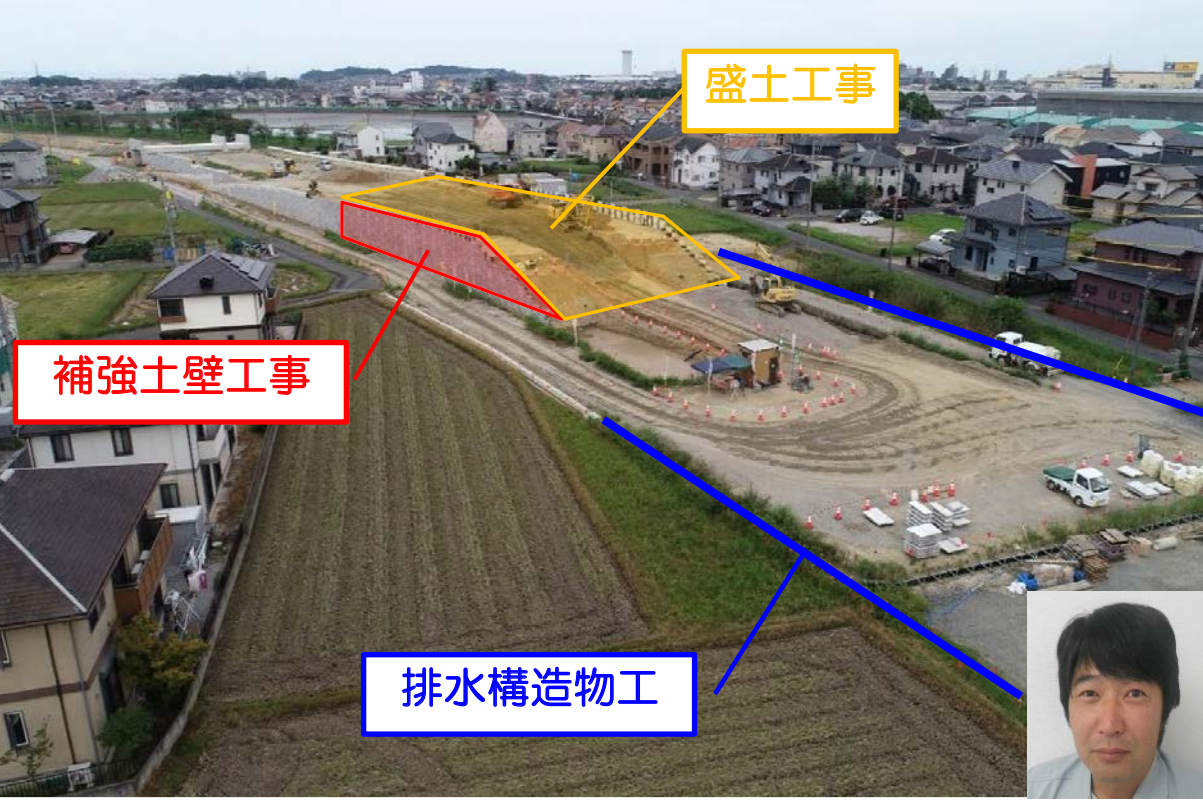

工事⑬ 23号玉垣地区西道路建設工事
(株)杉本組
進捗率 29%


10月も引き続き補強土壁工と盛土工を行っていきます。10月中旬からは排水構造物工の工事も進めて行きます。騒音等でご迷惑をお掛けしていますがご協力お願い致します。

橋梁の工場製作

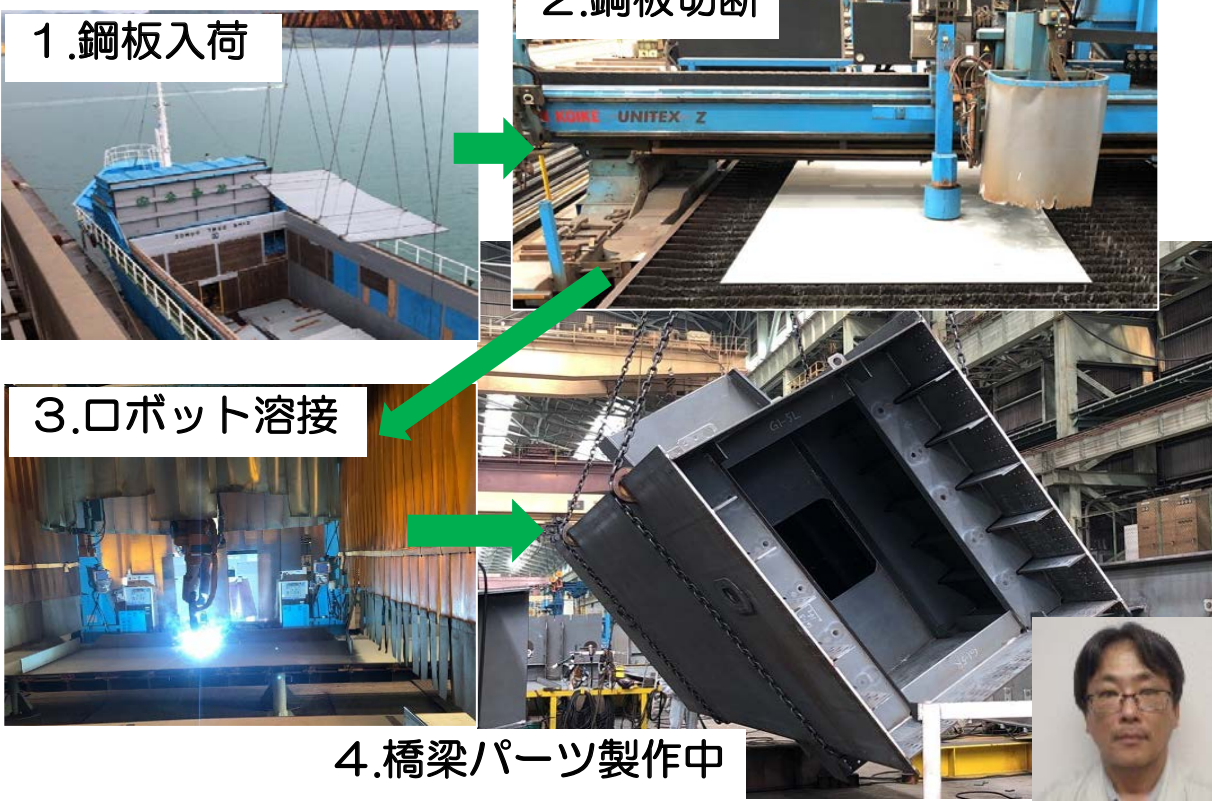

工事 23号北玉垣高架橋鋼上部工事
(株)駒井ハルテック
進捗率 28%

来春からの現場設置に向けて和歌山県の自社工場にて橋梁パーツを製作中です。

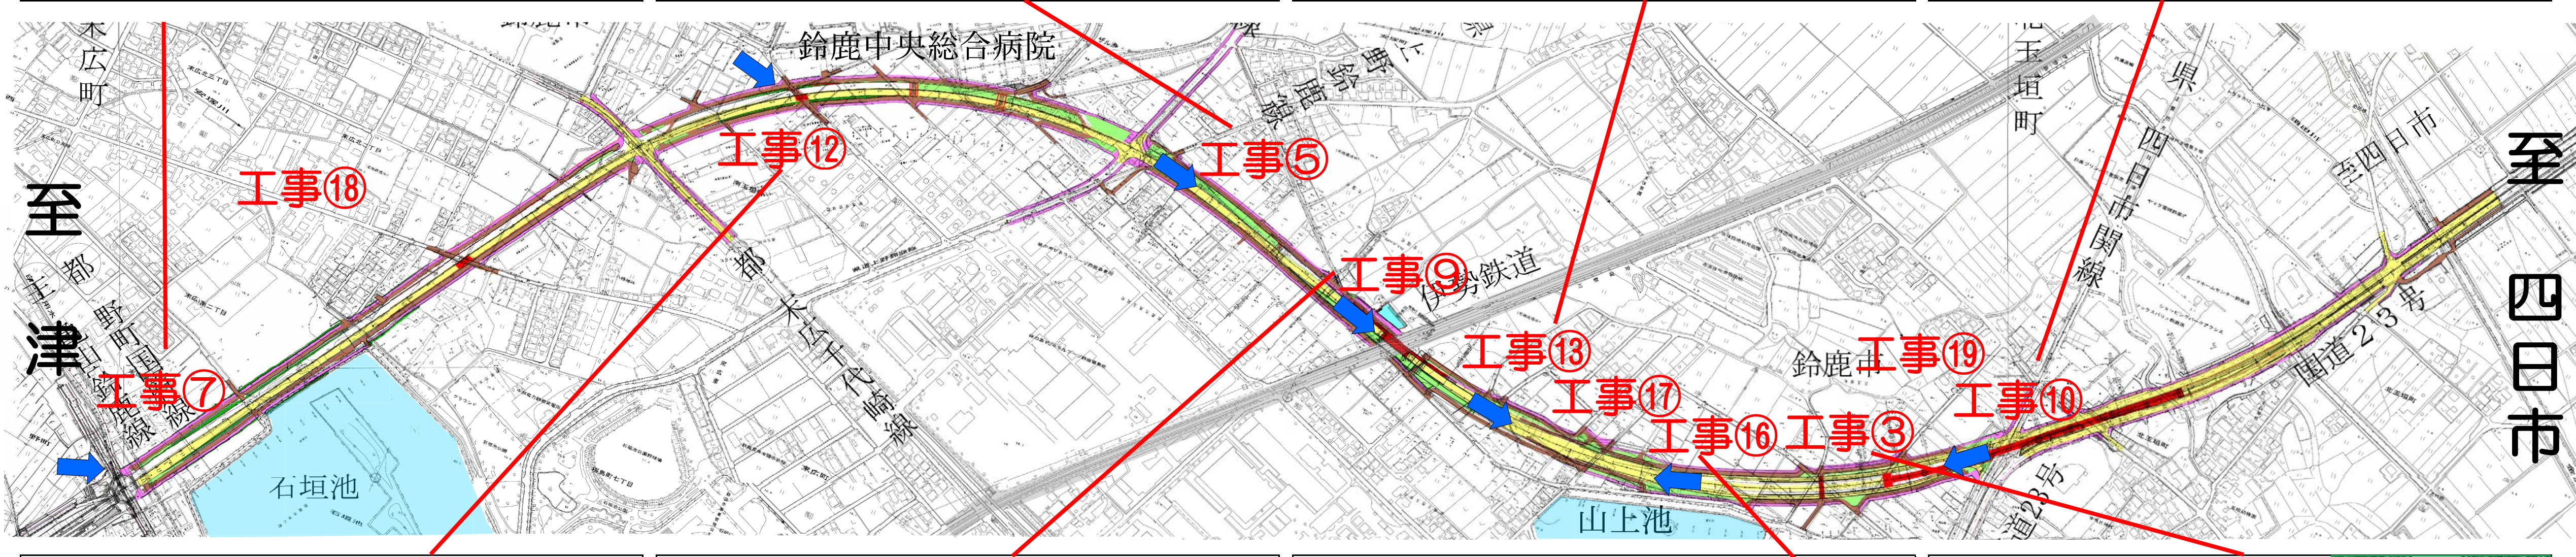

安塚・末広地区



工事⑫ 23号安塚・末広跨道橋PC上部工事
昭和コンクリート工業(株)
進捗率 73%

安塚跨道橋にて10月1日～3日に市道安塚149号線を片側交互通行規制にて吊り足場組立を行います。交通規制により大変ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力の程よろしくお願いします。末広跨道橋では、引き続き橋面工の施工を行います。高所での作業になりますので特に墜落災害には注意し、安全第一で作業を進めます。

安塚地区



工事⑨ 23号安塚北地区道路建設工事
大旺新洋(株)
進捗率 28%

調整池の掘削作業を行います。残土運搬のため工事用車両の通行量が増えますが、交通災害の防止を図り、防塵対策を行いながら作業を進めてまいります。


玉垣地区



工事⑯ 23号玉垣地区東道路建設工事
朝日土木(株)
進捗率 1%

10月中旬から補強土壁工を行います。周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいります。

玉垣地区

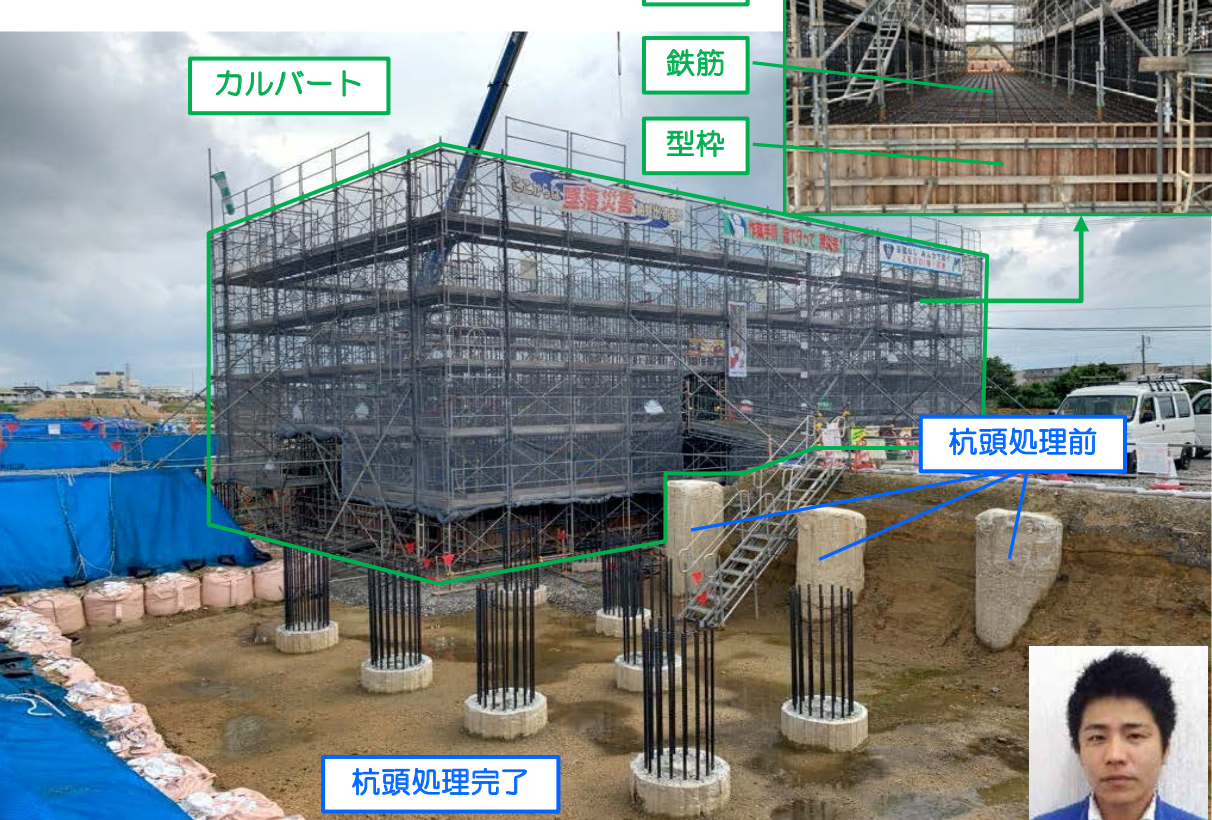

工事③ 23号玉垣道路建設工事
松岡建設(株)
進捗率 82%

現在、カルバートの工事は順調に進んでおり12月末頃まで鉄筋・型枠・コンクリート打設の施工を行います。引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。

③23号玉垣 道路建設工事 松岡建設(株)   地域の皆様が安心できる 安全な工事現場を目指します。	⑤23号玉垣・安塚 道路建設工事 株谷口建設   無事故・無災害での完成を 目指して頑張ります。	⑦23号末広西 道路建設工事 堀田建設(株)   安全第一で工事を進めます。 工事中はご迷惑をお掛けしますが、 よろしくお願いいたします。	⑨23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株)   安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。	⑩23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 株駒井ハルテック   地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!	⑪23号安塚・野町 道路建設工事 アイトム建設(株)   安全第一で 工事完成を目指します。
⑫23号安塚・末広 跨道橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株)   地域の皆様には御迷惑を お掛けしますが、安全第一で 工事を進めます。	⑬23号玉垣地区 西道路建設工事 株杉本組   安心・安全・高品質で 工事を進めています。	⑭23号玉垣跨線橋 A2下部工事 日本土建(株)   安全を何よりも優先し、 工事の完成を目指します。	⑮23号中勢道路 整備工事 株松本組   安全第一を心がけます。 ご協力よろしくお願いいたします。	⑯23号玉垣地区東 道路建設工事 朝日土木(株)   無事故無災害での完成を目指し、 安全第一で工事を進めます。	⑰23号玉垣地区南 道路建設工事 東海土建(株)   安全最優先で、地域の皆様に 喜ばれる工事を目指します。
⑱23号末広・野町 地区道路建設工事 三重農林建設(株)   無事故・無災害で工事の 完成を目指します。	⑲23号北玉垣地区 道路建設工事 株アイケーディ   安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いいたします。	⑳23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)   安全第一 無事故・無災害で工事を進めます。	㉑末広地区 道路建設工事 アイトム建設(株)   無事故・無災害で 工事を完成させます。	 体調管理に気をつけましょう 今の季節は寒暖差による体調不調をおこし やすくなります。新型コロナウイルスだけ でなく、インフルエンザ・風邪の予防対策 をしっかりと行い、帰宅時の手洗いや うがいを行うことは勿論、栄養や休養を 十分にとって、免疫力を高めることも大切 ですね。	

知っていますか？ローリングストック法

10月も台風の季節は続きます。2019年10月の台風発生数は4回でした。(気象庁HPより)
普段からローリングストック法(※)を行い、非常時の飲食を備えることが推奨
されています。まずはできることから初めてみてはいかがでしょうか。
※ローリングストック法…日常的に非常食を食べて、食べたらいきなり買足するという行為を
繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法。



「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



全線33.8kmのうち、約31km(約92%)が開通しています。
今後の早期開通を目指し、事業を推進していきます。

発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
- 中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)



道路の異状を発見したら・・・
道路緊急ダイヤル「#9910」
通話料無料24時間受付
