

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

- 11月に入り、秋も深まってきました。GoToトラベルキャンペーンや、GoToイートキャンペーンを活用し、いつもとは違うプチ贅沢をしてみるのも良いですね。
- 今月は、イメージ図の紹介をお休みさせていただき、10月18日（日）に安塚地区にて工事現場見学会を行いましたので、その模様を紹介致します。

安塚地区にて工事現場見学会を行いました！

日 時： 令和2年10月18日(日)9:00～11:00

参加者： 安塚地区 約40名

場 所： 鈴鹿市安塚地区 工事ヤード

主 催： 三重河川国道事務所工務第二課、鈴鹿国道出張所

協 力： ⑤(株)谷口建設、⑨大旺新洋(株)

内 容： 中勢バイパス事業紹介、工事内容説明、現場見学、質問、作業車体験、記念写真

手形アートで
綺麗な花が咲
きました



工事箇所を歩いて直接現場



を見ながら工事内容の説明



ボックスに手形アート




⑤(株)谷口建設工事現場にて記念撮影



お忙しい中お集まりいただきました地域の皆様、
ありがとうございました。引き続き、**安全第一**
で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力
の程、宜しくお願い致します。


ショベル
カーの
運転席で
にっこり
スマイル

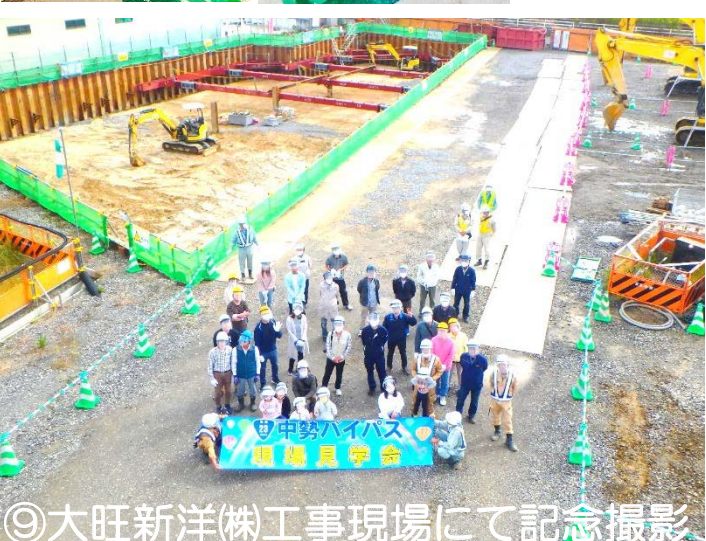

⑨大旺新洋(株)工事現場にて記念撮影



ショベルカー体験

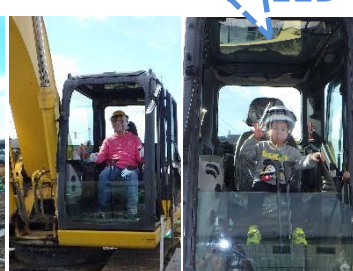

調整池現場見学



高所作業車体験

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和2年10月22日撮影】

安塚・野町地区




工事⑪ 23号安塚・野町道路建設工事
アイトム建設(株)

進捗率 68%

U型擁壁工事を行っております。完成次第、補強土壁工事に取り掛かります。安全第一で工事を進めて行きます。宜しくお願いします。

安塚・末広地区

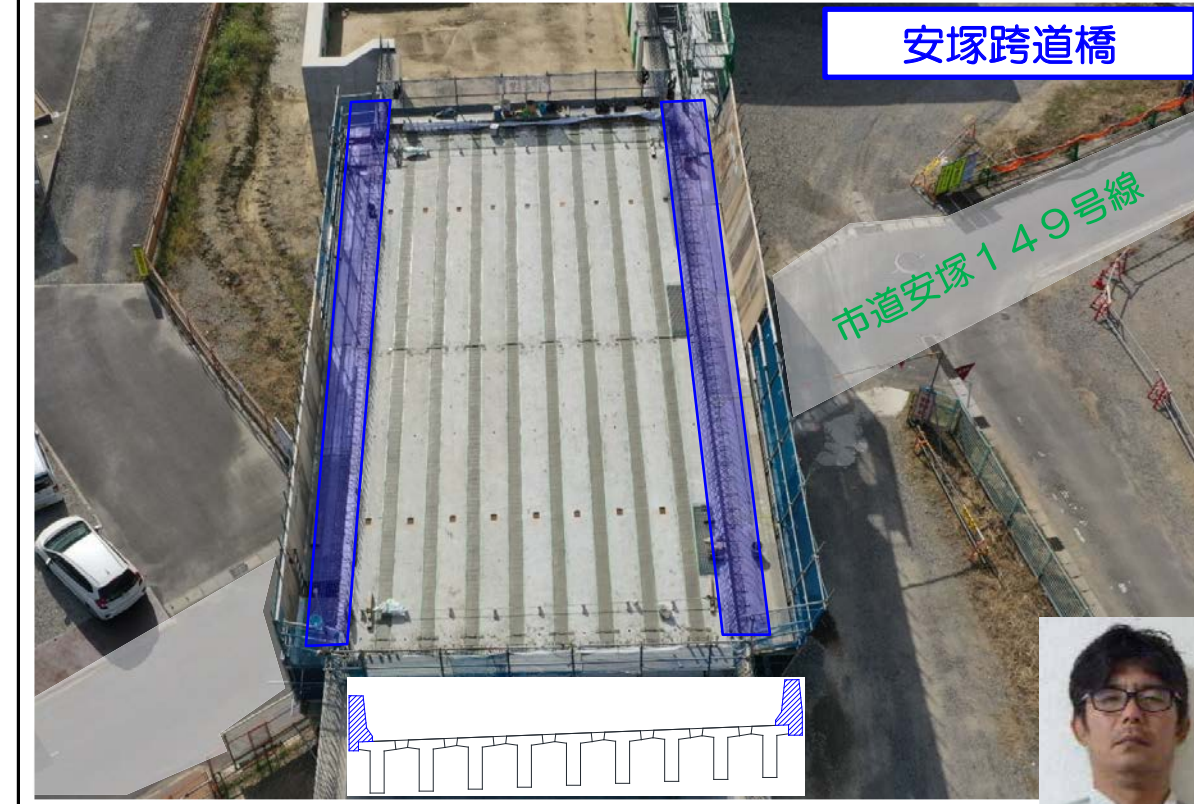


工事⑫ 23号安塚・末広跨道橋PC上部工事
昭和コンクリート工業(株)

進捗率 79%

安塚跨道橋・末広跨道橋にて、壁高欄(コンクリート製の壁のような欄干)部分の施工を行います。高所での作業になりますので特に墜落災害・飛散防止には注意し、安全第一で作業を進めます。

玉垣・安塚地区

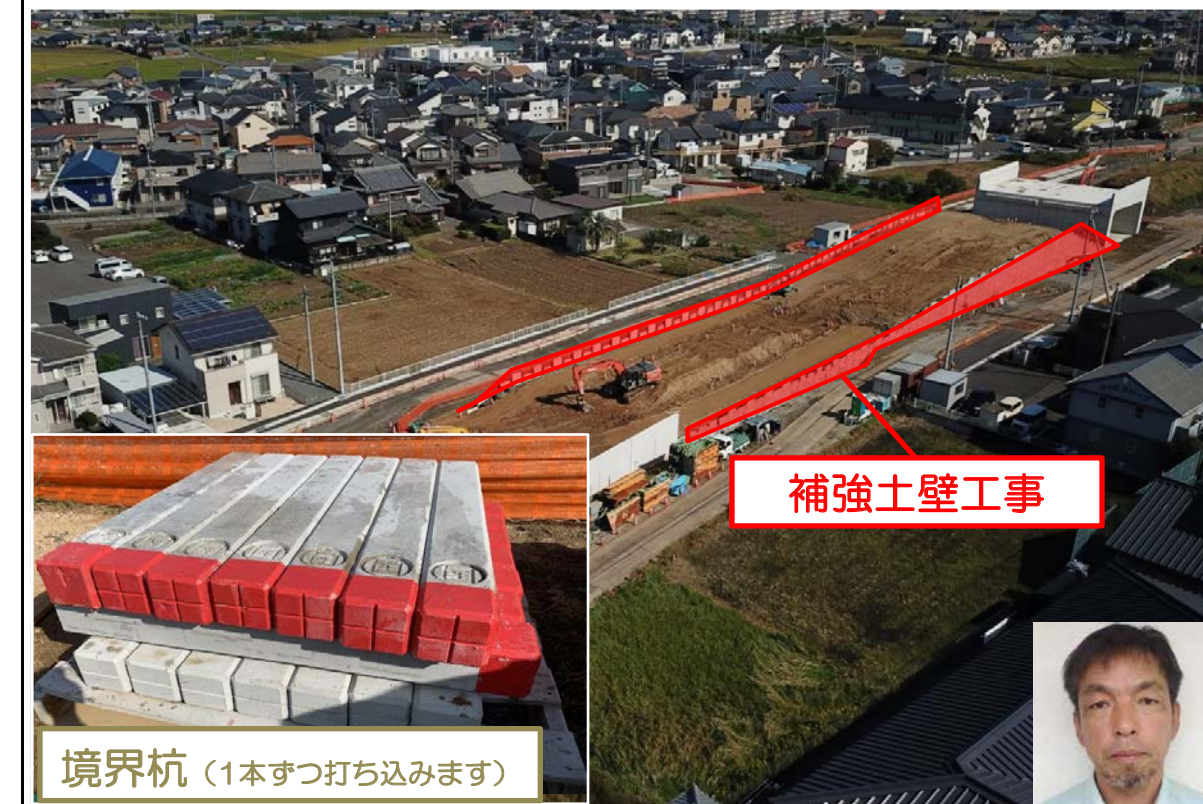

工事⑤ 23号玉垣・安塚道路建設工事
(株)谷口建設

進捗率 90%

11月は補強土壁工事、道路付属施設工(境界杭等)となります。最後まで気を抜かないよう安全作業に努めます。よろしくお願いします。


玉垣地区




工事⑬ 23号玉垣地区西道路建設工事
(株)杉本組

進捗率 45%

11月も引き続き排水構造物工事(水路工事)を行っていきます。民地境界線での作業でご迷惑をお掛けしていますが、ご協力お願いいたします。

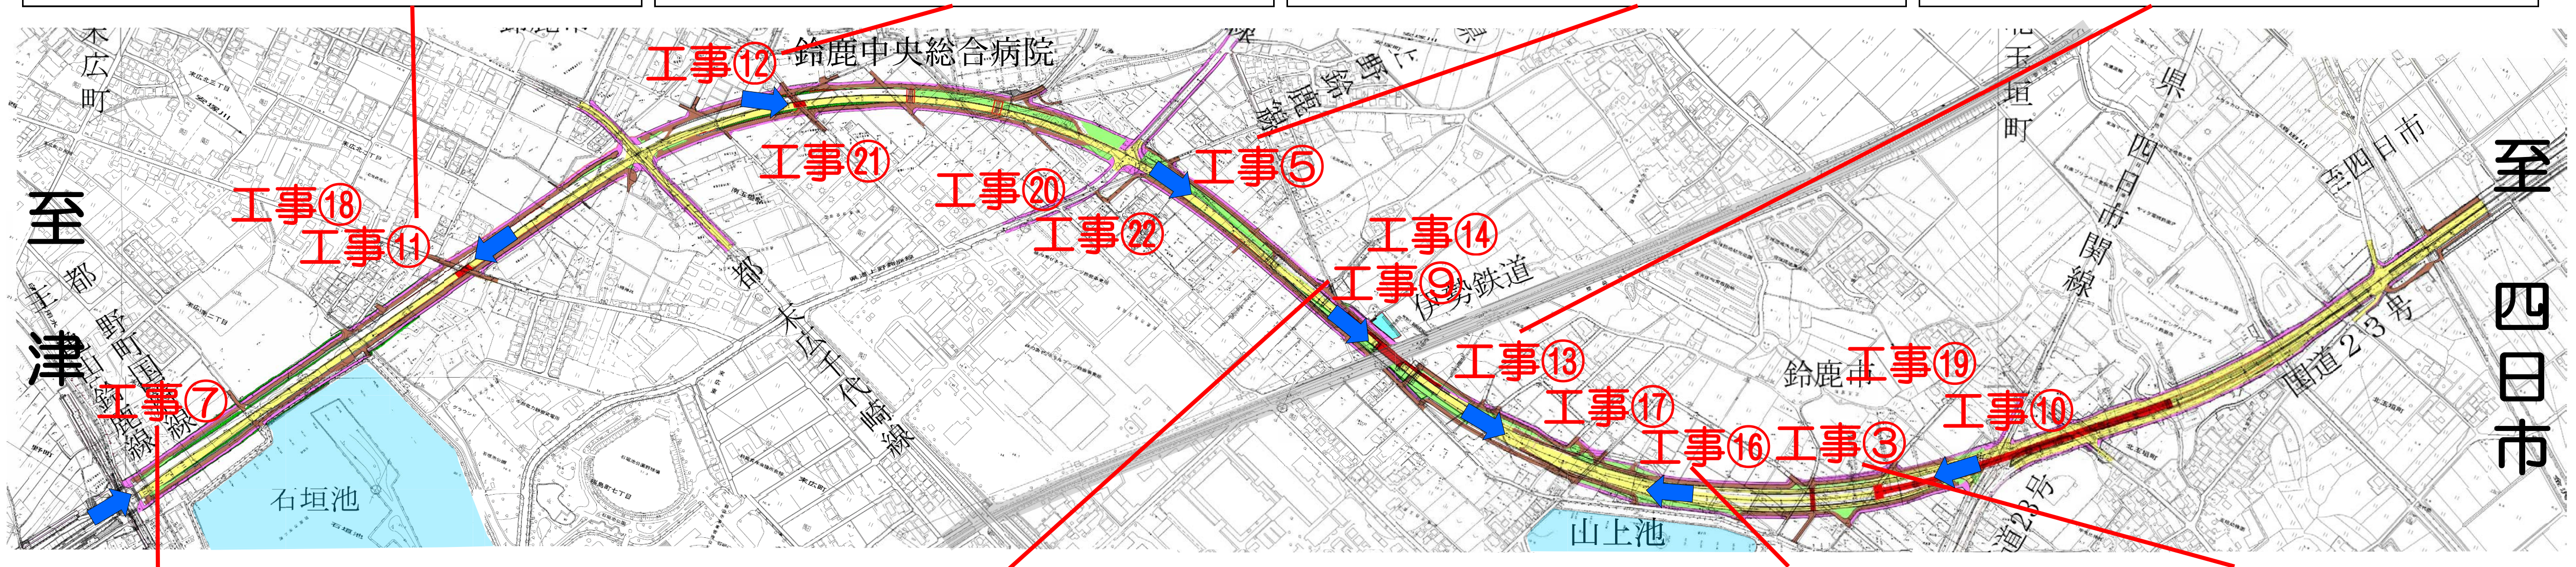

野町・末広地区

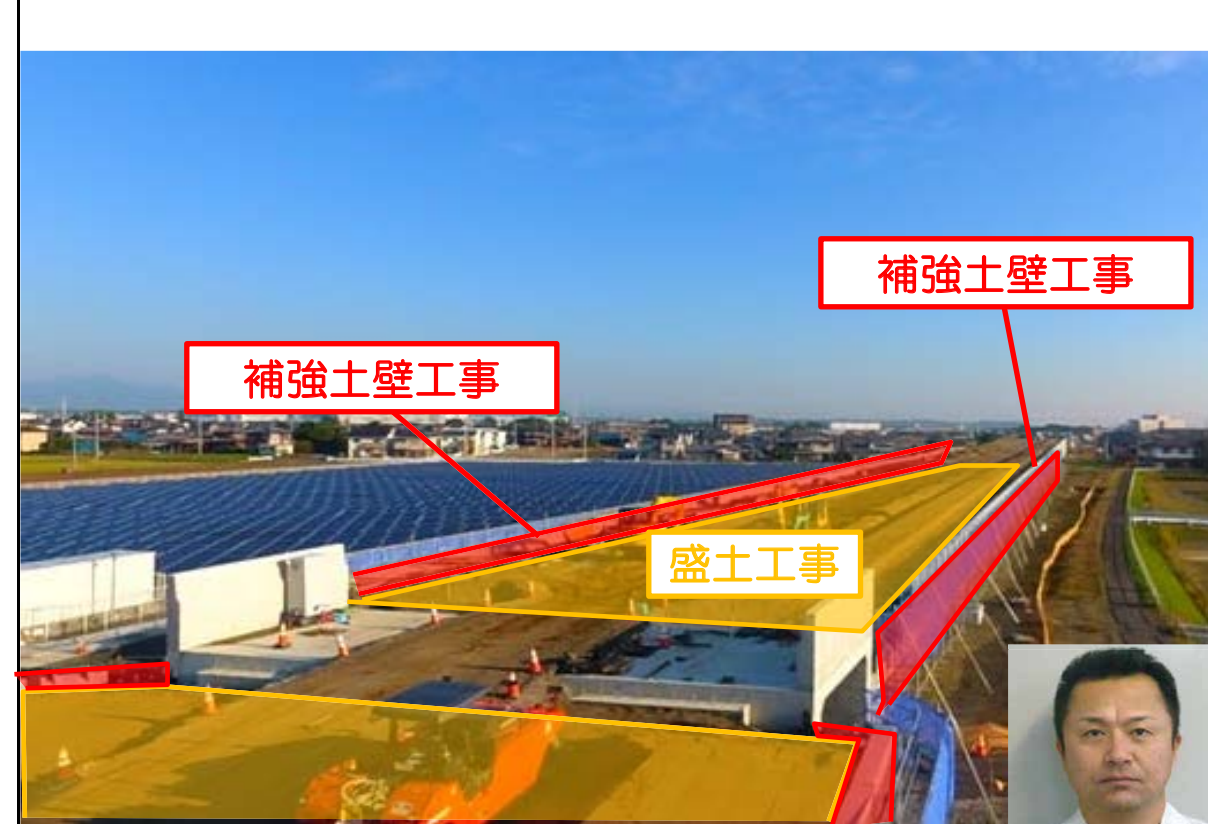

工事⑦ 23号末広西道路建設工事
堀田建設(株)

進捗率 99%

工事はもう少しで完成となりました。最後まで安全第一で工事を進めます。よろしくお願いします。

安塚地区



工事⑨ 23号安塚北地区道路建設工事
大旺新洋(株)

進捗率 37%

調整池工事の床掘作業を引き続き行います。床掘作業においてはダンプトラックでの残土運搬を行います。第三者、一般車優先を心掛け、法令順守に努めます。

玉垣地区




工事⑩ 23号玉垣地区東道路建設工事
朝日土木(株)

進捗率 9%

11月も引き続き補強土壁工を行います。土砂搬入のためダンプトラックの通行量が多くなりますが、周辺に配慮し安全第一で作業を行います。

玉垣地区

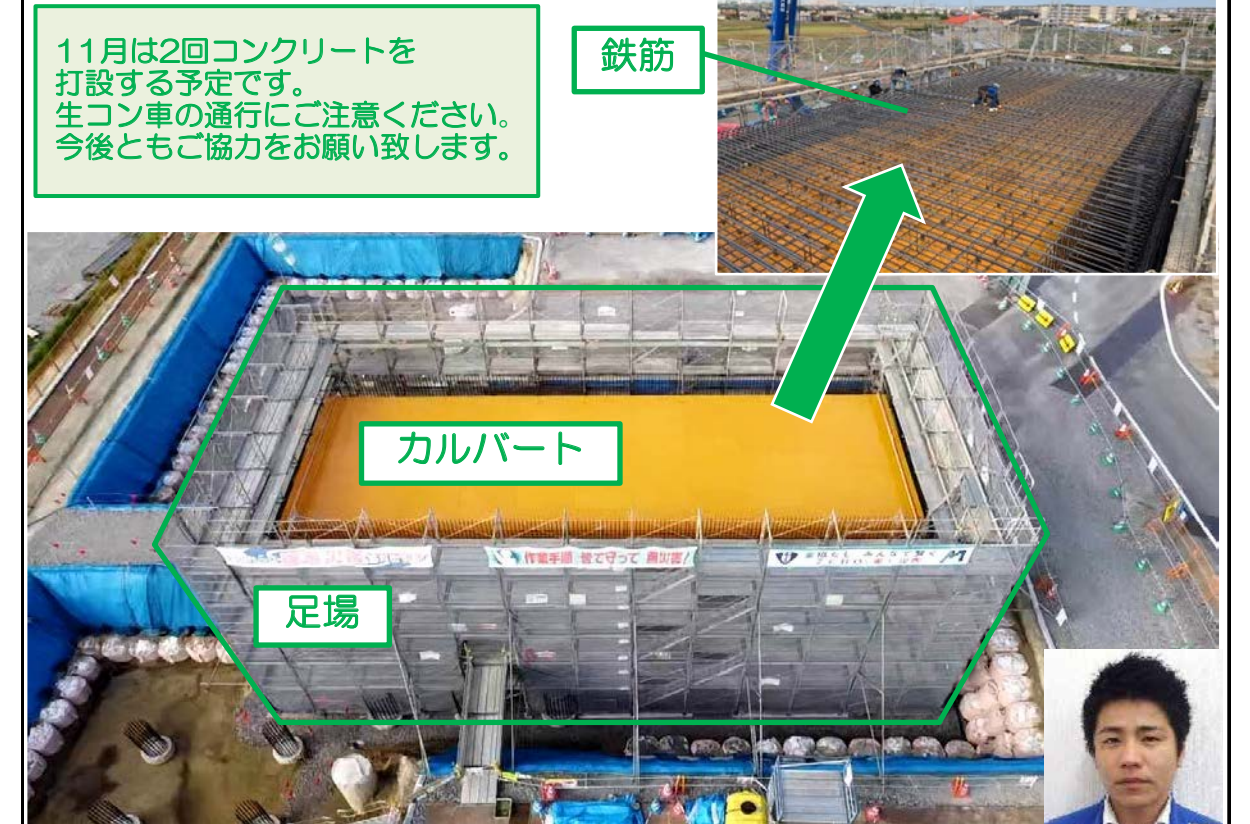

工事③ 23号玉垣道路建設工事
松岡建設(株)

進捗率 86%

現在、カルバートの工事は順調に進んでおり12月末頃まで鉄筋・型枠・コンクリート打設の施工を行います。引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。

中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

③23号玉垣 道路建設工事 松岡建設(株)   地域の皆様が安心できる 安全な工事現場を目指します。	⑤23号玉垣・安塚 道路建設工事 株谷口建設   無事故・無災害での完成を 目指して頑張ります。	⑦23号末広西 道路建設工事 堀田建設(株)   安全第一で工事を進めます。 工事中はご迷惑をお掛けしますが、 よろしくお願い致します。	⑨23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株)   安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。	⑩23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 株駒井ハルテック   地元の方々に永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!	⑪23号安塚・野町 道路建設工事 アイトム建設(株)   安全第一で 工事完成を目指します。
⑫23号安塚・末広 跨道橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株)   地域の皆様には御迷惑を お掛けしますが、安全第一で 工事を進めます。	⑬23号玉垣地区 西道路建設工事 株杉本組   安心・安全・高品質で 工事を進めています。	⑭23号玉垣跨線橋 A2下部工事 日本土建(株)   安全を何よりも優先し、 工事の完成を目指します。	⑮23号中勢道路 整備工事 株松本組   安全第一を心がけます。 ご協力よろしくお願い致します。	⑯23号玉垣地区東 道路建設工事 朝日土木(株)   無事故無災害での完成を目指し、 安全第一で工事を進めます。	⑰23号玉垣地区南 道路建設工事 東海土建(株)   安全最優先で、地域の皆様 に喜ばれる工事を目指します。
⑱23号末広・野町 地区道路建設工事 三重農林建設(株)   無事故・無災害で工事の 完成を目指します。	⑲23号北玉垣地区 道路建設工事 株アイケーディ   安全で品質の良い工事を行っ ていきますのでよろしくお願い致します。	⑳23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)   安全第一 無事故・無災害で工事を進めます。	㉑末広地区 道路建設工事 アイトム建設(株)   無事故・無災害で 工事を完成させます。	㉒玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)   安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。	安全+第一 

11月18日は土木の日

11月18日は『土木の日』です。

土木学会の前身である日本工学会の設立が明治12年11月18日であることと、「土木」という字を分解すると
土 ⇒ 十一 木 ⇒ 十八 となるということが由来とされています。土木は、私たちの生活に欠かせない道路や水道など、街作りという基盤を作るにあたって、とても大切です。土木に関する知識が深まるよう、是非この機会に、身の回りの土木について調べてみるのはいかがでしょうか。

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



全線33.8kmのうち、約31km(約92%)が開通しています。
今後の早期開通を目指し、事業を推進していきます。

発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)



道路の異状を発見したら・・・
道路緊急ダイヤル「#9910」
通話料無料24時間受付
