



# ちゅうばす通信

Route23  
CHUSEI  
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

- 完成イメージ図も、4工区終点まで紹介させていただきました。  
次号からは終点より折り返し起点の北玉垣町交差点へ向けて上り線を紹介していく予定です。
- 年末・年始は交通事故が増加します。冬用装備をしっかりと整え、いつも以上に安全運転を心がけてください。来年も、ちゅうばす通信をどうぞ宜しくお願い致します！

## 中勢バイパス（4工区）の完成イメージを順次紹介します！

中勢バイパス（4工区）の完成イメージを 北から南に 順次ご紹介。

今回は、**中勢バイパス 石垣池 付近、4工区終点（交差点付近）** のイメージです。  
(前回の末広跨道橋よりも、少し南へ進みました。)

イメージ図

5工区（津方面）

4工区終点  
【平面交差点】

鈴鹿亀山線

津方面

鈴鹿亀山線

石垣池

側道

本線  
(下り線)

四日市方面



※画像は、あくまでもイメージです

(関係機関との協議等により道路構造の変更の可能性があります)

イメージ画像作成：「令和元年度23号安塚跨道橋下部工事」日本土建(株)

## 冬の装備は万全ですか？



これからの季節、車にも冬の装備が必要となってきます。**冬用装備は運転者の責任です。**  
準備を怠り、事故をおこしてしまう危険性もあります。本格的な冬が到来する前に、自分の車が冬を迎えられる状態にあるのか、チェックを行いましょう！



三重河川国道事務所HPでは詳しい冬用装備や雪道運転のQ&Aなどを掲載しています。

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/snow/index.html>

# 中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和2年11月24日撮影】

安塚・野町地区

石垣池

末広跨道橋  
(昭和コンクリート工業(株))

U型擁壁工事

補強土壁工事

作業中

工事⑪	23号安塚・野町道路建設工事 アイトム建設(株)	進捗率	75%
-----	-----------------------------	-----	-----

U型擁壁工事は完了しました。引き続き、補強土壁工事を行ってまいります。安全第一で工事を進めていきます。宜しくお願いします。

安塚・末広地区

解体作業

末広跨道橋

市道三田市119号線

工事⑫	23号安塚・末広跨道橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株)	進捗率	90%
-----	------------------------------------	-----	-----

安塚跨道橋・末広跨道橋にて、引き続き壁高欄(コンクリート製の壁のような欄干)部分の施工を行います。壁高欄施工後に片側交互通行規制にて吊り足場の解体を行います。安塚跨道橋12月21日から523日)交通規制により大変ご迷惑をおかけしますが安全第一で作業を行いますのでご理解とご協力の程よろしくお願ひします。

玉垣・安塚地区

路体盛土

工事⑤	23号玉垣・安塚道路建設工事 (株)谷口建設	進捗率	96%
-----	---------------------------	-----	-----

工事もいよいよ12月で完了となります。地域の皆様にはご協力いただき誠にありがとうございました。最後まで気を抜かないように安全に進めてまいります。

玉垣地区


地盤改良工事

伊勢鉄道

山上池

工事⑬	23号玉垣地区西道路建設工事 (株)杉本組	進捗率	72%
-----	--------------------------	-----	-----

12月は地盤改良工事を行います。安全第一で工事を進めていきますので、よろしくお願ひします。

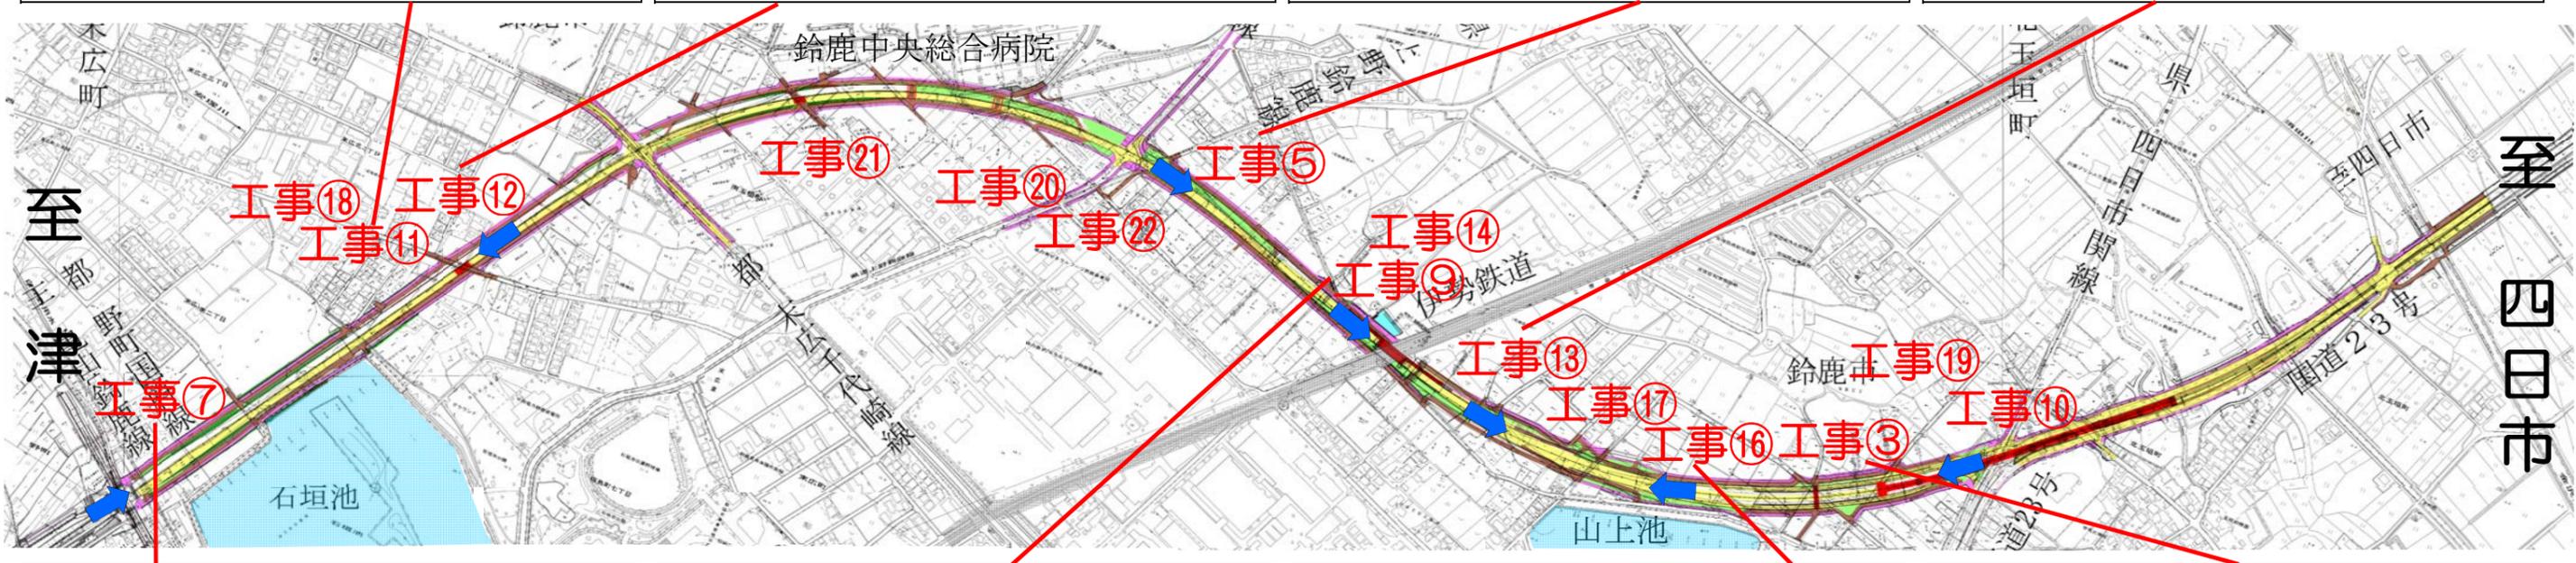

野町・末広地区

工事完成

石垣池

反対側

工事⑦	23号末広西道路建設工事 堀田建設(株)	進捗率	100%
-----	-------------------------	-----	------

工事中は地域の皆様には何かとご不便・ご迷惑をお掛けしましたが、無事に工事を完成することが出来ました。ご協力ありがとうございました。

安塚地区

調整池工事の床掘作業

伊勢鉄道

11月作業

12月作業完了

工事⑨	23号安塚北地区道路建設工事 大旺新洋(株)	進捗率	41%
-----	---------------------------	-----	-----

11月は調整池を掘り進めました。12月には掘り終わり、躯体工事に着手します。防塵対策に努め安全作業を進めていきます。

玉垣地区

補強土壁工事

盛土工事

山上池

工事⑯	23号玉垣地区東道路建設工事 朝日土木(株)	進捗率	26%
-----	---------------------------	-----	-----

12月も引き続き補強土壁工事を行います。土砂搬入のためダンプトラックの通行量が多くなりますが、周辺に配慮し安全第一で作業を行います。

玉垣地区

カルバート

山上池


12月は最後1回のコンクリートを打設する予定です。生コン車の通行にご注意ください。今後ともご協力をお願い致します。

頂版コンクリート打設

工事⑳	23号玉垣道路建設工事 松岡建設(株)	進捗率	95%
-----	------------------------	-----	-----

現在、カルバートの工事は順調に進んでおり12月末頃まで鉄筋・型枠・コンクリート打設の施工を行います。引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。

# 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

<b>③23号玉垣 道路建設工事</b> 松岡建設(株)	<b>⑤23号玉垣・安塚 道路建設工事</b> (株)谷口建設	<b>⑨23号安塚北地区 道路建設工事</b> 大旺新洋(株)	<b>⑩23号北玉垣 高架橋鋼上部工事</b> (株)駒井ハルテック	<b>⑪23号安塚・野町 道路建設工事</b> アイム建設(株)	<b>⑫23号安塚・末広 跨道橋PC上部工事</b> 昭和コンクリート工業(株)
 <p>地域の皆様が安心できる 安全な工事現場を目指します。</p>	 <p>無事故・無災害での完成を 目指して頑張ります。</p>	 <p>安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。</p>	 <p>地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!</p>	 <p>安全第一で 工事完成を目指します。</p>	 <p>地域の皆様には御迷惑を お掛けしますが、安全第一で 工事を進めます。</p>
<b>⑬23号玉垣地区 西道路建設工事</b> (株)杉本組	<b>⑭23号玉垣跨線橋 A2下部工事</b> 日本土建(株)	<b>⑮23号中勢道路 整備工事</b> (株)松本組	<b>⑯23号玉垣地区東 道路建設工事</b> 朝日土木(株)	<b>⑰23号玉垣地区南 道路建設工事</b> 東海土建(株)	<b>⑱23号末広・野町 地区道路建設工事</b> 三重農林建設(株)
 <p>安心・安全・高品質で 工事を進めていきます。</p>	 <p>安全を何よりも優先し、 工事の完成を目指します。</p>	 <p>安全第一を心がけます。 ご協力よろしくお願いたします。</p>	 <p>無事故無災害での完成を目指し、 安全第一で工事を進めます。</p>	 <p>安全最優先で、地域の皆様に 喜ばれる工事を目標とします。</p>	 <p>無事故・無災害で工事の 完成を目指します。</p>
<b>⑲23号北玉垣地区 道路建設工事</b> (株)アイケーディ	<b>⑳23号安塚・末広 地区道路建設工事</b> 三重農林建設(株)	<b>㉑末広地区 道路建設工事</b> アイム建設(株)	<b>㉒玉垣地区 道路建設工事</b> 中井土木(株)	 <p>12/1~12/10 年末の交通安全 県民運動 交通安全マナーを守りましょう</p>	
 <p>安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いします。</p>	 <p>安全 第一 無事故・無災害で工事を進めます。</p>	 <p>無事故・無災害で 工事を完成させます。</p>	 <p>安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。</p>		

## 「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



全線33.8kmのうち、約31km(約92%)が開通しています。  
今後の早期開通を目指し、事業を推進していきます。

### 発行/連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL : 059-387-8470 FAX : 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP  
(スマートフォン用)



道路の異状を発見したら・・・  
道路緊急ダイヤル「#9910」  
通話料無料24時間受付

