



ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

明けましておめでとうございます

謹賀新年

- 2020年は私たちの生活様式がガラリと変わるなど、めまぐるしい1年でした。2021年は明るいニュースで溢れる年になると良いですね。
- 昨年の11月12月より、新型コロナウイルス流行の第三波がきております。マスクの着用・3密の回避・手洗い・消毒など、改めて基本的な対策の徹底を行い、感染予防に努めてください。



中勢バイパス（4工区）の完成イメージ図を順次紹介します！

中勢バイパス（4工区）の完成イメージを順次ご紹介。

今回は、**中勢バイパス4工区終点（交差点）より、四日市方面を望んだ**イメージ図です。徐々にイメージ図に近づいていく様子を、写真にて定期的にお伝え致します。



12月現在の様子

※画像は、あくまでもイメージです
(関係機関との協議等により道路構造の変更の可能性があります)
イメージ画像作成：「令和元年度23号安塚跨道橋下部工事」日本土建(株)

写真提供：アイトム建設(株)

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和2年12月18日撮影】



安塚・野町地区


石垣池

市道三日市1号線

補強土壁工事

工事⑪	23号安塚・野町道路建設工事 アイトム建設(株)	進捗率	85%
-----	-----------------------------	-----	-----

引き続き補強土壁工事の施工を行っております。これからも、安全を第一に無事故・無災害で工事を完成できるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。

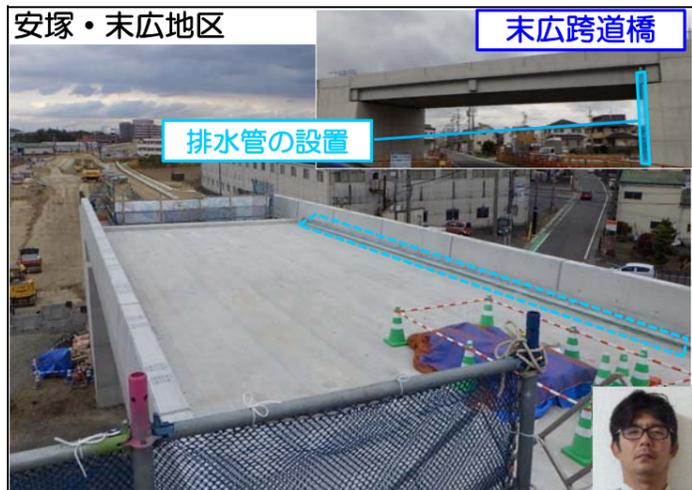

安塚・末広地区

末広跨道橋

排水管の設置

工事⑫	23号安塚・末広跨道橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株)	進捗率	97%
-----	------------------------------------	-----	-----

安塚跨道橋・末広跨道橋にて排水管の設置を行い、1月末には施工完了となります。地域の皆様にはご協力いただき誠にありがとうございました。最後まで気を抜かないように安全に進めてまいります。




玉垣・安塚地区

工事完成

工事⑥	23号玉垣・安塚道路建設工事 (株)谷口建設	進捗率	100%
-----	---------------------------	-----	------

近隣住民の皆様には何かとご不便をおかけしましたが、工事を完成することができました。ご協力ありがとうございました。

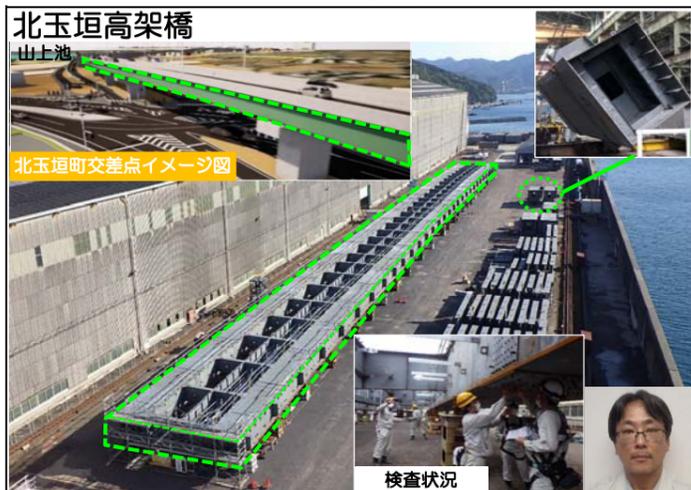

北玉垣高架橋

山上池

北玉垣町交差点イメージ図

検査状況

工事⑩	23号北玉垣高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック	進捗率	35%
-----	------------------------------	-----	-----

〔工場で橋桁製作中〕来春からの現場設置に向けて和歌山県の自社工場にて橋梁パーツを製作中です。(写真は仮組の状態です)



安塚地区

調整池工事の鉄筋組立作業

伊勢鉄道(株)

底板コンクリート打設

工事⑨	23号安塚北地区道路建設工事 大旺新洋(株)	進捗率	46%
-----	---------------------------	-----	-----

1月は鉄筋を組み、型枠を組み込んで底板コンクリートを打設します。生コン車が多く出入りしますので、誘導を確実にし事故防止に努めるとともに、防塵対策も確実にし安全作業を進めます。



玉垣地区

地盤改良工事

伊勢鉄道(株)

工事⑬	23号玉垣地区西道路建設工事 (株)杉本組	進捗率	79%
-----	--------------------------	-----	-----

1月も引き続き地盤改良工事を行います。安全第一で工事を進めていきますので、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。



玉垣地区


補強土壁工事

山上池

盛土工事

工事⑭	23号玉垣地区東道路建設工事 朝日土木(株)	進捗率	52%
-----	---------------------------	-----	-----

あけましておめでとうございます。1月も引き続き補強土壁工事を行います。土砂搬入のためダンプトラックの通行量が多くなりますが、周辺に配慮し安全第一で作業を行います。

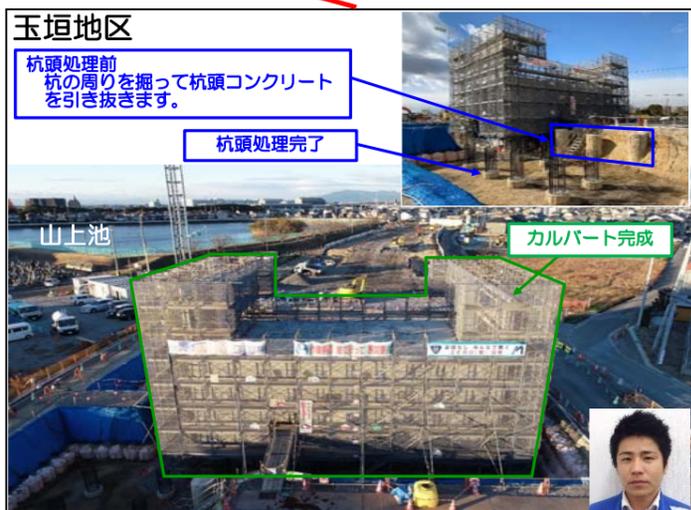

玉垣地区

杭頭処理前
杭の周りを掘って杭頭コンクリートを引き抜きます。

杭頭処理完了

カルバート完成

工事⑳	23号玉垣道路建設工事 松岡建設(株)	進捗率	97%
-----	------------------------	-----	-----

12月末にてカルバートが完成し、1月からは足場解体と杭頭処理を行います。工事の完成が近づいてきましたが、引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。

中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

③23号玉垣 道路建設工事 松岡建設(株) 	⑨23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株) 	⑩23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック 	⑪23号安塚・野町 道路建設工事 アイテム建設(株) 	⑫23号安塚・末広 跨道橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株) 
				
地域の皆様が安心できる安全な工事現場を目指します。	安全と品質を重視し良質な工事を提供します。	地元の方々に末永く利用頂ける良い橋の完成を目指して安全第一で!	安全第一で工事完成を目指します。	地域の皆様には御迷惑をお掛けしますが、安全第一で工事を進めます。
⑬23号玉垣地区 西道路建設工事 (株)杉本組 	⑭23号玉垣跨線橋 A2下部工事 日本土建(株) 	⑮23号中勢道路 整備工事 (株)松本組 	⑯23号玉垣地区東 道路建設工事 朝日土木(株) 	⑰23号玉垣地区南 道路建設工事 東海土建(株) 
				
安心・安全・高品質で工事を進めていきます。	安全を何よりも優先し、工事の完成を目指します。	安全第一を心がけます。ご協力よろしくお願ひいたします。	無事故無災害での完成を目指し、安全第一で工事を進めます。	安全最優先で、地域の皆様に喜ばれる工事を目指します。
⑱23号末広・野町 地区道路建設工事 三重農林建設(株) 	⑲23号北玉垣地区 道路建設工事 (株)アイケーティ 	⑳23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株) 	㉑末広地区 道路建設工事 アイテム建設(株) 	㉒玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株) 
				
無事故・無災害で工事の完成を目指します。	安全で品質の良い工事を行ってまいりますのでよろしくお願ひします。	安全第一 無事故・無災害で工事を進めます。	無事故・無災害で工事を完成させます。	安全第一を心掛け、笑顔の多い現場作りをします。



1月20日は“大寒(だいかん)”寒さがもっとも厳しくなる頃です。普段以上の防寒対策をして、温かいものを食べたり、ゆっくり湯船に浸かるなど、疲労回復に繋がることを行い、体調管理に努めましょう!



「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



全線33.8kmのうち、約31km(約92%)が開通しています。今後の早期開通を目指し、事業を推進していきます。

発行/連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP (スマートフォン用)



道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル「#9910」通話料無料24時間受付

