



# ちゅうばす通信

Route23  
CHUSEI  
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

1月14日に、三重県知事より“緊急警戒宣言”が出されました。緊急事態宣言と同様に、2月7日までを期間としています。不要不急の外出を避け、最大限の感染防止対策を行ってください。

三重河川国道事務所でも、テレワークや、検温、手指の消毒、使用頻度の高い箇所の消毒（スイッチ、ドアノブなど）、こまめな換気、またweb会議の活用を行うなど、一人ひとりが早期収束に向けて、感染しない・させない対策を行っております。



## 北玉垣高架橋の橋桁を工場で作っています

いよいよ3月より北玉垣高架橋鋼上部工事（全長415m）が、現場で始まります。鋼橋上部工は一見シンプルに見えますが、中身は数々の鋼板（厚さ9～50mm）を使用したパーツを組み合わせた複雑な構造をしています。次号にて、4月から始まる桁架設による交通規制のお知らせを致します。



山上池

北玉垣高架橋イメージ図

四日市→津方面

北玉垣交差点

津→四日市方面

※画像は、あくまでもイメージです

（関係機関との協議等により道路構造の変更の可能性があります）

イメージ画像作成：「令和元年度23号安塚跨道橋下部工事」日本土建（株）

写真提供：23号北玉垣高架橋鋼上部工事（株）駒井ハルテック



塗装前完成製品



各種溶接作業



パーツ製作中

# 中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和3年1月20日撮影】


## 安塚・野町地区



**工事⑪** 23号安塚・野町道路建設工事  
アイトム建設(株) 進捗率 95%

引き続き**補強土壁工事**の施工を行っております。2月末には補強土壁が完成予定となります。よろしくお願いいたします。

## 安塚・末広地区

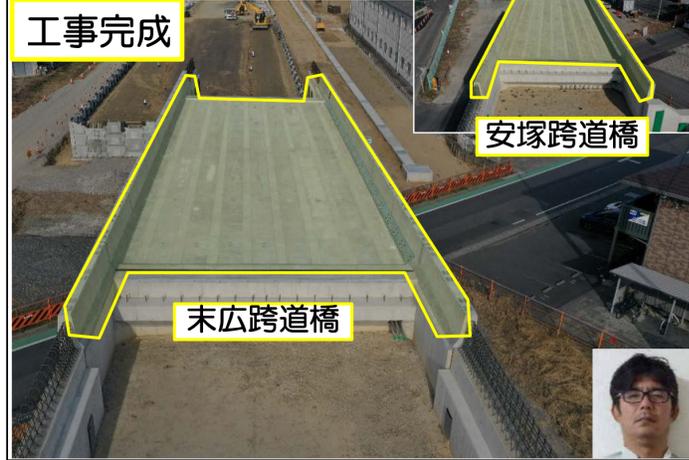

**工事⑫** 23号安塚・末広跨道橋PC上部工事  
昭和コンクリート工業(株) 進捗率 100%


工事中は、地域の皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけしましたが、無事に工事を完成することが出来ました。ご協力ありがとうございました。

# トピックス 1月28日(木)より徳田町北交差点の形状が変わりました。


一般国道23号中勢バイパスは、平成31年に鈴鹿・津工区(延長2.9km)が開通し、徳田町北交差点の上り線左折(亀山市方面)、下り線右折(亀山市方面)の渋滞発生が顕著となりました。この渋滞を緩和させるため、上り線は**直進車線の増設**、下り線は**右折車線の延伸**工事を行っていましたが、完了しましたのでお知らせ致します。工事期間中、ご協力いただきありがとうございました。

【区間・延長】 鈴鹿市稲生町字縄手～鈴鹿市御園町字鎌田

写真提供：23号安塚・野町道路建設工事 アイトム建設(株)

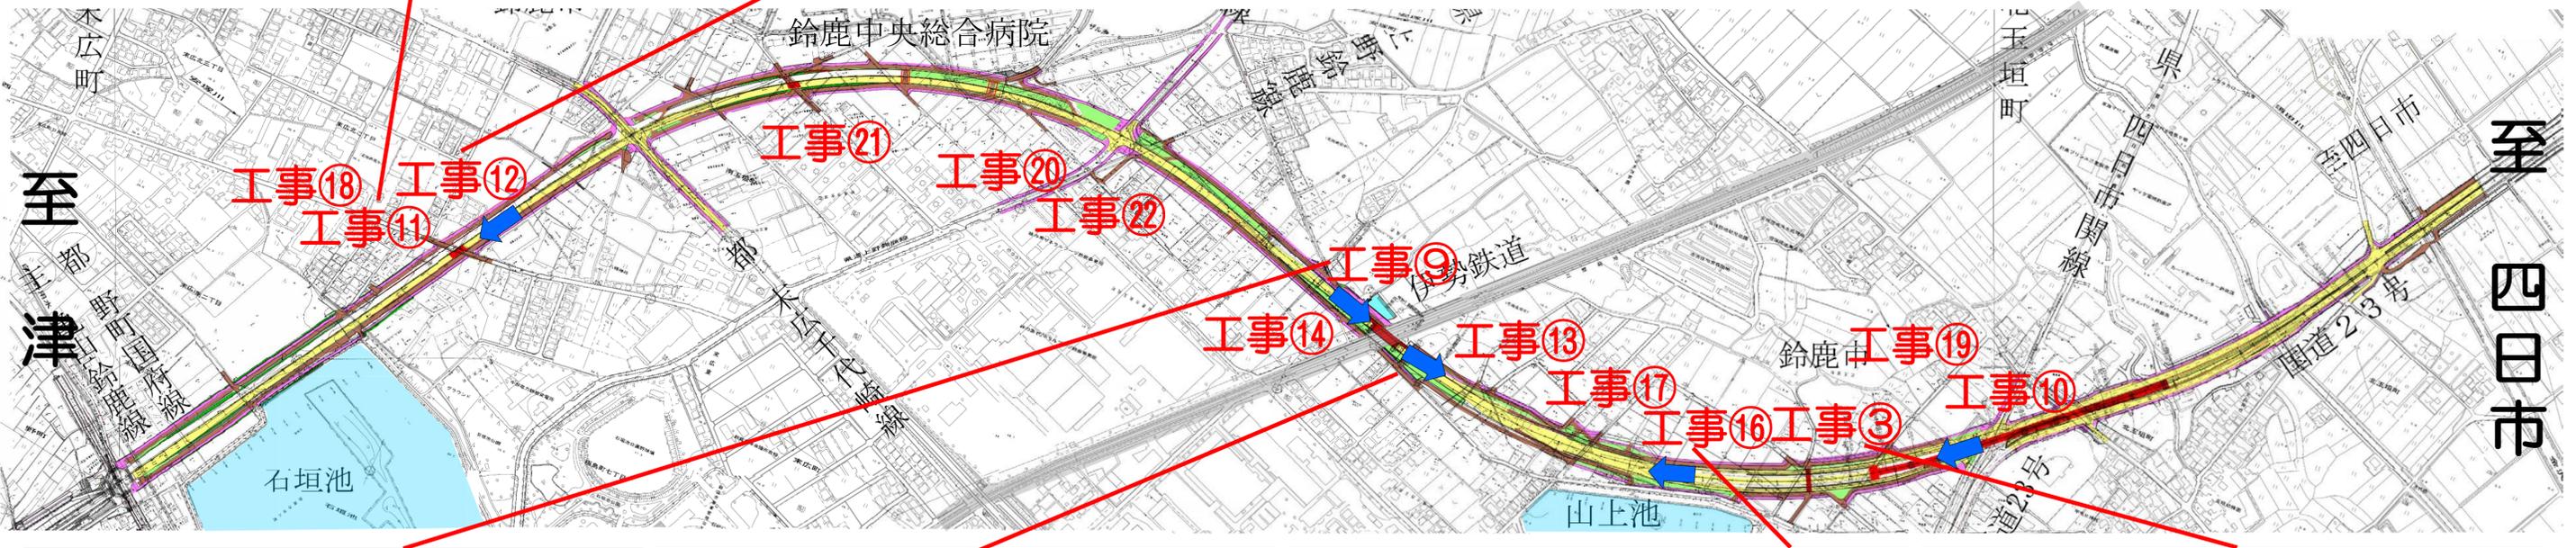

## 安塚地区

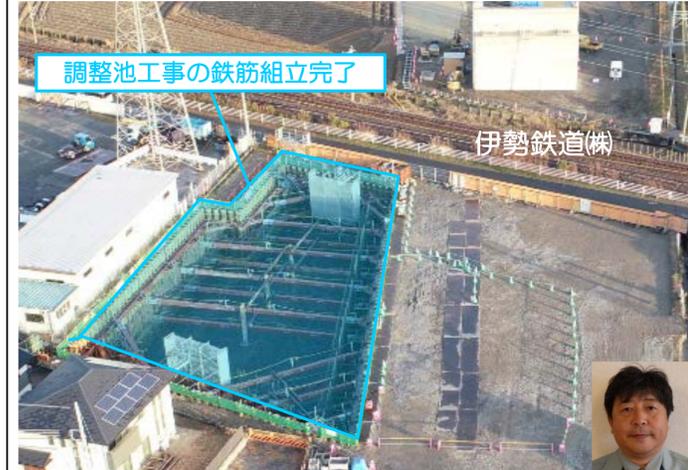

**工事⑨** 23号安塚北地区道路建設工事  
大旺新洋(株) 進捗率 70%

1月は**調整池工事**の底板部のコンクリートを打設しました。これから壁の工事へ移行していきます。生コン打設では早い時間からの打設に協力いただきありがとうございました。引き続き工事を安全に進めていきます。

## 玉垣地区



**工事⑬** 23号玉垣地区西道路建設工事  
(株)杉本組 進捗率 90%

2月は**地盤改良工事**、**道路付属施設工事**(境界杭)を行います。工事もう少しで完成となりますので、最後まで気を抜かないよう安全第一で作業を進めてまいります。


## 玉垣地区



**工事⑯** 23号玉垣地区東道路建設工事  
朝日土木(株) 進捗率 76%

今月も**補強土壁工事**を施工していきます。終盤に差し掛かっていますが引き続き土砂搬入のためダンプトラックの通行量が多くなります。周辺に配慮し安全第一で作業を行います。


## 玉垣地区

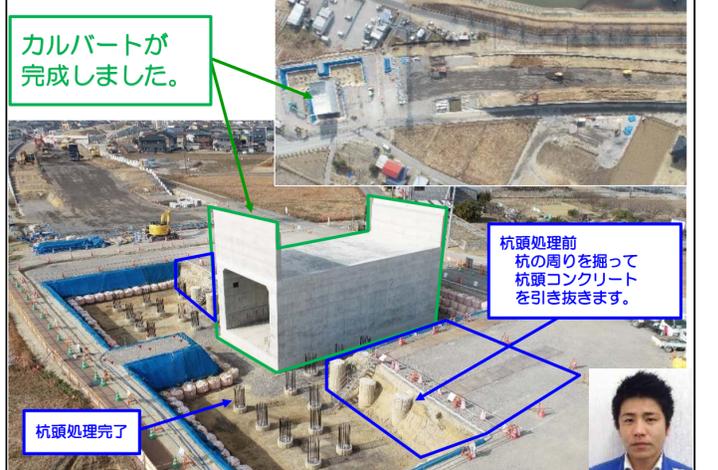

**工事⑳** 23号玉垣道路建設工事  
松岡建設(株) 進捗率 98%

**カルバート**が完成し、現在**掘削**と**杭頭処理**を行っています。工事の完成が近づいてきましたが、引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。

# 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

⑨23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株)	⑩23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック	⑪23号安塚・野町 道路建設工事 アイトム建設(株)	⑬23号玉垣地区 西道路建設工事 (株)杉本組	⑭23号玉垣跨線橋 A2下部工事 日本土建(株)
 <p>安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。</p>	 <p>地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!</p>	 <p>安全第一で 工事完成を目指します。</p>	 <p>安心・安全・高品質で 工事を進めています。</p>	 <p>安全を何よりも優先し、 工事の完成を目指します。</p>
⑮23号中勢道路 整備工事 (株)松本組	⑯23号玉垣地区東 道路建設工事 朝日土木(株)	⑰23号玉垣地区南 道路建設工事 東海土建(株)	⑱23号末広・野町 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	⑲23号北玉垣地区 道路建設工事 (株)アイケーディ
 <p>安全第一を心がけます。 ご協力よろしくお願いいたします。</p>	 <p>無事故無災害での完成を目指し、 安全第一で工事を進めます。</p>	 <p>安全最優先で、地域の皆様に 喜ばれる工事を目指します。</p>	 <p>無事故・無災害で工事の 完成を目指します。</p>	 <p>安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしく願います。</p>
⑳23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	㉑末広地区 道路建設工事 アイトム建設(株)	㉒玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)	工事現場の豆知識  工事現場の近くで、この ような工事に関する注意看 板を一度は目にしたことが あるかと思いますが。道路は 公共のスペースなので、看 板を立てかける際は、市道 なら市の、県道なら県の許 可をいただいています。	
 <p>安全 第一 無事故・無災害で工事を進めます。</p>	 <p>無事故・無災害で 工事を完成させます。</p>	 <p>安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。</p>		

## 「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



### 発行/連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP  
(スマートフォン用)



道路の真状を発見したら  
道路緊急  
ダイヤル #9910

