



あゆばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

- 2021年も3月となり、徐々に春の気配がしてきました。以前よりも日が暮れるのが遅くなり、気温も暖かくなってきていますね。このコロナ禍で外出する機会が減り、例年よりも、屋外で季節を感じることが少なくなったように思います。たまには健康の為にも散歩などして、季節の移り変わりを感じてみるのも良いかもしれませんね。
- 3月といえば卒業シーズンでもあります。中勢バイパスの工事でも3月をもって工事を終える施工業者さんもあります。中勢BP工事連絡協議会のスローガン“妥協なし みんなで繋ぐ ZERO（零）災害”を、最後まで継続していただき、次の工事へバトンを繋いでもらいます！

北玉垣町交差点付近交通規制のお知らせ

先月号にて紹介しました、北玉垣高架橋鋼上部工事に伴う交通規制についてご案内いたします。交通規制期間中はご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。令和3年7月に、交差点上で大規模な架設工事を予定しています。その際は県道・市道の通行止めも予定していますので、改めてお知らせいたします。

中勢バイパス工事により鈴鹿市北玉垣町付近の国道23号にて交通規制を行います。令和3年4月から、高架橋の橋げた架設工事にて**夜間（21時～翌朝6時）**に行いますので、通行にはご注意願います。

<位置図>

<交通規制箇所拡大図>

区間は、鈴鹿市 **肥田町** 交差点 から 鈴鹿市 **西玉垣町** 交差点 まで

【交通規制①】
1車線規制

令和3年4月初旬頃から交通規制を開始

橋げた架設工事では11月下旬頃まで、**断続的に夜間の1車線規制を予定**

【交通規制②】**対面通行**

令和3年7月下旬頃

橋げた架設工事で、**1夜間程度**の対面通行を予定（対面通行）

工事に関する問い合わせ先

三重河川国道事務所
鈴鹿国道出張所
TEL: 059-387-8470

株式会社
鈴井ハルテック
TEL: 059-392-9310

交通規制情報及び周辺道路の交通規制情報

三重河川国道事務所
ホームページ
https://www.ccr.mlit.go.jp/mie/

道路の異常を見つけたら...

道路緊急
ダイヤル **#9910**

24時間受付
通話料無料

交通規制は、橋桁を組み立てる為の構台（仮設スペース）を設置するにあたって、トレーラーでその構台の材料を運び込む為に行います。構台を設置し、橋桁を組み、北玉垣交差点上に橋を架ける計画です。

構台で組み立てた橋を交差点にかける為の作業車

マックスキャリアⅡ

マックスキャリアⅢ

第Ⅲ世代型 幅狭マックスキャリア

オフセット編成対応

縦向き運転可能

吊钩吊接合機

リフター組立対応

参考写真※画像は、あくまでもイメージです（関係機関との協議等により変更の可能性あります）。

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和3年2月18日撮影】

安塚・野町地区



工事⑪ 23号安塚・野町道路建設工事
アイトム建設(株)

進捗率	99%
-----	-----

引き続き**補強土壁工事**を行っております。工事が完成に近づいていますが、事故の防止及び騒音・振動に配慮して工事を進めていきます。

末広地区



工事⑫ 23号末広地区道路建設工事
アイトム建設(株)

進捗率	5%
-----	----

3月は**排水構造物工事**、**L型擁壁工事**、**補強土壁工事**、**盛土工事**を行っていきます。引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。

玉垣地区




工事⑬ 23号玉垣地区南道路建設工事
東海土建(株)

進捗率	40%
-----	-----

3月は**補強土壁工事**、**盛土工事**、**地盤改良工事**を進めていきます。土砂運搬、資材搬入等の工事車両が頻繁に通行し、ご迷惑をお掛けしますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。

玉垣地区

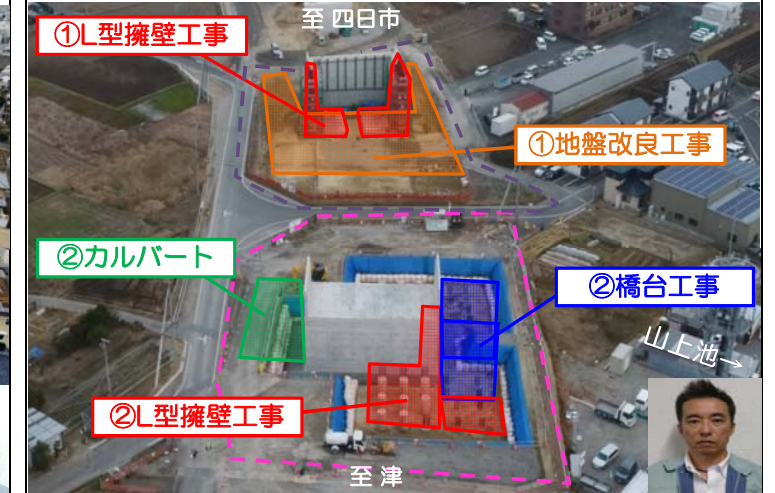

工事⑭ 23号北玉垣地区道路建設工事
(株)アイケーディ

進捗率	24%
-----	-----

現在、①のところで**L型擁壁工事**、**地盤改良工事**を施工しています。これから②のところで**L型擁壁工事**、**橋台工事**、**カルバート**などを施工していきます。安全第一で進めていきますのでご協力よろしくお願いします。



安塚地区



工事⑮ 23号安塚北地区道路建設工事
大旺新洋(株)

進捗率	72%
-----	-----

2月は**調整池工事の底版部の埋戻し**を行い、2段目支保工を解体し壁工事へと移行しています。3月は引き続き壁工事を行います。資機材の搬入がありますので交通管理に努め事故防止を図ります。

玉垣地区



工事⑯ 23号玉垣地区西道路建設工事
(株)杉本組

進捗率	100%
-----	------

近隣住民の皆様には何かとご不便・ご迷惑をお掛けしましたが、無事に工事を完成することができました。ご協力ありがとうございました。

玉垣地区



工事⑰ 23号玉垣地区東道路建設工事
朝日土木(株)

進捗率	89%
-----	-----

3月に入り、**補強土壁工事**、**盛土工事**の完成を目前に仕上げ作業を行っております。年度末の慌ただしい時期に入りますが、最後まで皆様の安全を優先に、現場の管理に努めてまいりますので、よろしくお願い致します。

玉垣地区




工事⑱ 23号玉垣道路建設工事
松岡建設(株)

進捗率	100%
-----	------

工事中は、地域の皆さまには何かとご不便・ご迷惑をおかけしましたが、2月末にて工事は**無事完成**できました。ご協力ありがとうございました。

中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

③23号玉垣 道路建設工事 松岡建設(株)   地域の皆様が安心できる 安全な工事現場を目指します。	⑨23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株)   安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。	⑩23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック   地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!	⑪23号安塚・野町 道路建設工事 アイトム建設(株)   安全第一で 工事完成を目指します。	⑬23号玉垣地区 西道路建設工事 (株)杉本組   安心・安全・高品質で 工事を進めていきます。
⑭23号玉垣跨線橋 A2下部工事 日本土建(株)   安全を何よりも優先し、 工事の完成を目指します。	⑮23号中勢道路 整備工事 (株)松本組   安全第一を心がけます。 ご協力よろしくお願いいたします。	⑯23号玉垣地区東 道路建設工事 朝日土木(株)   無事故無災害での完成を目指し、 安全第一で工事を進めます。	⑰23号玉垣地区南 道路建設工事 東海土建(株)   安全最優先で、地域の皆様に 喜ばれる工事を目指します。	⑱23号末広・野町 地区道路建設工事 三重農林建設(株)   無事故・無災害で工事の 完成を目指します。
⑲23号北玉垣地区 道路建設工事 (株)アイケーディ   安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いいたします。	⑳23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)   安全第一 無事故・無災害で工事を進めます。	㉑末広地区 道路建設工事 アイトム建設(株)   無事故・無災害で 工事を完成させます。	㉒玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)   安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。	工事現場の豆知識  タイヤ洗浄機 道路を土で汚さないようにタイヤ を洗う機械です。中勢バイパスの 工事でも、使用している箇所があり ます。

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



全線33.8kmのうち、約31km(約92%)が開通しています。
今後の早期開通を目指し、事業を推進していきます。

発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)



道路の真状を発見したら
道路緊急ダイヤル **#9910**

