

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

- 新年度が始まり、三重河川国道事務所並びに鈴鹿国道出張所の体制と人員も変わります。前職員一同、関係者様・近隣住民の皆様には大変お世話になりました。今年度も引き続き、皆様のご理解・ご協力を宜しくお願い致します。
- 4工区（北玉垣町～野町）の進捗状況を、過去の写真と比較してご紹介致します。大きく変化していることが分かりますね。今後も日々進んでいく工事を、分かりやすくお伝えしていきます。

4工区工事現場の移り変わりを紹介致します



平成30年3月時点


北玉垣交差点 ドローン写真



令和元年10月時点



令和2年5月時点

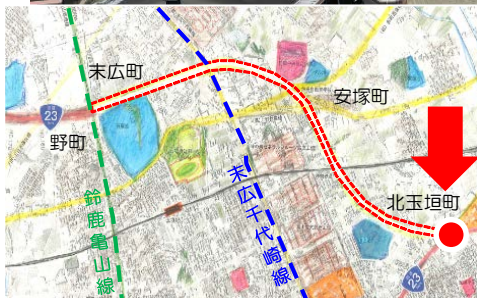

4工区工事 (北玉垣町～野町) 完了前・後 写真

4工事無事に作業完了致しました。ご協力ありがとうございました。



着工前



完成後

令和元年度 23号安塚・野町道路建設工事 アイトム建設(株)




着工前



完成後

令和元年度 23号玉垣地区西道路建設工事 (株)杉本組

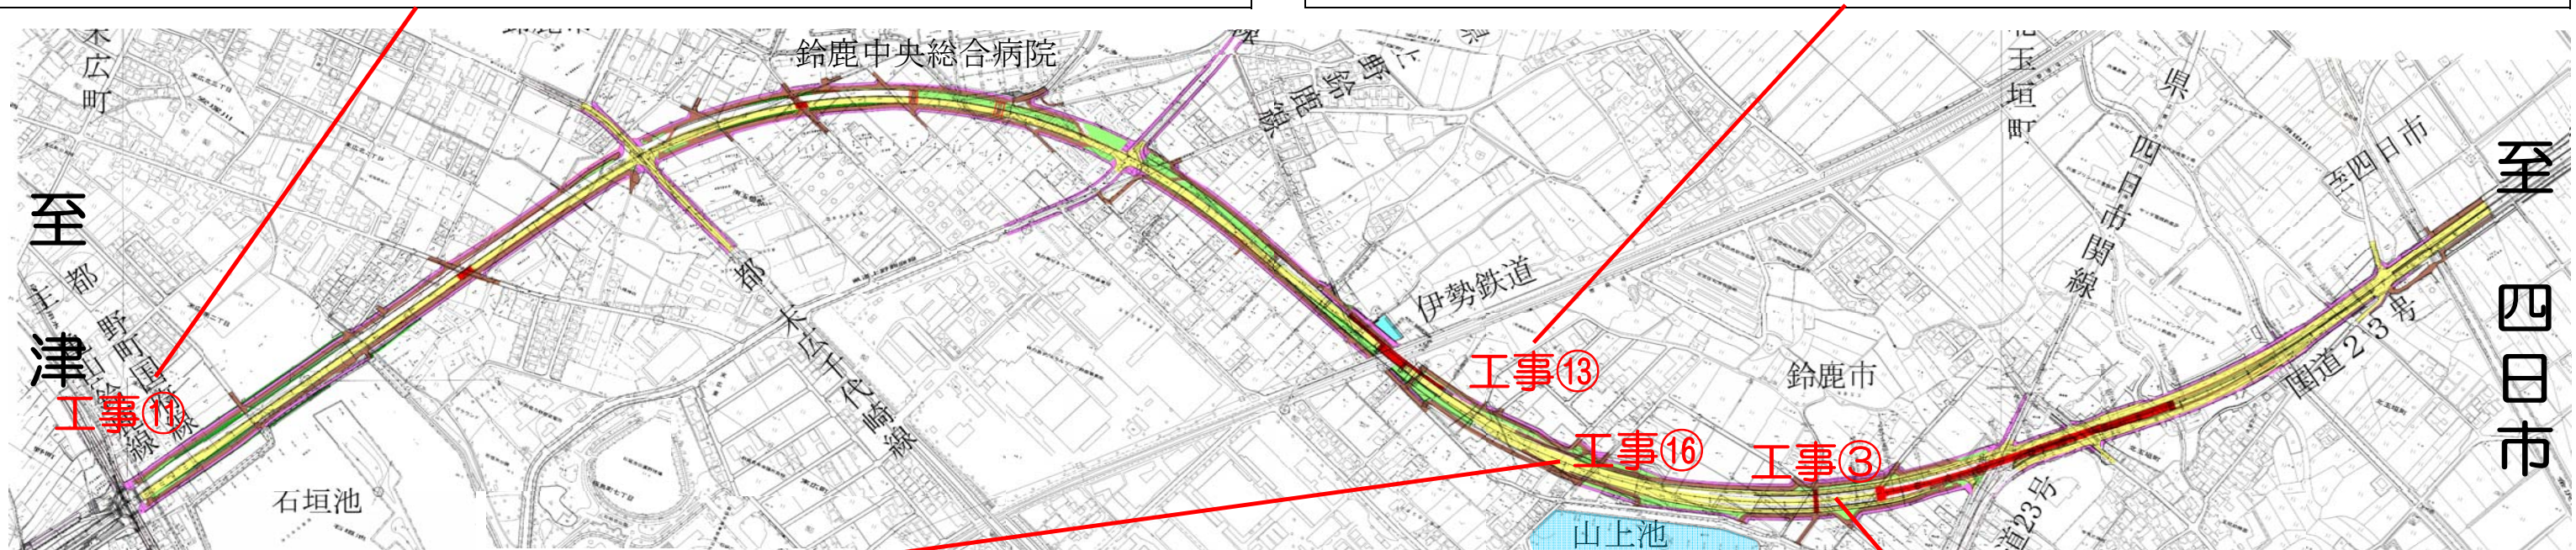

着工前



完成後

令和元年度 23号玉垣地区東道路建設工事 朝日土木(株)



着工前



完成後

令和元年度 23号玉垣道路建設工事 松岡建設(株)

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和3年3月18日撮影】

安塚・野町地区

工事完成



工事 ⑪ 23号安塚・野町道路建設工事
アイトム建設(株) 進捗率 100%

地域の方々には何かとご不便・ご迷惑をお掛けしましたが、工事が無事に完成しました。ご協力本当にありがとうございました。

末広地区




排水構造物工事
L型擁壁工事
盛土工事
補強土壁工事

工事 ⑫ 23号末広地区道路建設工事
アイトム建設(株) 進捗率 18%

今月も排水構造物工事、L型擁壁工事、補強土壁工事、盛土工事の施工を行っています。引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。

玉垣地区

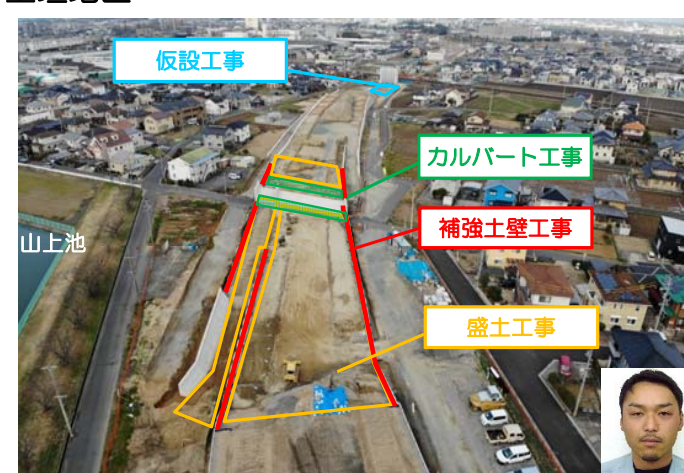

仮設工事
カルバート工事
補強土壁工事
盛土工事

工事 ⑬ 23号玉垣地区南道路建設工事
東海土建(株) 進捗率 50%

4月は盛土工事、補強土壁工事、カルバート工事、仮設工事を進めていきます。土砂運搬、資材搬入等の工事車両が頻繁に通行し、ご迷惑をお掛けしますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。


玉垣地区



中勢バイパス本線になるところ
L型擁壁
仮設
橋台

工事 ⑭ 23号北玉垣地区道路建設工事
(株)アイケーディ 進捗率 30.5%

現在、L型擁壁を施工しています。ここは中勢バイパスが上を通り、側道とのランプ部分になりますので、まだまだ多くの構造物を作っていきます。秋には横断道路の切替作業も行います。皆様にはご不便をおかけしますが、安全第一で進めていきますのでご協力よろしくお願い致します。

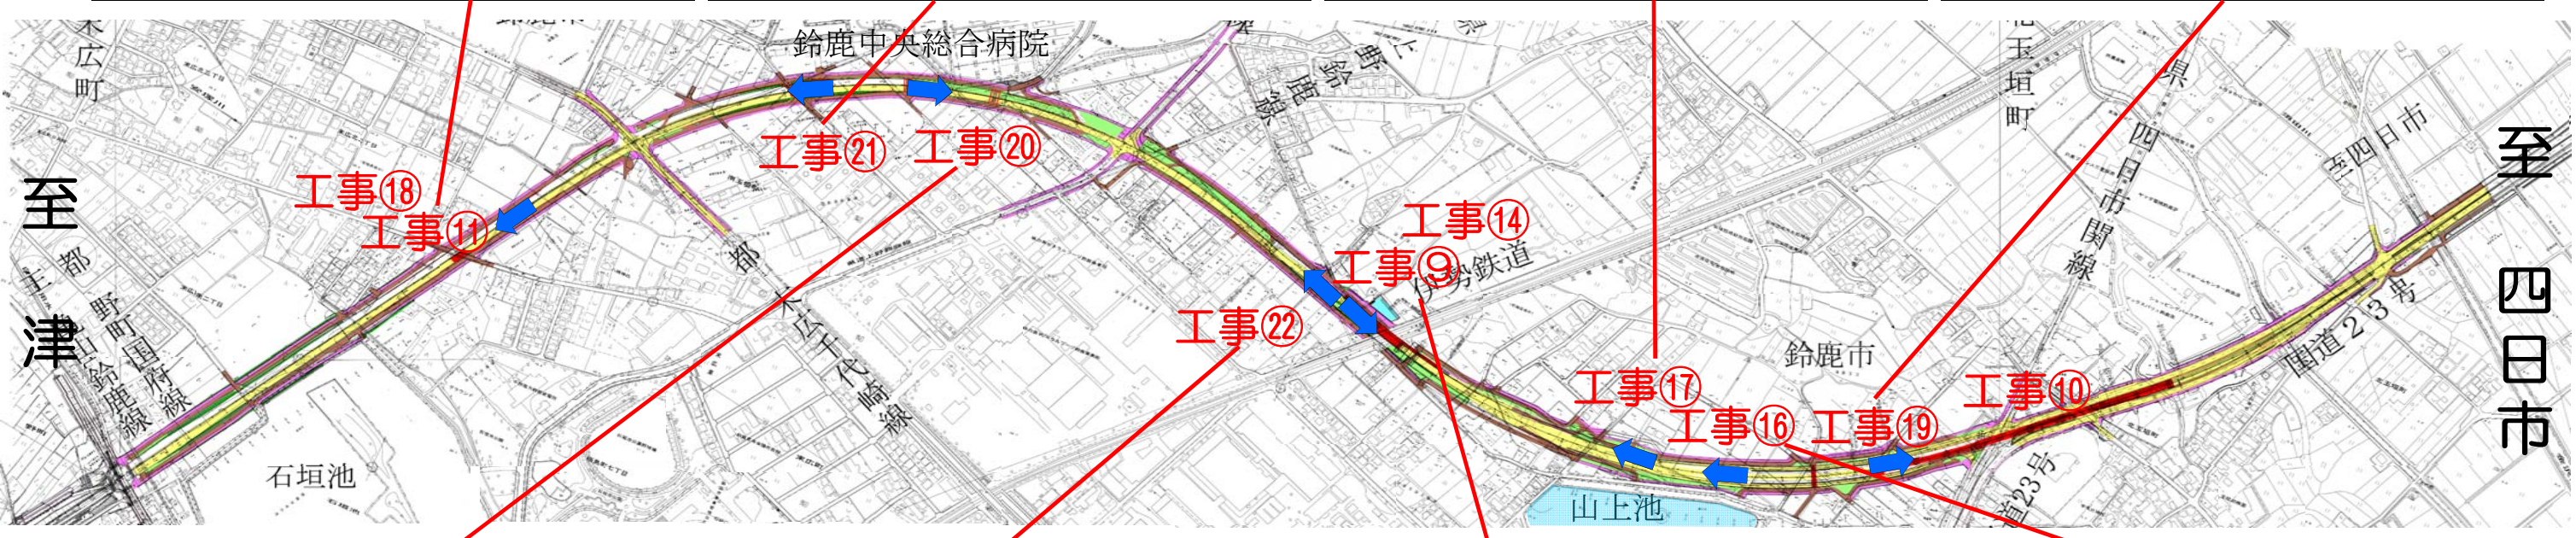

安塚・末広地区



重力式擁壁工事
補強土壁工事
地盤改良工事

工事 ⑮ 23号安塚・末広地区道路建設工事
三重農林建設(株) 進捗率 8%

今月も補強土壁工事、盛土工事の施工を行っています。ほこりの防止や振動・騒音に配慮し工事を安全に進めます。

玉垣地区




補強土壁工事
地盤改良工事

工事 ⑯ 23号玉垣地区道路建設工事
中井土木(株) 進捗率 6%

3月末に地盤改良を行い、養生期間を設けた後、補強土壁の施工に取り掛かります。重機や車両の動きも活発になるため、粉塵や、振動・騒音に注意して工事を安全に進めていきます。

安塚地区

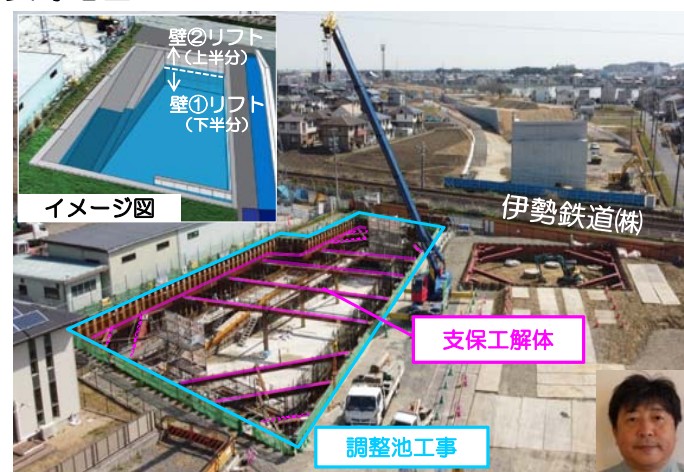

壁②リフト(上半分)
壁①リフト(下半分)
イメージ図
伊勢鉄道(株)
支保工解体
調整池工事

工事 ⑰ 23号安塚北地区道路建設工事
大旺新洋(株) 進捗率 74%

3月は調整池工の壁①リフトのコンクリを打設し、4月は支保工(仮設構造物)解体後、壁②リフトの工事を行います。ほこりの防止や飛散物の防止に努め事故防止を図ります。

玉垣地区

工事完成



山上池

工事 ⑱ 23号玉垣地区東道路建設工事
朝日土木(株) 進捗率 100%

工事中は、地域の皆様には何かとご不便・ご迷惑をおかけしましたが、3月末で無事に工事を完了することができました。ご協力ありがとうございました。

①23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株)	②23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック	③23号玉垣跨線橋 A2下部工事 日本土建(株)	④23号中勢道路 整備工事 (株)松本組	⑤23号玉垣地区南 道路建設工事 東海土建(株)
 安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。	 地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!	 安全を何よりも優先し、 工事の完成を目指します。	 安全第一を心がけます。 ご協力よろしくお願い致します。	 安全最優先で、地域の皆様に 喜ばれる工事を目指します。
⑥23号末広・野町 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	⑦23号北玉垣地区 道路建設工事 (株)アイケーディ	⑧23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	⑨末広地区 道路建設工事 アイトム建設(株)	⑩玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)
 無事故・無災害で工事の 完成を目指します。	 安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願い致します。	 安全 第一 無事故・無災害で工事を進めます。	 無事故・無災害で 工事を完成させます。	 安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。



※中面 工事進捗状況工事番号とは異なります。

Twitterのご案内

三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外でも、Twitterにて情報を配信しておりますので、是非チェックをしてみてください。



三重河川国道事務所アカウントをフォロー
Twitterアカウント @mlit_mie



「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



全線33.8kmのうち、約31km(約92%)が開通しています。
今後の早期開通を目指し、事業を推進していきます。

発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)



道路の真状を見たら
道路緊急
ダイヤル
#9910
