

あゆばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

今月号のラインナップ

- 北玉垣高架橋鋼上部工事夜間作業の様子、北玉垣町付近の交通規制について
- 各工事現場進捗状況について

北玉垣高架橋鋼上部工事夜間作業の様子

4月に行った北玉垣高架橋鋼上部工事の夜間作業の様子をお伝え致します。工場で作製したパーツを大型クレーンを用いて、組立てを行いました。

組み立て完了！
この工程が続きます。



大型クレーン車

北玉垣高架橋の工事に伴う交通規制のお知らせ

北玉垣高架橋の工事に伴う国道23号の夜間規制を行います。該当期間に通行される際は、ご注意ください。

場所

国道23号 鈴鹿市北玉垣町付近

期間

令和3年5月10日～令和3年5月31日

この期間の15日程度（土日除く）
上下線の1車線規制を夜間に実施します。



中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和3年4月20日撮影】

末広・野町地区



工事⑥ 23号末広・野町地区道路建設工事
三重農林建設(株) 進捗率 68%

現在は**擁壁工**を行っています。5月は**擁壁工**の上に**排水構造物工**を施工し、**道路土工**も行っていきます。粉塵や振動及び騒音に注意して安全に進めていきます。

末広地区



工事⑨ 23号末広地区道路建設工事
アイトム建設(株) 進捗率 45%

今月も**排水構造物工事**、**補強土壁工事**、**盛土工事**の施工を行っています。引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。


安塚地区



工事① 23号安塚北地区道路建設工事
大旺新洋(株) 進捗率 84%

4月に**壁②リフト**のコンクリートを打設しました。5月は壁型枠の解体、足場を解体し埋戻しを行います。埋戻し作業ではダンプトラックが頻繁に走るようになりますので、運搬マナーに気を付け、ほこり対策を行いながら施工していきます。

玉垣地区

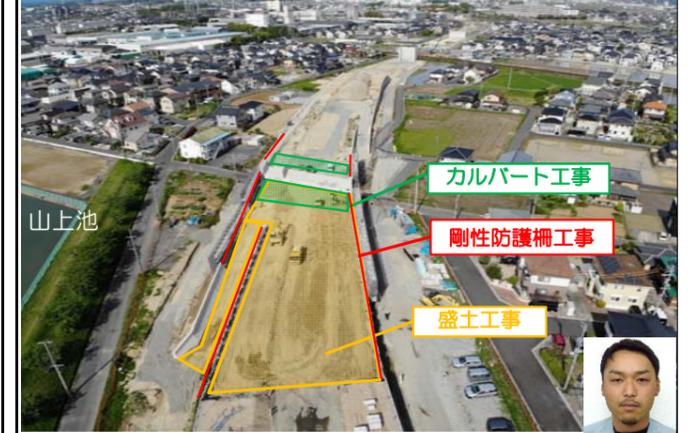

工事⑤ 23号玉垣地区南道路建設工事
東海土建(株) 進捗率 69.7%

5月は**盛土工事**、**補強土壁工事**、**カルバート工事**を進めていきます。土砂運搬の工事車両が通行し、ご迷惑をお掛けしますが、騒音・振動に注意して作業を進めていきます。ご協力のほどよろしくお願い致します。



安塚・末広地区



工事⑧ 23号安塚・末広地区道路建設工事
三重農林建設(株) 進捗率 18%

今月も**補強土壁工事**、**重力式擁壁工事**、**盛土工事**の施工を行います。ほこりの防止や振動・騒音に配慮し工事を安全に進めます。


玉垣地区



工事⑩ 23号玉垣地区道路建設工事
中井土木(株) 進捗率 6%

補強土壁工事と**盛土工事**の施工を始めていきます。これからダンプトラックや資材の搬入車両が多くなるので、周辺に配慮し安全第一で工事を進めていきます。


玉垣地区

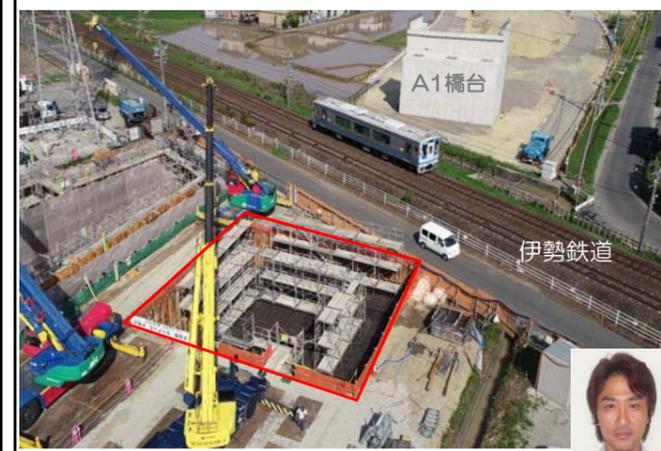

工事③ 23号玉垣跨線橋A2下部工事
日本土建(株) 進捗率 68%

底版の施工を4月中に完了し、5月は引続き壁の施工を行います。資機材の搬入がありますので、ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

玉垣地区

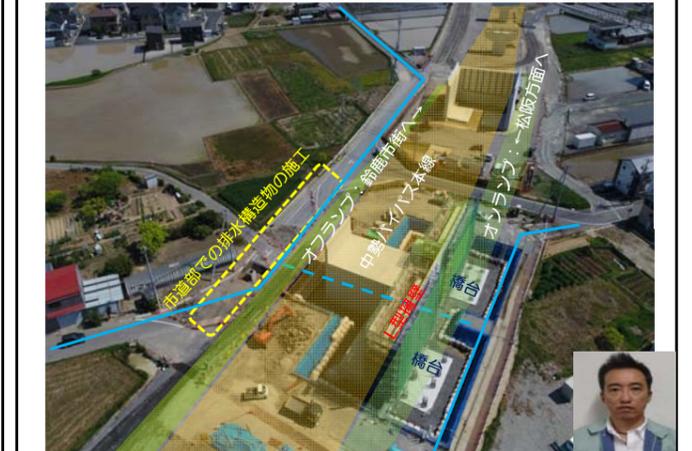

工事⑦ 23号北玉垣地区道路建設工事
(株)アイケーディ 進捗率 32%

先月から施工していた擁壁(L3、L4)が完成し、オアランプの橋台の施工に入ります。本工事において9月に中勢BPを横断している市道(切り回り道路)を**ボックス内道路**に切り替えて行く予定です。工事には規制をとめない迷惑をおかけしますが、引き続き協力よろしくお願い致します。

①23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株)	②23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 株駒井ハルテック	③23号玉垣跨線橋 A2下部工事 日本土建(株)	④23号中勢道路 整備工事 株松本組	⑤23号玉垣地区南 道路建設工事 東海土建(株)
安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。	地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!	安全を何よりも優先し、 工事の完成を目指します。	安全第一を心がけます。 ご協力よろしくお願いいたします。	安全最優先で、地域の皆様に 喜ばれる工事を目標とします。
⑥23号末広・野町 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	⑦23号北玉垣地区 道路建設工事 株アイケーディ	⑧23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	⑨23号末広地区 道路建設工事 アイトム建設(株)	⑩23号玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)
無事故・無災害で工事の 完成を目指します。	安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いいたします。	安全 第一 無事故・無災害で工事を進めます。	無事故・無災害で 工事を完成させます。	安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。

▼ 新規工事のお知らせ

現場での作業は先になります、どうぞ宜しくお願い致します。

- ⑪23号玉垣跨線橋鋼上部工事 川田工業(株)
- ⑫23号中勢道路建設工事 (株)中村組
- ⑬23号北玉垣東道路建設工事 (株)杉本組
- ⑭23号北玉垣北道路建設工事 丸亀産業(株)



「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



全線33.8 kmのうち、約31 km (約92%) が開通しています。
今後の早期開通を目指し、事業を推進していきます。

発行/連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)



道路の異状を発見したら
道路緊急ダイヤル **#9910**
