

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

今月号のラインナップ

- 北玉垣町北交差点 夜間作業の様子、8月通行規制のお知らせ
- 7月の工事進捗状況と今後の予定

北玉垣町北交差点夜間作業の様子（7月1日）

P2～P3



P1～P2橋脚間で組立てた橋桁の先端を前方台車に乗せて、P2～P3までスライドして運搬します。

POINT 重量430tもの橋桁を台車に乗せて移動します！




1

橋台の上で組み立てた橋桁を送り出します



2

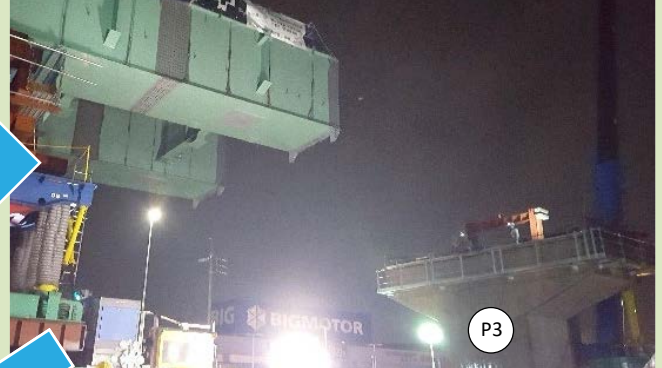

3

送り出した橋桁を据付します



多軸式特殊台車

当日は作業に伴う交通規制にご協力いただきましてありがとうございました。

7月29日 北玉垣町交差点夜間架設の様子

速報版



詳細は9月号にてお伝え致します

北玉垣町交差点付近通行規制のお知らせ



7月15日 夜間規制状況

場所 国道23号 鈴鹿市北玉垣町付近

期間 令和3年8月2日
～ 令和3年8月31日

この期間に12日程度（土・日・車線規制抑制期間を除く）上下線の1車線規制を夜間に実施します。ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和3年7月21日撮影】

末広地区



盛土工事
補強土壁工事
擁壁工事
市道切回し道路

工事⑨	23号末広地区道路建設工事 アイトム建設(株)	進捗率	75%
-----	----------------------------	-----	-----

8月初旬に市道の切回しを行い、擁壁工事の施工を行います。また、引き続き補強土壁工事、盛土工事の施工を行っています。作業中の騒音・振動・粉塵に配慮して工事を安全に進めていきます。

安塚地区



調整池工事
伊勢鉄道
管理用道路
流路調整池

工事①	23号安塚北地区道路建設工事 大旺新洋(株)	進捗率	98%
-----	---------------------------	-----	-----

8月は鋼矢板を切断し最後の埋戻し作業を行います。工事の最終月となりますが、資機材の搬入出や、土砂の運搬がありますので、防塵、騒音振動の抑制に努めて工事をおこないます。

玉垣地区



山上池
盛土工事
補強土壁工事

工事⑬	23号北玉垣東道路建設工事 (株)杉本組	進捗率	12%
-----	-------------------------	-----	-----

今月も補強土壁工事、盛土工事を行っています。資材、土砂等の運搬作業もありますので、騒音、粉塵に注意しながら安全第一で工事を進めていきます。


玉垣地区



工事完成
山上池

工事⑤	23号玉垣地区南道路建設工事 東海土建(株)	進捗率	100%
-----	---------------------------	-----	------

工事中は、地域の皆様に何かとご不便・ご迷惑をおかけしましたが、無事に工事を完成する事ができました。ご協力ありがとうございました。

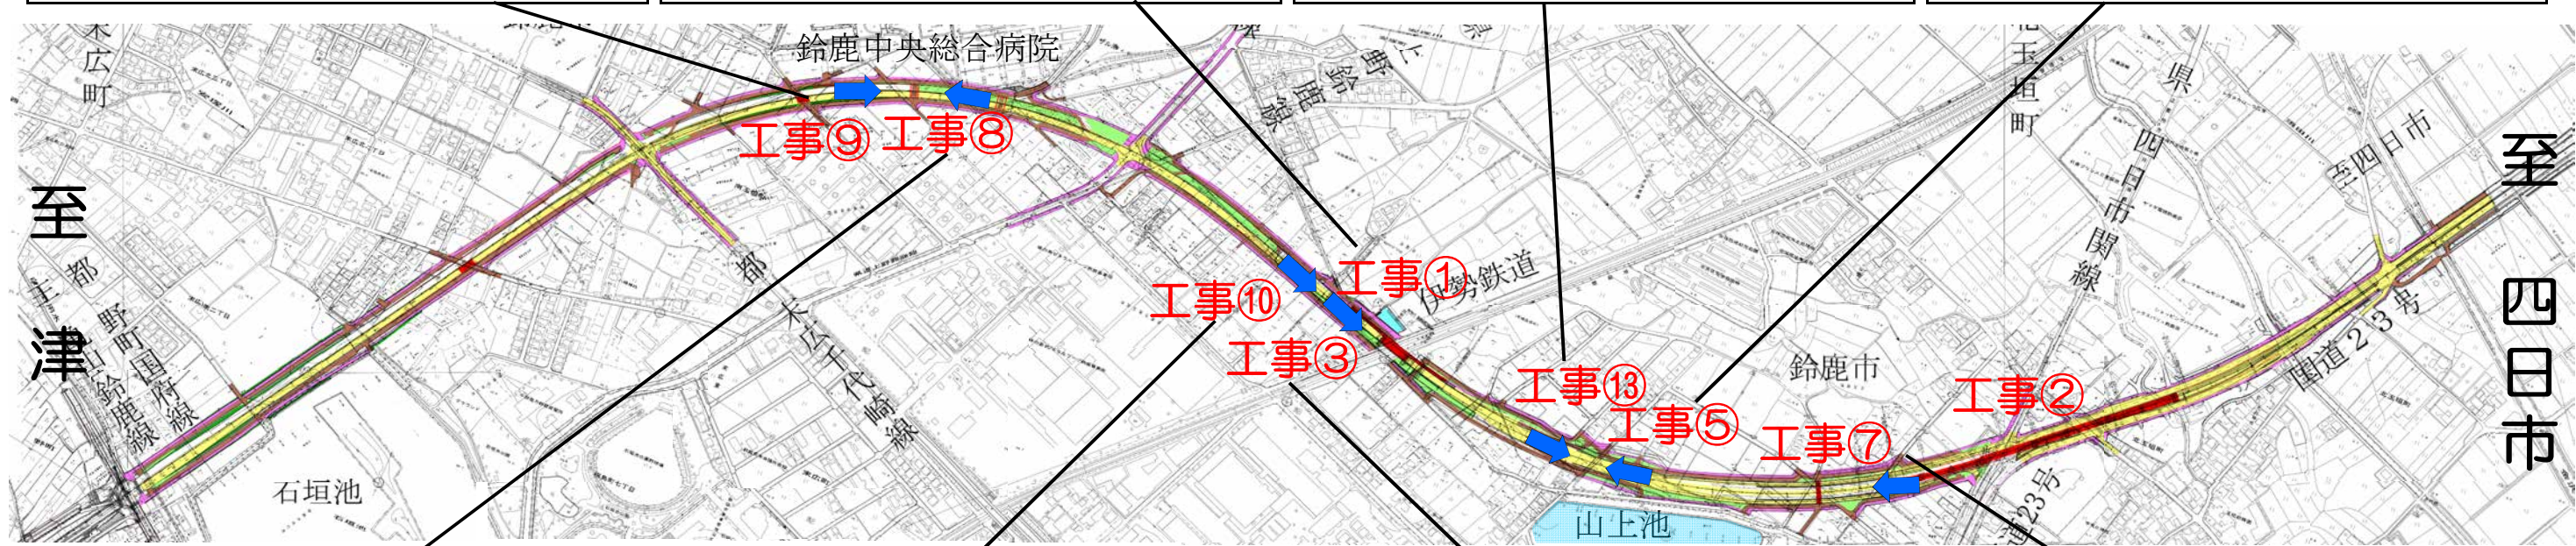

安塚・末広地区



補強土壁工事
盛土工事
側道工事
・L型擁壁
・排水工
側道工事
・L型擁壁
・1号排水工事
・排水工

工事⑧	23号安塚・末広地区道路建設工事 三重農林建設(株)	進捗率	51.1%
-----	-------------------------------	-----	-------

今月も補強土壁工事、盛土工事の施工を行っています。また、側道の工事を行う予定です。ほこりの防止や振動・騒音に配慮し工事を安全に進めます。

玉垣地区



U型擁壁工事
排水構造物工事
補強土壁工事
盛土工事

工事⑩	23号玉垣地区道路建設工事 中井土木(株)	進捗率	24%
-----	--------------------------	-----	-----

今月はU型擁壁工事を開始します。工事用車両の出入が多くなるので、振動、騒音など周辺の環境に配慮して工事を進めていきます。

玉垣地区



A1橋台
伊勢鉄道

工事③	23号玉垣跨線橋A2下部工事 日本土建(株)	進捗率	98%
-----	---------------------------	-----	-----

橋台の躯体工事は完了しました。8月は橋台周りの排水路の施工を行い工事完了となります。最後まで粉塵・騒音に配慮し、安全に作業を行います。

玉垣地区



山上池
オレンジ橋
ボックスカルバート
地盤改良

工事⑦	23号北玉垣地区道路建設工事 (株)アイケーディ	進捗率	68%
-----	-----------------------------	-----	-----

オレンジ橋の橋台が完成し、その横の擁壁とオレンジ橋のボックス、オレンジ橋の桁の施工をしています。9月中旬頃に現在中勢BPを横断している市道(切回し道路)をボックス内の道路に切り替えて行く予定です。工事には規制をとまご迷惑をおかけしますが、引き続き協力よろしくお願いします。

令和3年度 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

①23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株)    安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。	②23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック    地元の方々に永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一!!	③23号玉垣跨線橋 A2下部工事 日本土建(株)   安全を何よりも優先し、 工事の完成を目指します。	⑤23号玉垣地区南 道路建設工事 東海土建(株)    安全最優先で、地域の皆様に 喜ばれる工事を目指します。	⑦23号北玉垣地区 道路建設工事 (株)アイケーディ   安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いします。
⑧23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)    安全 第一 無事故・無災害で工事を進めます。	⑨23号末広地区 道路建設工事 アイトム建設(株)    無事故・無災害で 工事を完成させます。	⑩23号玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)    安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。	⑫23号中勢道路 建設工事 (株)中村組    安全、品質を心掛け無事故、無 災害で工事完成を目指します。	⑬23号北玉垣東 道路建設工事 (株)杉本組    安心・安全・高品質で 工事を進めていきます。
⑭23号北玉垣北 道路建設工事 丸亀産業(株)    国道23号線の中央分離帯での作業 です。特に安全に注意作業を進めて まいります。よろしくお願いします。	⑮23号中勢道路 整備工事 朝日土木(株)    開通に向け無事故無災害で 工事完成を目指します。	⑯23号末広道路 建設工事 (株)松本組   作業環境を整え無理なく、無事に 工事を完成できるよう目指します。		

Twitterのご案内

三重河川国道事務所アカウントをフォロー

Twitterアカウント▶▶▶ @mlit_mie



三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外でも、Twitterで情報を配信しております。是非チェックをしてみてください。中勢バイパス 鈴鹿（安塚）工区の通行規制についても、ご案内をしています。



「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
- 中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)

道路の現状を発見したら

道路緊急ダイヤル **#9910**
