

あゆまばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication



現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

今月号のラインナップ

- 玉垣跨線橋鋼上部工事のお知らせ、北玉垣町交差点付近通行規制のお知らせ
- 9月の工事進捗状況と今後の予定

玉垣跨線橋鋼上部工事のお知らせ

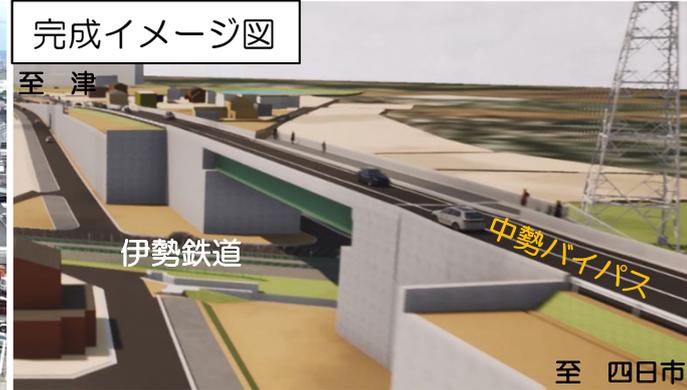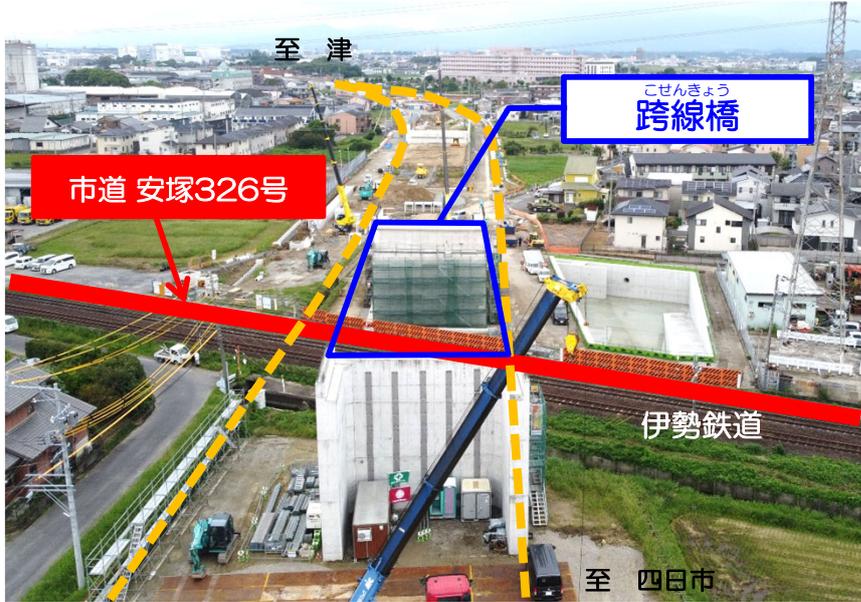

北玉垣町にて伊勢鉄道を跨ぐ橋梁工事が始まります。クレーンで橋桁（長さ 約44.7m、重さ 約49t）を吊り上げて工事を行います。
※写真はあくまでもイメージ写真です。



「地理院地図データ」(国土地理院)をもとに 鈴鹿国道出張所作成

夜間通行規制のお知らせ

夜間工事に伴い、10月18日～29日のうち9日程度、夜間（21:00～6:00）に市道 安塚326号の通行止めを行います。
※土日除く、雨天決行・荒天中止
引き続き11月、2月にも予定をしておりますので、別途お知らせ致します。

北玉垣町交差点付近通行規制のお知らせ



「地理院地図データ」(国土地理院)をもとに鈴鹿国道出張所作成

9月2日 夜間規制状況



場所 国道23号 鈴鹿市北玉垣町付近

期間 令和3年10月15日
～ 令和3年10月29日

この期間に、5日程度（土日を除く）
上下線の1車線規制を夜間に実施します。
ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和3年9月20日撮影】

末広地区

盛土工事
補強土壁工事
舗装工事

工事⑨	23号末広地区道路建設工事 アイトム建設(株)	進捗率	96%
-----	----------------------------	-----	-----

今月は本線部の補強土壁工事、盛土工事、側道部の舗装工事の各所仕上げ施工を行ってまいります。作業中の騒音・振動・粉塵に配慮して工事を安全に進めてまいります。

安塚地区

立入防止柵工事
防護柵基礎工事

工事⑫	23号中勢道路建設工事 (株)中村組	進捗率	30%
-----	-----------------------	-----	-----

今月は、防護柵基礎工事、調整池周りの立入防止柵の工事を行ってまいります。引き続き騒音、振動に配慮し安全第一で工事を進めます。

玉垣地区

市道 安塚326号
伊勢鉄道
跨線橋

工事⑪	23号玉垣跨線橋鋼上部工事 川田工業(株)	進捗率	56%
-----	--------------------------	-----	-----


10月に市道 安塚326号の夜間通行止めを行います。周辺地域の方へ回覧等によりお知らせします。ご不便をお掛け致しますが、ご協力お願いします。

玉垣地区

山上池
剛性防護柵工事

工事⑬	23号北玉垣東道路建設工事 (株)杉本組	進捗率	38%
-----	-------------------------	-----	-----

今月も本線部の剛性防護柵工事を行ってまいります。引き続き周辺地域へ配慮し安全第一で工事を進めますので、ご協力お願いします。

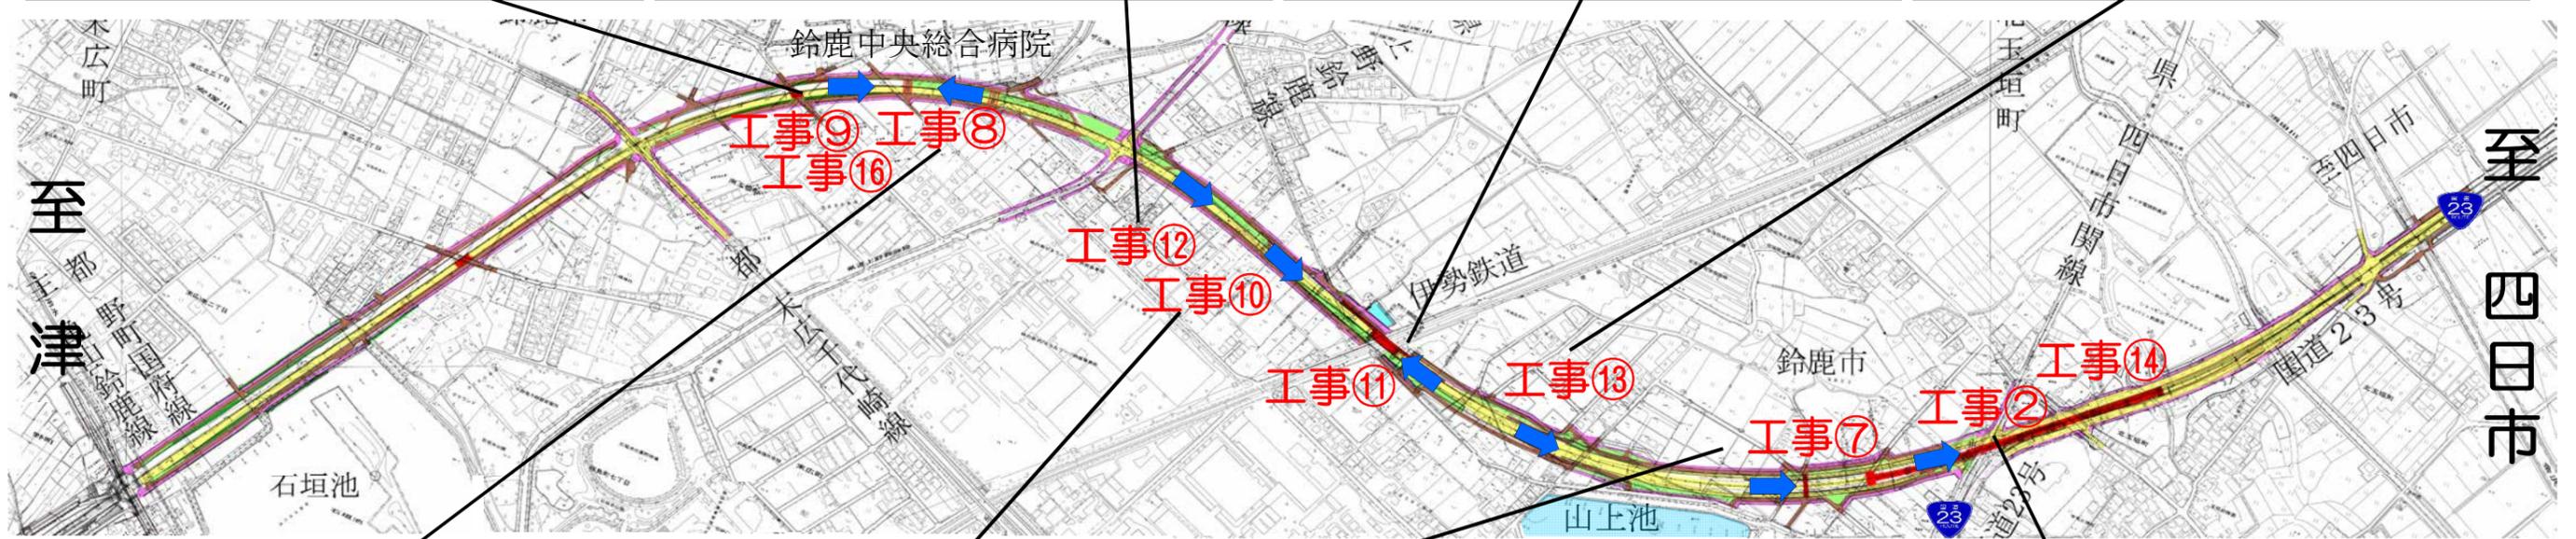

安塚・末広地区

左側副道工事
・1号排水路工事
・排水構造物工事
右側副道工事
・重力式擁壁工事
・管渠工事

工事⑧	23号安塚・末広地区道路建設工事 三重農林建設(株)	進捗率	74.2%
-----	-------------------------------	-----	-------

今月は副道部の排水工事、擁壁工事を行う予定です。引き続きほこり防止や振動・騒音に配慮し工事を安全に進めます。

玉垣地区

排水構造物工事
U型擁壁工事
盛土工事
補強土壁工事

工事⑩	23号玉垣地区道路建設工事 中井土木(株)	進捗率	40%
-----	--------------------------	-----	-----

今月も補強土壁工事、盛土工事、U型擁壁工事、排水構造物工事を行ってまいります。作業中の振動、騒音、粉塵に注意しながら安全第一で工事を進めてまいります。

玉垣地区

9/24より横断する道路が変わりました。ご通行の際は、ご注意ください。
通行できます
通行できません
地盤改良工事
オンランプ橋

工事⑦	23号北玉垣地区道路建設工事 (株)アイケーティ	進捗率	86%
-----	-----------------------------	-----	-----

9月24日に中勢BPの横断市道がボックス内に切り替わりました。現在、盛土・擁壁下の地盤改良とオンランプ橋を施工しています。11月末の完成に向けてより一層安全に配慮して工事を進めて参りますので、引き続きご協力よろしくおねがいします。

玉垣地区

位置図
P5
P4
北玉垣交差点
中勢バイパス本線
至四日市
220tクレーン

工事②	23号北玉垣高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック	進捗率	84%
-----	------------------------------	-----	-----

7月末、交差点上一括架設時の交通規制にご協力頂きまして誠に有難うございました。引き続きヤード内での架設作業及び現場塗装作業を進めて参ります。

②23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック	⑦23号北玉垣地区 道路建設工事 (株)アイケーディ	⑧23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	⑨23号末広地区 道路建設工事 アイテム建設(株)	⑩23号玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)
<p>地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!</p>	<p>安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願い致します。</p>	<p>安全 第一 無事故・無災害で工事を進めます。</p>	<p>無事故・無災害で 工事を完成させます。</p>	<p>安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。</p>
⑪23号玉垣跨線橋 鋼上部工事 川田工業(株)	⑫23号中勢道路 建設工事 (株)中村組	⑬23号北玉垣東 道路建設工事 (株)杉本組	⑭23号北玉垣北 道路建設工事 丸亀産業(株)	⑮23号中勢道路 整備工事 朝日土木(株)
<p>安全第一、"基本事項の 徹底"で工事を進めます。</p>	<p>安全、品質を心掛け無事故、無 災害で工事完成を目指します。</p>	<p>安心・安全・高品質で 工事を進めていきます。</p>	<p>国道23号線の中央分離帯での作業 です。特に安全に注意し作業を進めて まいります。よろしくお願い致します。</p>	<p>開通に向け無事故無災害で 工事完成を目指します。</p>

⑬23号末広道路
建設工事
 (株)松本組

作業環境を整え無理なく、無事に
工事を完成できるよう目指します。

Twitterのご案内

三重河川国道事務所アカウントをフォロー

Twitterアカウント @mlit_mie
https://twitter.com/mlit_mie

三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外でも、Twitterで情報を配信しております。
是非チェックしてみてください。中勢バイパス 鈴鹿（安塚）工区の通行規制についても、
ご案内をしています。

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
- 中勢BP工事連絡協議会
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)

道路の異状を発見したら
道路緊急ダイヤル #9910

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP
<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>
 ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます
<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>
 (ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)
