

あゆばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

今月号のラインナップ

- 玉垣跨線橋夜間架設について、市道 末広千代崎線切り替えについてのお知らせ
- 11月の工事進捗状況と今後の予定



玉垣跨線橋夜間架設について



R3.10.27撮影



R3.12.2撮影


10月に施工した玉垣跨線橋夜間架設の動画をTwitterで紹介致しました。普段は中々見る事の出来ない夜間作業の様子をご覧ください。2月にも市道 安塚326号の夜間通行止めを予定しておりますので、改めてお知らせ致します。



https://twitter.com/mlit_mie/status/1460503823743520768

QRコードを読み込むと直接動画のつづやきにアクセスできます。

市道 末広千代崎線切り替えについてのお知らせ

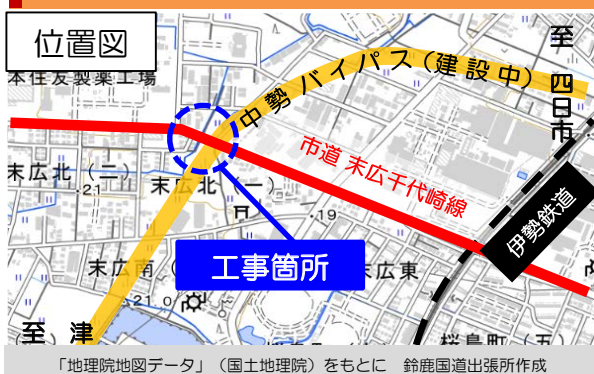

11月25日に市道 末広千代崎線が写真のような迂回路へ切り替わりました。通行の際はご注意ください。工事中はご不便をおかけ致しますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

切替前
R3.11.19撮影切替後
R3.11.30撮影


中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

末広地区




工事⑩	23号末広道路建設工事 (株)松本組	進捗率	22%
末広千代崎線が迂回路の形状に11月25日から切替りました。今後も道路規制を伴う作業がありますが、安全第一に工事を行って行きます。			

安塚・末広地区

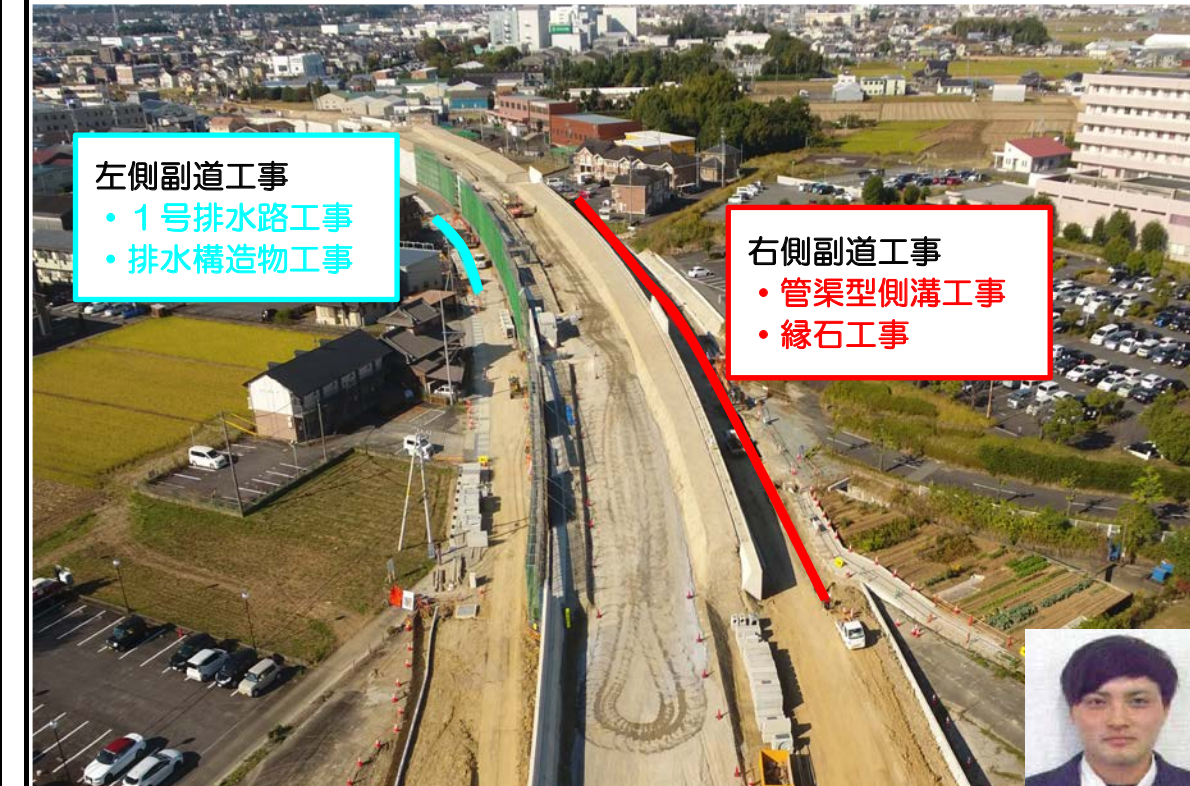

工事⑨	23号安塚・末広地区道路建設工事 三重農林建設(株)	進捗率	93%
今月は副道部の排水工事、縁石工事を行う予定です。残り少ない工期となっておりまので、最後まで無事故・無災害で作業を進めます。			

玉垣地区

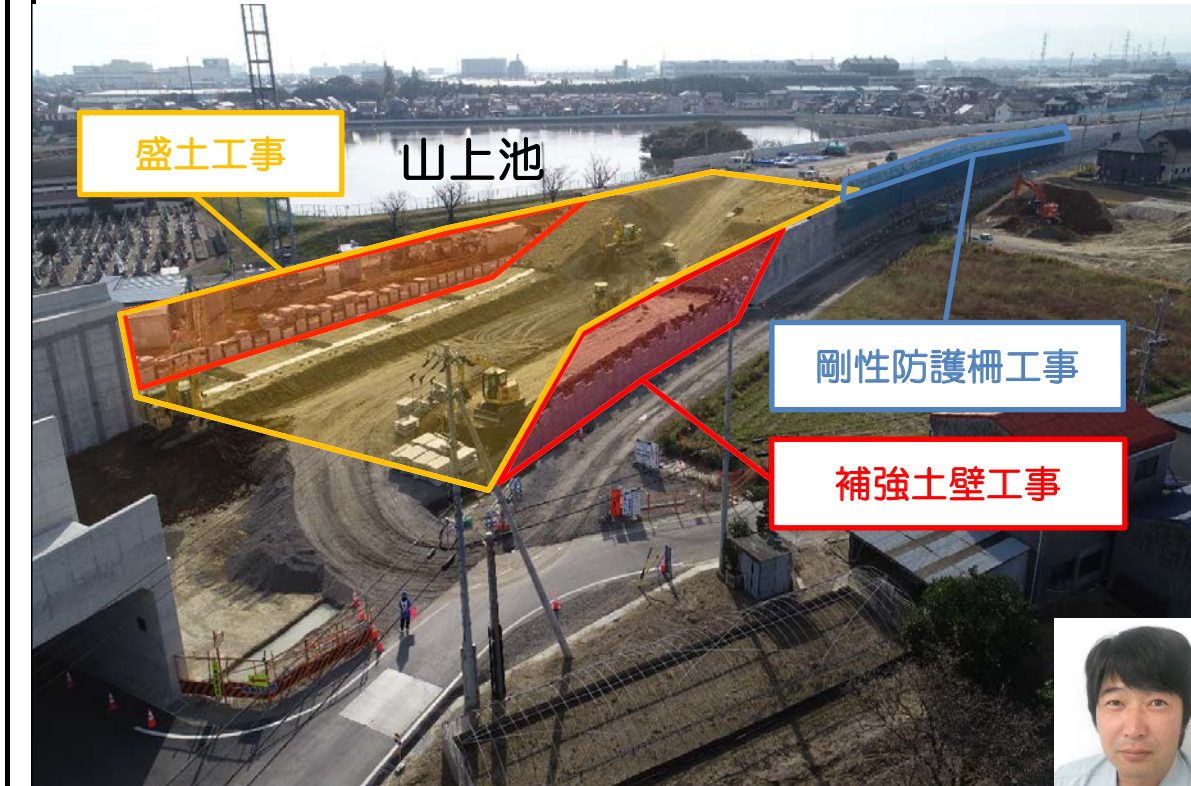


工事⑬	23号北玉垣東道路建設工事 (株)杉本組	進捗率	70%
今月も引き続き本線部の補強土壁工事、盛土工事、剛性防護柵工事の施工を行います。作業中の騒音・振動・粉塵に配慮して工事を安全に進めていきます。			

玉垣地区



工事⑭	23号北玉垣北道路建設工事 丸亀産業(株)	進捗率	26%
12月は多数アンカー工事に着手していきます。工事車両の出入りが多くなりますが、出入りには十分注意し工程を進めていきます。			

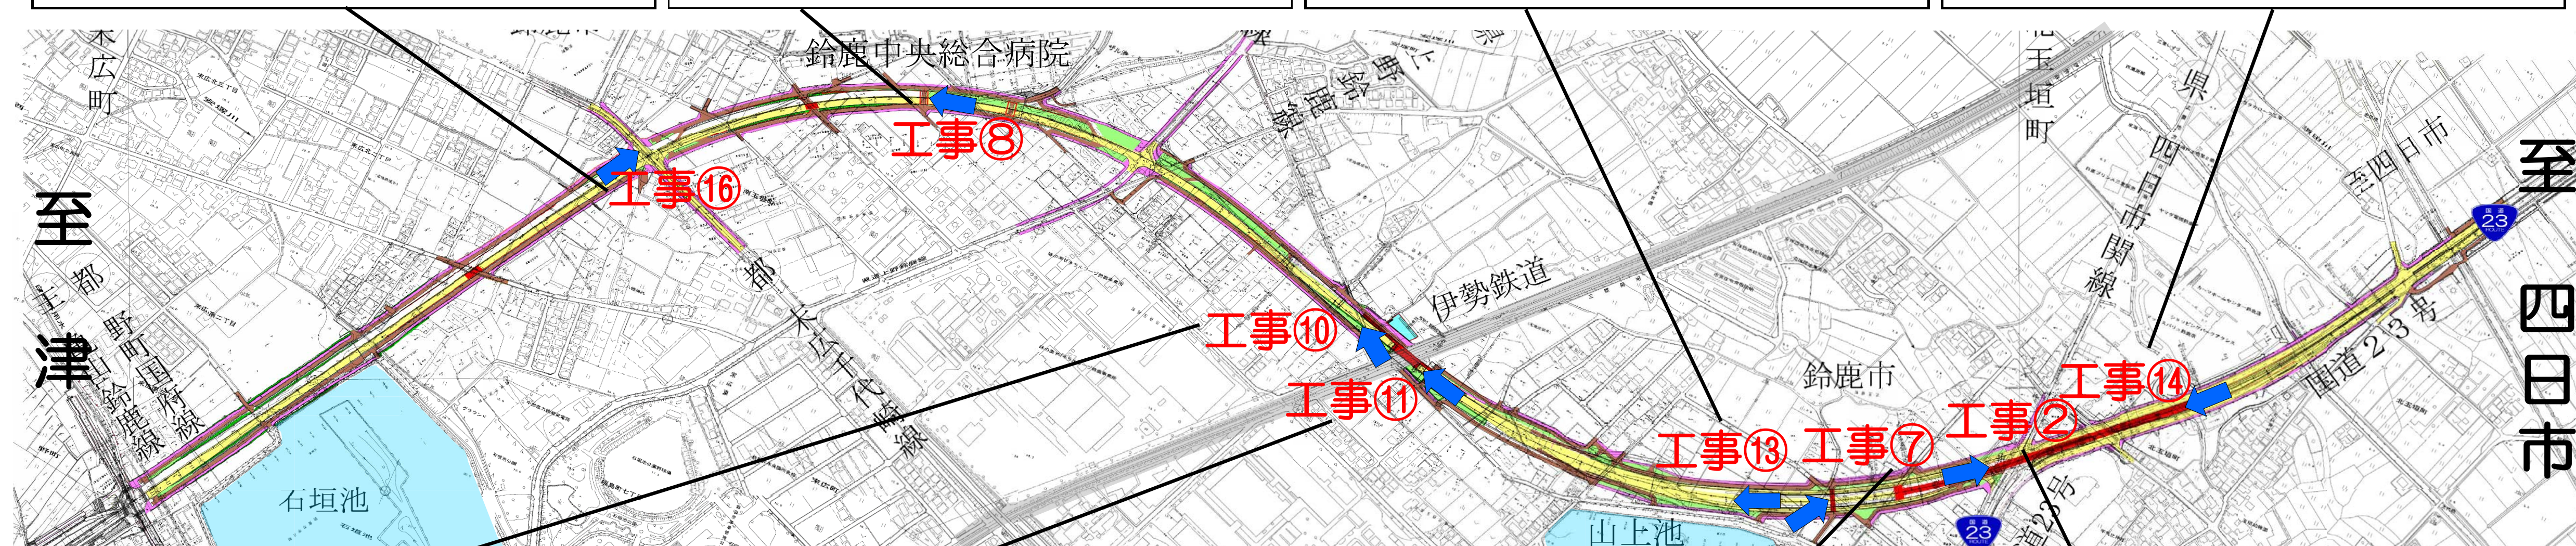

玉垣地区



工事⑩	23号玉垣地区道路建設工事 中井土木(株)	進捗率	63%
今月は場所打擁壁工事、地盤改良工事、排水構造物工事、踏掛版工事を行っていきます。周辺環境への粉塵や騒音に注意して、安全第一で工事を進めていきます。			

玉垣地区



工事⑪	23号玉垣跨線橋鋼上部工事 川田工業(株)	進捗率	70%
12月より合成床版工（鉄筋組立、コンクリート打設）を行います。引き続き地域の皆様にはご迷惑お掛けしますが、ご協力お願いします。			

玉垣地区













工事⑦	23号北玉垣地区道路建設工事 (株)アイケーティ	進捗率	100%
昨年9月に始まったこの工事も、おかげさまで11月末に無事工事完了いたしました。工事中は皆様に御理解・御協力のほどありがとうございました。			

玉垣地区



工事②	23号北玉垣高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック	進捗率	93%
11月下旬にて鋼桁本体の施工をほぼ完了しました。引き続き飛来落下等にご注意して、現場塗装作業及び排水装置設置作業を安全第一で進めて参ります。			


令和3年度 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

②23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック   地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!	⑦23号北玉垣地区 道路建設工事 (株)アイケーディ   工事中は皆様に御理解・御協力の ほどありがとうございました。	⑧23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)   安全第一 無事故・無災害で工事を進めます。	⑩23号玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)   安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。	⑪23号玉垣跨線橋 鋼上部工事 川田工業(株)   安全第一、“基本事項の 徹底”で工事を進めます。
⑫23号中勢道路 建設工事 (株)中村組   安全、品質を心掛け無事故、無 災害で工事完成を目指します。	⑬23号北玉垣東 道路建設工事 (株)杉本組   安心・安全・高品質で 工事を進めていきます。	⑭23号北玉垣北 道路建設工事 丸亀産業(株)   国道23号線の中央分離帯での作業 です。特に安全に注意し作業を進めて まいります。よろしくお願いします。	⑮23号中勢道路 整備工事 朝日土木(株)   開通に向け無事故無災害で 工事完成を目指します。	⑯23号末広道路 建設工事 (株)松本組   作業環境を整え無理なく、無事に 工事を完成できるよう目指します。
⑰23号末北玉垣南 道路建設工事 三重農林建設(株)   安全第一で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いします。	⑱23号北玉垣 道路建設工事 (株)久志本組   明るい現場で安全第一!! 無事故で完成を目指します。	⑲23号安塚北 道路建設工事 松岡建設(株)   周辺環境へ配慮し、無事故 無災害で工事完成を目指します。		



Twitterについて

三重河川国道事務所HP、
ちゅうばす通信以外にも、
Twitterで情報を発信して
います。通行規制や工事の
動画なども発信しています。



三重河川国道事務所
Twitter QRコード

 https://twitter.com/mlit_mie



Twitterについて

三重河川国道事務所HP、
ちゅうばす通信以外にも、
Twitterで情報を発信して
います。通行規制や工事の
動画なども発信しています。



三重河川国道事務所
Twitter QRコード

▶▶▶ https://twitter.com/mlit_mie

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)

道路の異状を発見したら

道路緊急ダイヤル **#9910**
