

# あゆま通信

Route23  
CHUSEI  
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会



## 今月号のラインナップ



- 北玉垣高架橋工事完成のお知らせ、玉垣跨線橋夜間工事に伴う通行規制について
- 1月の工事進捗状況と今後の予定

## 北玉垣高架橋工事完成のお知らせ

令和3年2月撮影



令和3年7月撮影



令和3年12月撮影



令和4年1月撮影（工事完成）



### 夜間架設

令和3年7月1日（北玉垣町北交差点）



送り出し工法

令和3年7月29日（北玉垣町交差点）



多軸式特殊台車工法

令和3年4月より作業を行ってきました北玉垣高架橋鋼上部工事が、完成となりました。長期間に渡る交通規制にご協力いただきまして、ありがとうございました。

## 玉垣跨線橋夜間工事に伴う通行規制について



令和4年1月撮影



市道 安塚326号

2月から3月にかけて防護柵の設置、足場の解体を夜間工事にて行う為、通行規制を行います。

### 夜間通行規制のお知らせ

夜間工事に伴い、2月14日～3月4日のうち8日程度、夜間(21:00～6:00)に市道安塚326号の通行止めを行います(土日除く、雨天決行・荒天中止)。工事中はご不便をおかけ致しますが、ご協力をお願い致します。

# 中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

**未広地区**

道路土工  
側道工事  
工業用排水付替工事

市道 未広千代崎線

|     |                    |     |     |
|-----|--------------------|-----|-----|
| 工事⑬ | 23号未広道路建設工事 (株)松本組 | 進捗率 | 36% |
|-----|--------------------|-----|-----|

今月は未広千代崎線の工業用排水の付替工事、道路土工、側道工事を行います。来月の中旬には、未広千代崎線を元の道路形状に戻す作業を行います。安全第一で作業を行います。

**玉垣地区**

伊勢鉄道  
ボックスカルバート

|     |                         |     |     |
|-----|-------------------------|-----|-----|
| 工事⑭ | 23号北玉垣南道路建設工事 三重農林建設(株) | 進捗率 | 10% |
|-----|-------------------------|-----|-----|

今月は、ボックスカルバートの工事を行っています。周辺地域へ配慮し安全第一で工事を進めていきますので、ご協力をお願いします。

**玉垣地区**

山上池  
盛土工事

|     |                      |     |     |
|-----|----------------------|-----|-----|
| 工事⑮ | 23号北玉垣東道路建設工事 (株)杉本組 | 進捗率 | 97% |
|-----|----------------------|-----|-----|


工事も終盤へさしかかり、3月初旬の完成に向けて、盛土の仕上げ作業を行っています。最後まで粉塵・騒音に配慮し、安全に作業を行います。

**玉垣地区**

山上池  
3号側  
1号側  
補強土壁工事  
盛土工事

|     |                       |     |     |
|-----|-----------------------|-----|-----|
| 工事⑯ | 23号北玉垣北道路建設工事 丸亀産業(株) | 進捗率 | 50% |
|-----|-----------------------|-----|-----|

1号側、3号側共に補強土壁工事、盛土工事を順次施工中です。雪の多い季節になりますが、安全第一で工程を進めていきます。

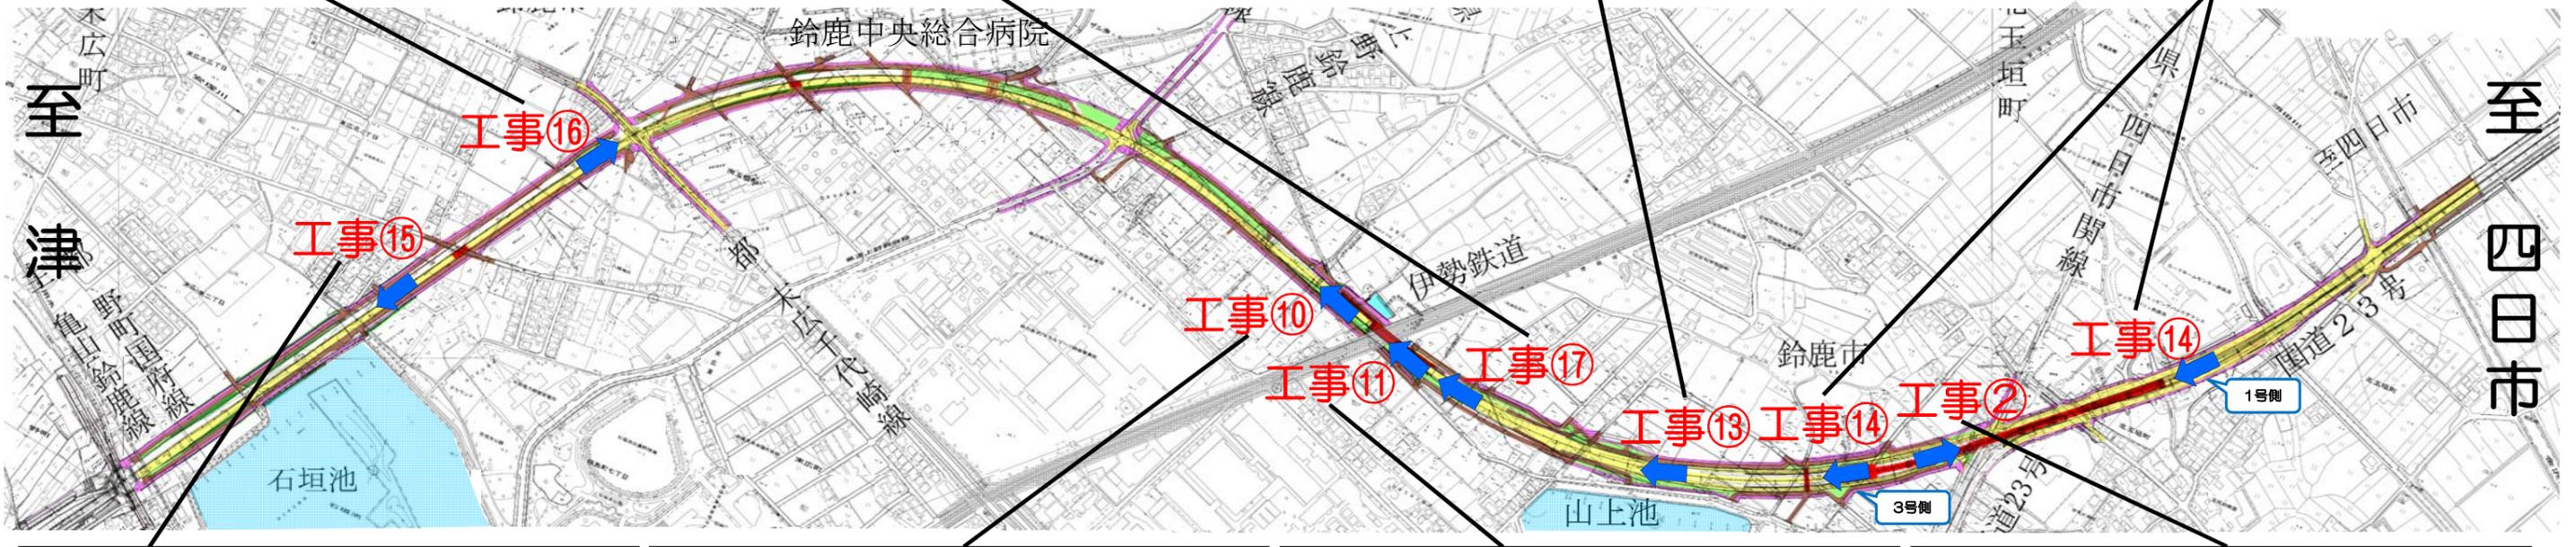

**未広地区**

県道 亀山鈴鹿線  
石垣池  
歩道  
側道車線

|     |                     |     |     |
|-----|---------------------|-----|-----|
| 工事⑲ | 23号中勢道路整備工事 朝日土木(株) | 進捗率 | 72% |
|-----|---------------------|-----|-----|

本工事で石垣池前から県道亀山鈴鹿線までの間の下り線側道部の舗装を行います。遊歩道の通行形態を変えて施工を進めます。遊歩道利用の方の安全に留意し施工を行います。

**玉垣地区**

補強土壁工事  
排水構造物工事

|     |                       |     |     |
|-----|-----------------------|-----|-----|
| 工事⑲ | 23号玉垣地区道路建設工事 中井土木(株) | 進捗率 | 88% |
|-----|-----------------------|-----|-----|

今月は補強土壁工事、排水構造物工事を行っています。工事用道路をダンプトラックが頻りに走行するので、騒音・粉塵対策に気を付けると共に公道の汚損防止に努めます。

**玉垣地区**

至津 至四日市  
壁高欄  
歩道部  
車道部

|     |                      |     |     |
|-----|----------------------|-----|-----|
| 工事⑲ | 23号玉垣跨線橋上部工事 川田工業(株) | 進捗率 | 89% |
|-----|----------------------|-----|-----|

地覆、壁高欄のコンクリート打設を行っています。月末には夜間交通規制を伴う足場の解体を予定しております。引き続き皆様のご理解・ご協力お願い致します。

**玉垣地区**

至四日市  
A1側  
A2側  
工事完成

|     |                           |     |      |
|-----|---------------------------|-----|------|
| 工事⑲ | 23号北玉垣高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック | 進捗率 | 100% |
|-----|---------------------------|-----|------|

昨年2月に着工した現場架設工事も、皆様のご協力により無事に完了しました。工事中はご理解・ご協力誠にありがとうございました。

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| ②23号北玉垣<br>高架橋鋼上部工事<br>(株)駒井ハルテック  | ⑩23号玉垣地区<br>道路建設工事<br>中井土木(株)  | ⑪23号玉垣跨線橋<br>上部工事<br>川田工業(株)  | ⑫23号中勢道路<br>建設工事<br>(株)中村組        | ⑬23号北玉垣東<br>道路建設工事<br>(株)杉本組  |
|                                     |                                |                               |                                   |                               |
| 皆様のご協力により無事に完了しました。工事中はご理解・ご協力誠にありがとうございました。  | 安全第一を心掛け、笑顔の多い現場作りをします。   | 安全第一、”基本事項の徹底”で工事を進めます。  | 安全、品質を心掛け無事故、無災害で工事完成を目指します。  | 安心・安全・高品質で工事を進めていきます。  |
| ⑭23号北玉垣北<br>道路建設工事<br>丸亀産業(株)      | ⑮23号中勢道路<br>整備工事<br>朝日土木(株)    | ⑯23号末広道路<br>建設工事<br>(株)松本組    | ⑰23号北玉垣南<br>道路建設工事<br>三重農林建設(株)  | ⑱23号北玉垣<br>道路建設工事<br>(株)久志本組  |
|                                     |                                |                               |                                   |                               |
| 国道23号線の中央分離帯での作業です。特に安全に注意し作業を進めてまいります。よろしくお願ひします。  | 開通に向け無事故無災害で工事完成を目指します。   | 作業環境を整え無理なく、無事に工事を完成できるよう目指します。  | 安全第一で品質の良い工事を行ってまいりますのでよろしくお願ひします。  | 明るい現場で安全第一!! 無事故で完成を目指します。   |

⑲23号安塚北  
道路建設工事  
 松岡建設(株) 



周辺環境へ配慮し、無事故無災害で工事完成を目指します。

 Twitterについて

三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外にも、Twitterで情報を発信しています。通行規制や工事の動画なども発信しています。

▶▶▶ [https://twitter.com/mlit\\_mie](https://twitter.com/mlit_mie)

  
 三重河川国道事務所  
Twitter QRコード

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL : 059-387-8470 FAX : 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP  
(スマートフォン用)

道路の現状を発見したら

道路緊急  
ダイヤル **#9910**

全国共通 24時間受付
