



ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication



現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会




国道23号（中勢バイパス含む）に関する工事について



「地理院地図データ」（国土院）をもとに作成

施工箇所① 施工イメージ

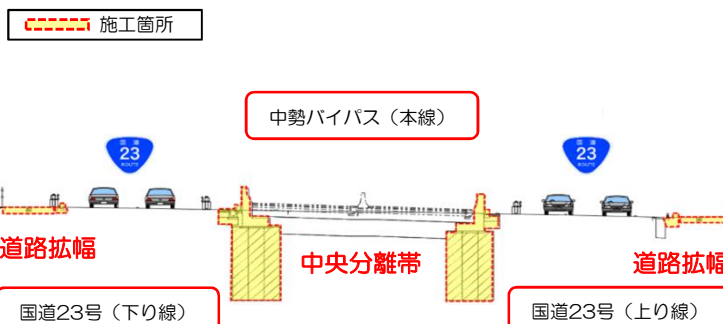

写真②

施工箇所②【北玉垣1】
令和4年7月撮影



写真①

施工箇所①
令和4年7月撮影



施工箇所②

令和3年度 23号中勢道路建設工事

(株)アイケーティ

本工事の主な内容は、現在の国道23号の拡幅に伴う工事と【北玉垣1】、中勢バイパスの本線・ランプにおける盛土やコンクリート擁壁などと、側道側の排水や用水路などの整備です【北玉垣2】。【北玉垣1】では、歩道の通行止め等を予定しています。工事に伴う通行規制の詳細が決まりましたら、改めてお知らせ致します。工事期間中は皆様方にご不便、ご迷惑をおかけしますが、安全作業で早期完成を目指しますので、ご理解とご協力をお願い致します。



施工箇所①

令和4年度 23号北玉垣北道路建設工事

朝日土木(株)

本工事は、中勢バイパスの本線と国道23号の現道を規制して施工する道路建設工事です。道路拡幅工事は走行車線を規制、中央分離帯工事は追越し車線を規制して施工してまいります。走行する皆様方にはご不便・ご迷惑をおかけすることがありますが、安全作業で早期完成を目指して作業してまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。工事に伴う通行規制の詳細が決まりましたら、改めてお知らせ致します。



中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

安塚地区

道路土工 舗装工
1号排水路工

末広千代崎線

工事③	23号末広道路建設工事 (株)松本組	進捗率	90%
-----	--------------------	-----	-----

8月より道路土工、舗装工を行います。また、8月2日、3日で末広千代崎線に横断水路を施工します。引き続き安全第一で工事を行っていきます。

安塚地区

補強土壁工事完了
側道工事
縁石工事
安塚南交差点

伊勢鉄道

補強土壁工事完了

工事⑥	23号安塚北道路建設工事 松岡建設(株)	進捗率	94%
-----	----------------------	-----	-----

工事も残すところ、あと1か月となりました。補強土壁工事は完了し、縁石工事、側道工事を中心に進めていきます。側道工事では現道との取付時に規制を伴いますので、安全に施工していきたいと思ひます。

玉垣地区

盛土工事
擁壁工事

至 国道23号

工事⑨	23号中勢道路建設工事 (株)アイケーディ	進捗率	1.2%
-----	-----------------------	-----	------

今月から擁壁工事や排水工事を順次施工していきます。排水工事につきましては一般道路での作業でもありますので第三者との事故防止に配慮しながら安全作業を進めていきますので、ご協力をお願いします。


玉垣地区

床版鉄筋組立 322m完了
床版鉄筋組立 8月中旬まで残り93m

国道23号

工事⑦	23号北玉垣高架橋床版工事 三重農林建設(株)	進捗率	36%
-----	-------------------------	-----	-----

8月中旬で床版鉄筋組立作業(360t)が完了となります。8月下旬より10月中旬頃まで床版コンクリート打設(1,450m³)を予定しています。引き続き、御理解・御協力をお願い致します。

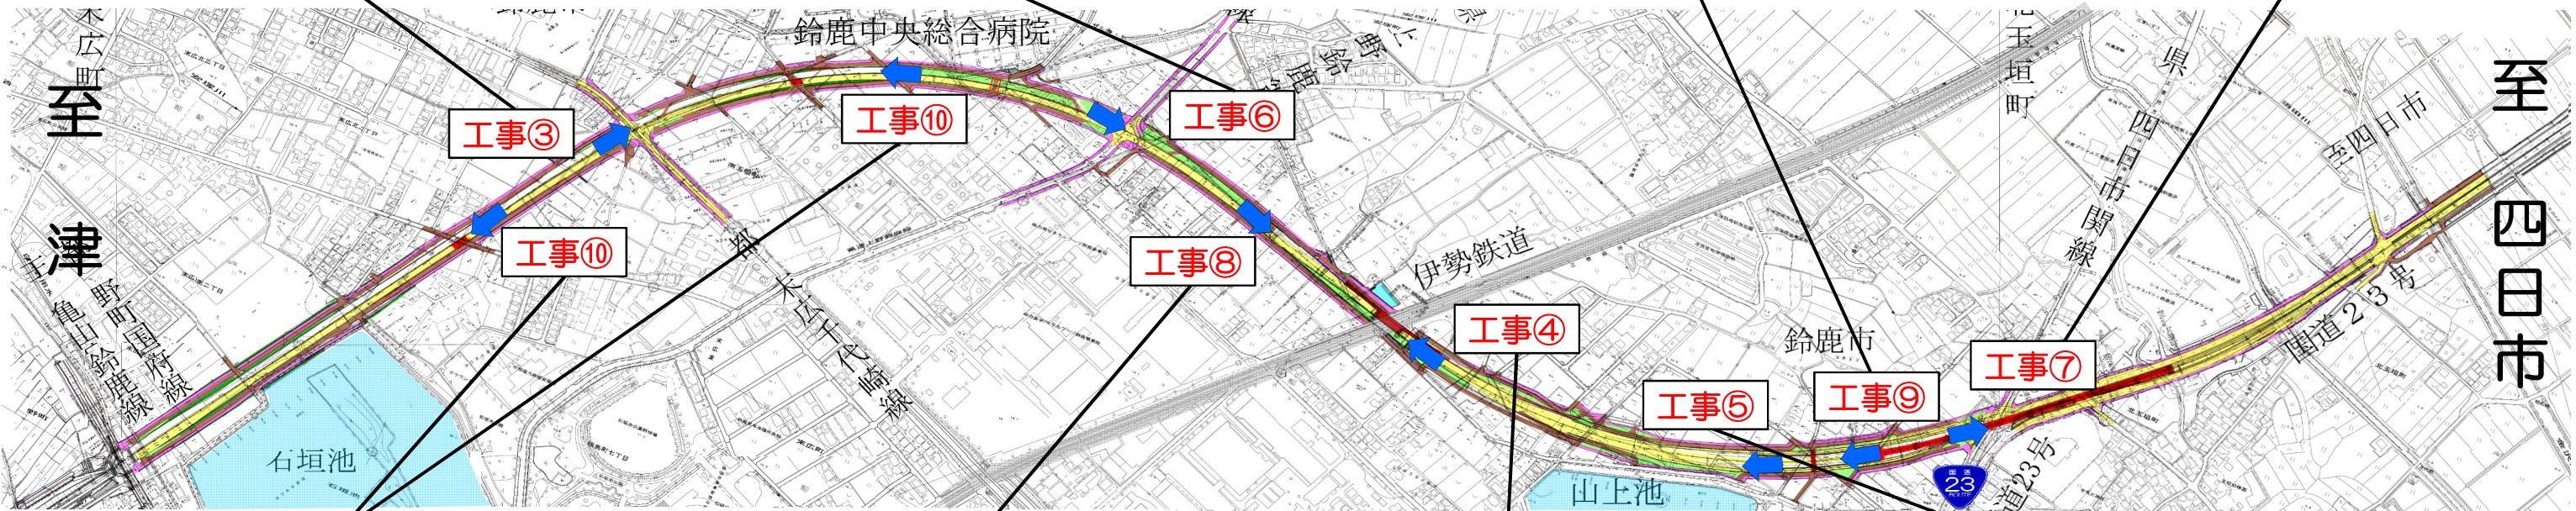

末広地区

施工範囲

工事⑩	23号中勢道路鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株)	進捗率	0%
-----	-------------------------	-----	----

8月中旬より場内整備(除草・仮囲い)を行います。準備が整い次第、順次工事を進めていきます。安全第一で工事を進めていきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

安塚地区

補強土壁工事
排水構造物工事(1号排水路) (8月初旬施工完了予定)

山上池
伊勢鉄道

工事⑧	23号安塚南道路建設工事 丸亀産業(株)	進捗率	11.6%
-----	----------------------	-----	-------

7月初旬より排水構造物工・補強土壁工事の施工を開始しました。側道通行の際は第三者との接触事故に注意し安全第一で工事を進めます。ご理解ご協力の程、宜しくお願ひ致します。

玉垣地区

補強土壁工事

伊勢鉄道

工事④	23号北玉垣南道路建設工事 三重農林建設(株)	進捗率	75%
-----	-------------------------	-----	-----

8月は補強土壁・路体盛土の工事を行っていきます。周辺地域へ配慮し安全第一で工事を進めていきますので、ご協力をお願いします。

玉垣地区

















重力式擁壁工事
剛性防護柵工事
補強土壁工事

山上池

工事⑤	23号北玉垣道路建設工事 (株)久志本組	進捗率	58%
-----	----------------------	-----	-----

今月も引き続き、補強土壁工事、剛性防護柵工事、重力式擁壁工事を行っております。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願ひ致します。工事期間変更: ~令和4年10月31日まで を ~令和4年12月28日まで に

令和4年度 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

23号末広道路 建設工事 (株)松本組 	23号北玉垣南 道路建設工事 三重農林建設(株) 	23号北玉垣 道路建設工事 (株)久志本組 	23号安塚北 道路建設工事 松岡建設(株) 
			
作業環境を整え無理なく、無事に 工事を完成できるよう目指します。	安全第一で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いします。	明るい現場で安全第一!! 無事故で完成を目指します。	周辺環境へ配慮し、無事故 無災害で工事完成を目指します。
23号北玉垣 高架橋床版工事 三重農林建設(株) 	23号安塚南 道路建設工事 丸亀産業(株) 	23号中勢道路 建設工事 (株)アイケーディ 	23号中勢道路 鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株) 
			
無事故・無災害をスローガンに安心・ 安全な工事現場を目指します。	安全第一で工事を進めて いきます!	一般車両・地元の方への配慮を し、作業間の意思疎通を取りながら 安全第一で進めています。	安全作業で工事を進めて参 ります。よろしくお願いします。

Twitterについて



三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外にも、Twitterで情報を発信しています。通行規制や工事の画像や動画なども発信していますので、フォローをよろしくお願い致します。

▶▶▶ https://twitter.com/mlit_mie



三重河川国道事務所
Twitter QRコード

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
- 中勢BP工事連絡協議会
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
TEL : 059-387-8470 FAX : 059-387-8471
- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP
<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>
ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html



三重河川国道事務所HP
QRコード



道路の異常を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル) へお電話ください!

