

ちゅうばす通信

Route23 CHUSEI BYPASS Communication

現場情報など各種掲載 中勢BP工事連絡協議会



車線規制及び歩道規制のお知らせ

中勢バイパスの工事に伴い、**令和4年9月6日～令和4年11月下旬（予定）（規制予定を参照）**にて**23車線規制及び歩道規制**を行います。工事中はご迷惑をおかけ致しますが、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。

また、規制の予定につきましては、ちゅうばす通信の他、Twitterでも案内を発信致しますので、併せてご確認をお願い致します。



三重河川国道事務所
Twitterアカウント
QRコード

位置図




規制予定


期間(予定)		9月			10月			11月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
規制箇所	上り線	9/6 走行車線・歩道規制 9:00～17:00 (月～土)								
	下り線	9/6 走行車線規制 9:00～17:00 (月～土)								
	上り線	9/6 歩道通行止め 終日 (作業日以外も通行止め)								
	下り線									

※天候や工事進捗状況により変更する場合があります。

写真①

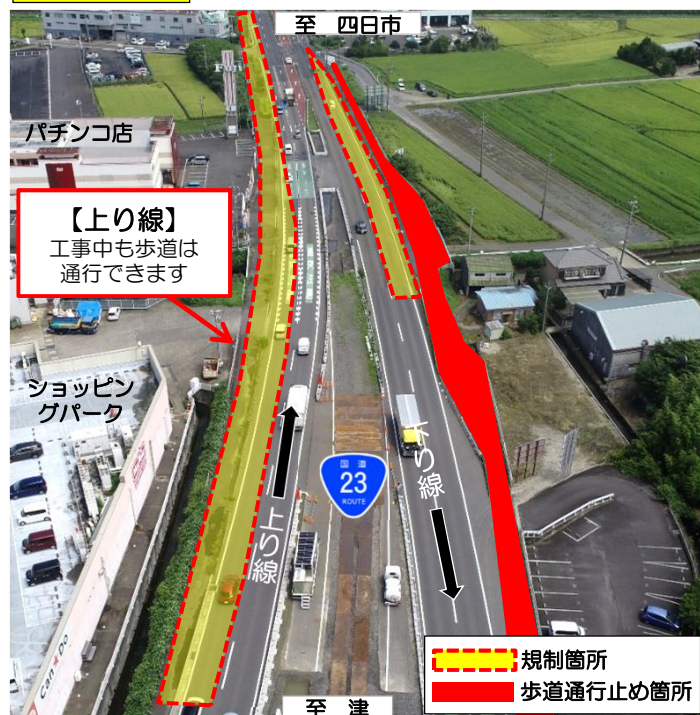

写真②

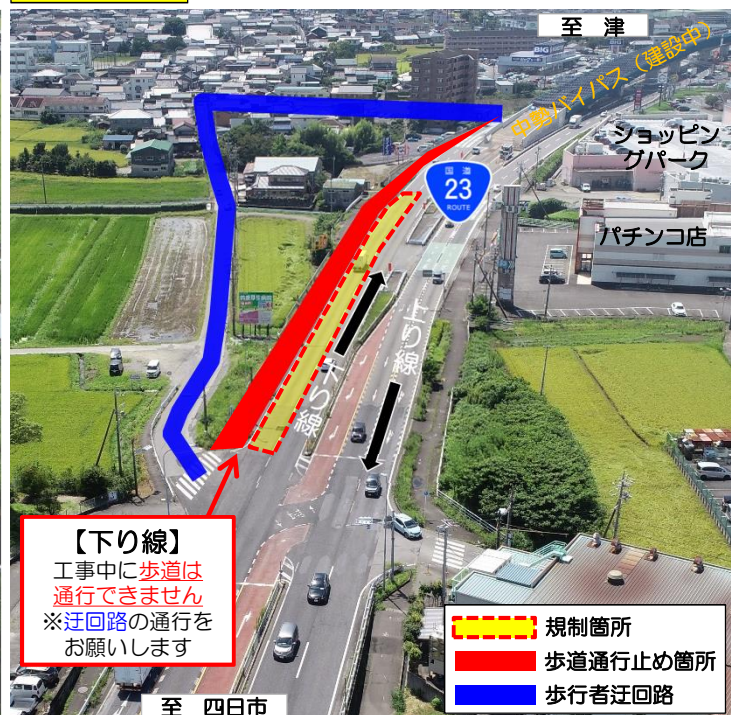

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

安塚地区



路盤工事

市道 末広千代崎線

工事③	23号末広道路建設工事 (株)松本組	進捗率	96%
-----	-----------------------	-----	-----

9月より本線の路盤工事を行います。9月中旬に工事完了を迎えますが、近隣住民の方々の協力もあり無事工事の完了を迎えることができます。引き続き安全第一で工事を行っていきます。

安塚地区

工事完了




安塚南交差点

工事⑥	23号安塚北道路建設工事 松岡建設(株)	進捗率	100%
-----	-------------------------	-----	------

令和3年11月より着工した工事は側道工事も完了し、工事完成となりました。周辺地域の住民の方には長い間ご迷惑お掛けしました。ご協力ありがとうございました。

玉垣地区

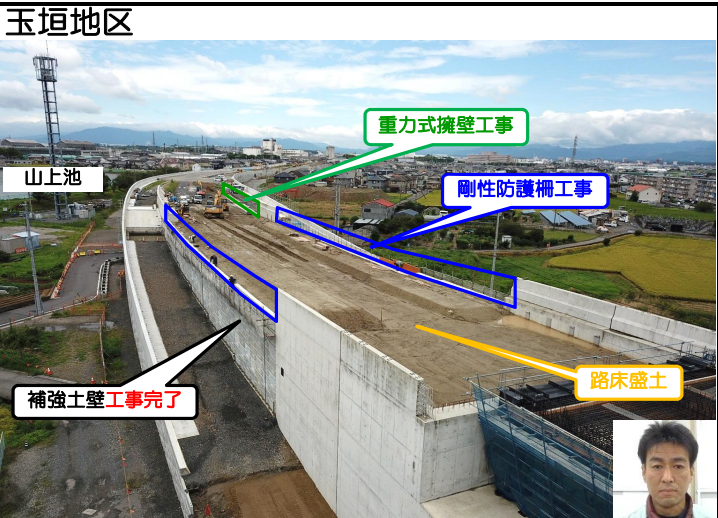

山上池

重力式擁壁工事

剛性防護柵工事


補強土壁工事完了

路床盛土

工事⑤	23号北玉垣道路建設工事 (株)久志本組	進捗率	69%
-----	-------------------------	-----	-----

現在、補強土壁工事が完了し、剛性防護柵工事、重力式擁壁工事を行っております。又、構造物が完了した箇所より路床盛土を行ってまいります。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願いします。

玉垣地区

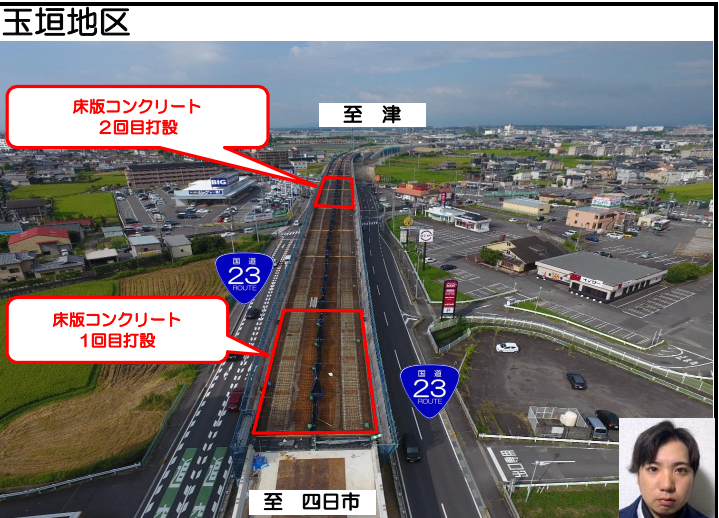

床版コンクリート
2回目打設


至 津

床版コンクリート
1回目打設

至 四日市

工事⑦	23号北玉垣高架橋床版工事 三重農林建設(株)	進捗率	45%
-----	----------------------------	-----	-----

8月下旬より10月中旬頃まで床版コンクリート(1,450m³)を18ブロックに分割(1ブロック約100m前後)して打設を行います。引き続き、御理解・御協力をお願い致します。

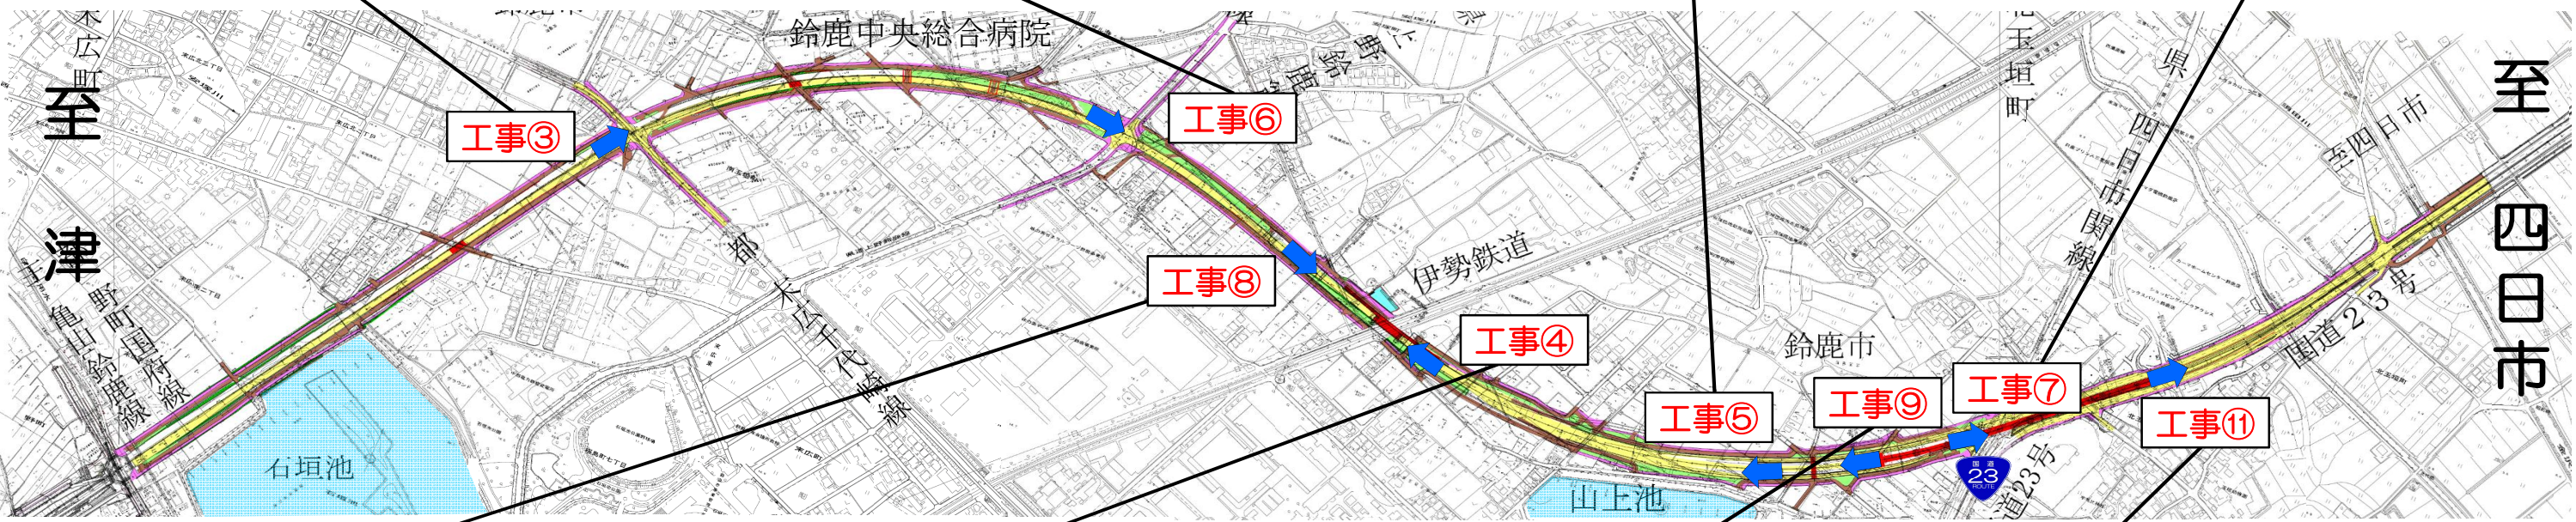

安塚地区



山上池

伊勢鉄道

補強土壁工事


排水路工事施工完了

斜路付階段工事

工事⑧	23号安塚南道路建設工事 丸亀産業(株)	進捗率	35%
-----	-------------------------	-----	-----

排水路工事が完了致しました。本格的に補強土壁工事、斜路付階段工事に進んでまいります。ダンプの搬入がありますので、交通安全、粉塵対策には特に注意し工事を進めさせていただきます。

玉垣地区

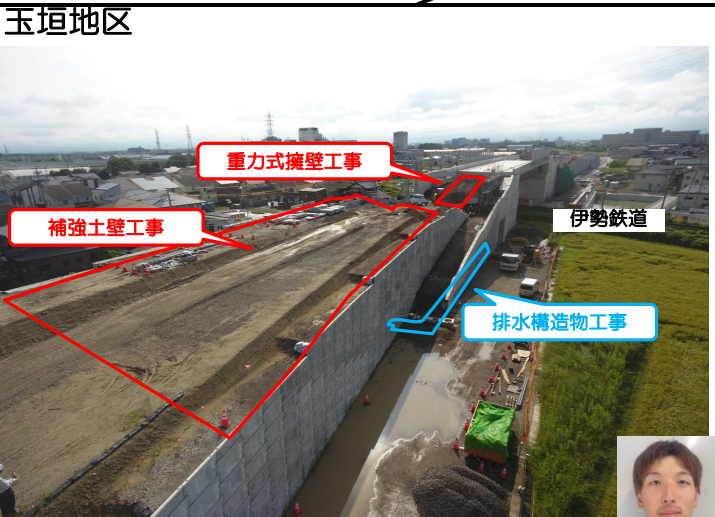

重力式擁壁工事

補強土壁工事


伊勢鉄道

排水構造物工事

工事④	23号北玉垣南道路建設工事 三重農林建設(株)	進捗率	81%
-----	----------------------------	-----	-----

9月は補強土壁・重力式擁壁・排水構造物の工事を行っていきます。周辺地域へ配慮し安全第一で工事を進めていきますので、ご協力をお願いします。

玉垣地区

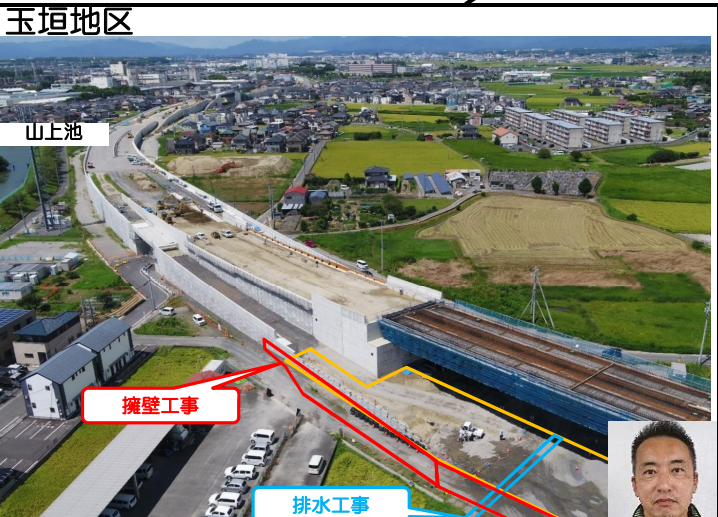

山上池


擁壁工事

排水工事

工事⑨	23号中勢道路建設工事 (株)アイケーティ	進捗率	14.5%
-----	--------------------------	-----	-------

今月も引き続き擁壁工事や排水工事を施工していきます。排水工事につきましては一般道路での作業もありますので第三者との事故防止に配慮しながら安全作業で進めていきますので御協力お願いします。

玉垣地区

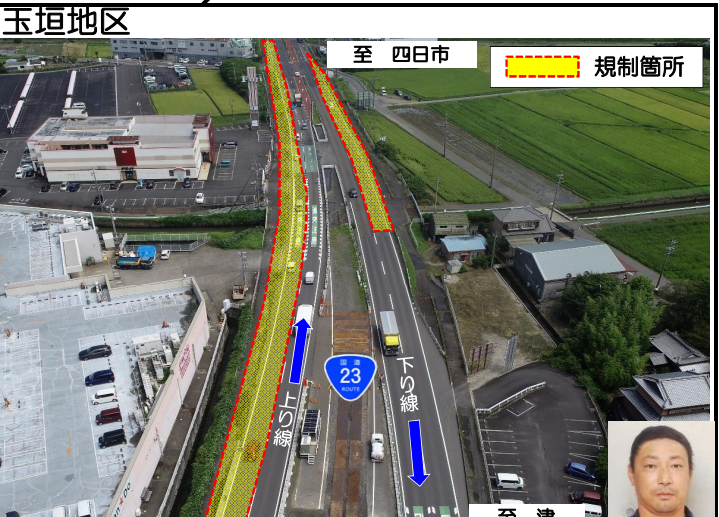

至 四日市

至 津

規制箇所

工事⑪	23号北玉垣北道路建設工事 朝日土木(株)	進捗率	1%
-----	--------------------------	-----	----

9月より、23号(現道)の拡幅工事を車線規制及び歩道規制を行い進めてまいります。作業中は車両や歩行者の通行等で多大なご迷惑をおかけすると思いますが、周辺に配慮し安全第一で作業を行います。

令和4年度 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

23号末広道路 建設工事 (株)松本組    作業環境を整え無理なく、無事に 工事を完成できるよう目指します。	23号北玉垣南 道路建設工事 三重農林建設(株)    安全第一で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いします。	23号北玉垣 道路建設工事 (株)久志本組    明るい現場で安全第一!! 無事故で完成を目指します。	23号安塚北 道路建設工事 松岡建設(株)    周辺地域の住民の方には長い間 ご迷惑お掛けしました。ご協力あり がとうございました。	23号北玉垣 高架橋床版工事 三重農林建設(株)    無事故・無災害をスローガンに安心・ 安全な工事現場を目指します。
23号安塚南 道路建設工事 丸亀産業(株)    安全第一で工事を進めて いきます！	23号中勢道路 建設工事 (株)アイケーディ    一般車両・地元の方への配慮を し、作業間の意思疎通を取りながら 安全第一で進めていきます。	23号中勢道路 鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株)   安全作業で工事を進めて参 ります。よろしくお願いします。	23号北玉垣北 道路建設工事 朝日土木(株)    無事故無災害での完成を目指 し、安全第一で工事を進めま す。	

Twitterについて



三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外にも、Twitterで情報を発信しています。通行規制や工事の画像や動画なども発信していますので、フォローをよろしくお願い致します。

▶▶▶ https://twitter.com/mlit_mie



三重河川国道事務所
Twitter QRコード

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先（バックナンバー配布可能です）

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
■中勢BP工事連絡協議会
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
TEL：059-387-8470 FAX：059-387-8471
■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP
<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>
ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzu



三重河川国道事務所HP
QRコード



道路の異常を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル)へお電話ください！

