

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication

中勢BP工事連絡協議会

--- 今月号のラインナップ ---

- 夜間通行規制についてのお知らせ(車線規制、通行止め) ■ 12月の工事進捗状況と今後の予定
- 中勢バイパス工事に伴う国道23号通行規制について

夜間通行規制についてのお知らせ(車線規制、通行止め)

先月号でお知らせしました、北玉垣高架橋床版工事の足場解体作業に伴う夜間通行規制(夜21時～翌朝6時)について、1月の通行規制をお知らせ致します。通行の際は規制看板や交通誘導員に従って、通行をお願い致します。
ご不便とご迷惑をおかけ致しますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

規制区間：鈴鹿市北玉垣町～西玉垣町

規制期間：1/11(水)～2/28(火) ※日曜日を除く、また工事の進捗や天候等により変更となる場合があります。

規制時間：夜21時～翌朝6時



1月11日(水)、1月23日(月)～27日(金)、1月30日(月)～1月31日(火)

●国道23号：1/2車線規制

1月12日(木)～13日(金)

●国道23号：上り線(四日市方面)
2/3車線規制

●県道四日市鈴鹿環状線：通行止め



1月16日(月)～1月20日(金)

●国道23号：対面通行

※北玉垣町北交差点では上下線ともに右折できません。


●県道四日市鈴鹿環状線：通行止め

●市道玉垣若松線：通行止め(東行き)

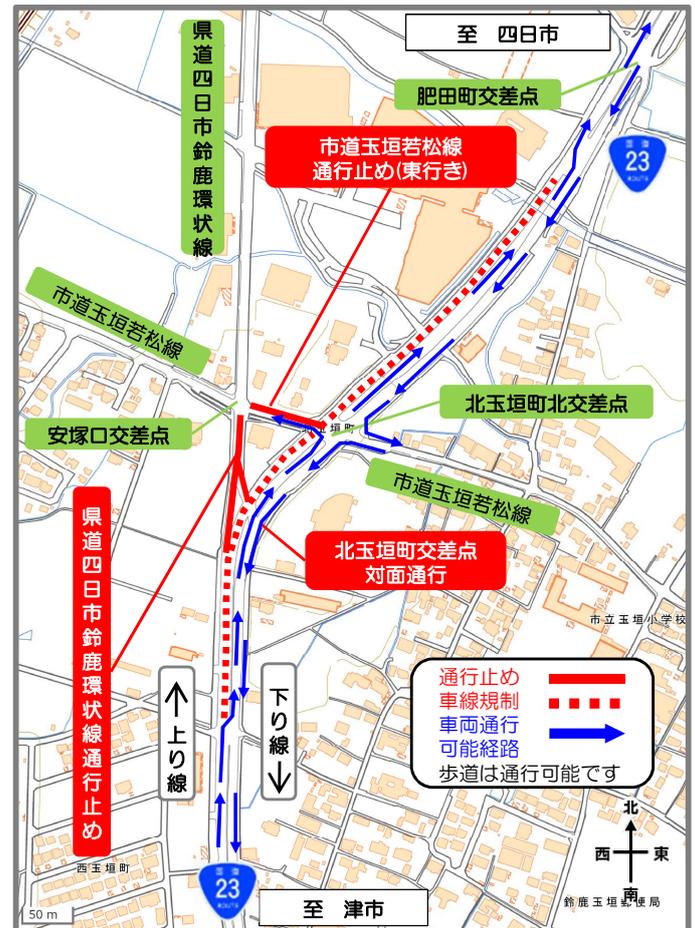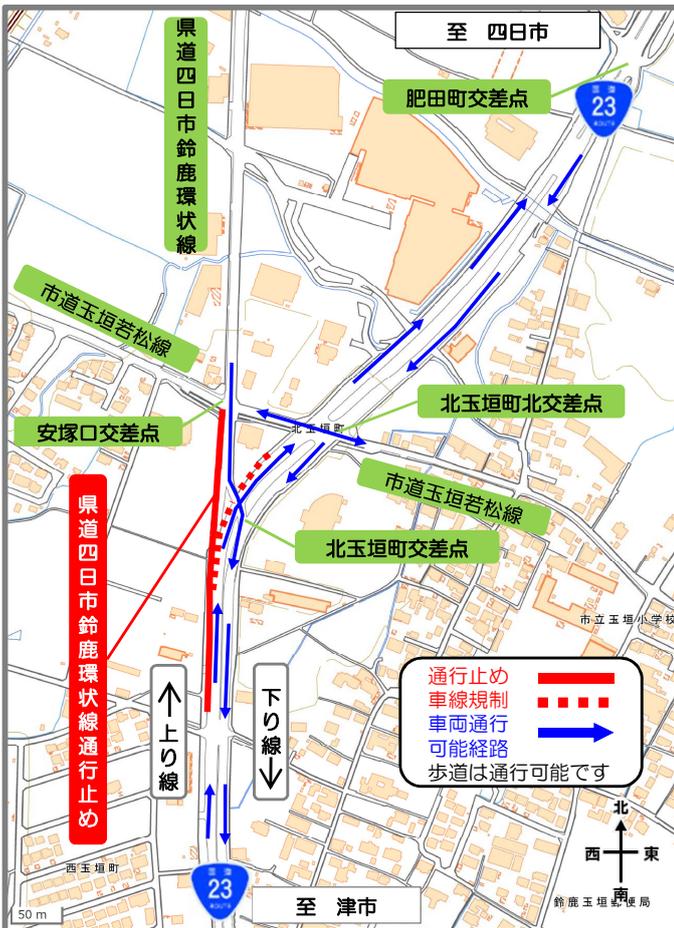

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

<p>末広地区</p>	<p>安塚地区</p>	<p>安塚・末広地区</p>	<p>玉垣地区</p>	<p>玉垣地区 至 四日市</p>	<p>玉垣地区</p>
<p>工事⑩ 23号中勢道路鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株)</p> <p>進捗率 60%</p> <p>1月上旬より安塚跨道橋下の側道取付部(市道安塚149号線)を施工する際に、交通規制(片側交互通行)を実施します。安全第一で工事を進めていきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。</p>	<p>工事⑩ 23号末広舗装工事 (株)昭建</p> <p>進捗率 —</p> <p>1月より本線部の舗装工事を行います。施工中は、工事車両が入り込みますので地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程宜しくお祈りいたします。</p>	<p>工事⑤ 23号北玉垣道路建設工事 (株)久志本組</p> <p>進捗率 100%</p> <p>12月末日にて全工事が完了しました。工事期間中は、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございました。</p>	<p>工事⑦ 23号北玉垣高架橋床版工事 三重農林建設(株)</p> <p>進捗率 90%</p> <p>12月にて、RC床版工事及び橋梁付属物工事が完了しました。R5.1月より夜間交通規制にて足場の撤去作業を行います。引き続き、御理解・御協力をお願い致します。</p>	<p>工事⑩ 23号北玉垣西舗装工事 岐建(株)</p> <p>進捗率 —</p> <p>令和5年1月より本工事に着手させていただきます。舗装工事、排水構造物工事、情報ボックス工事を行ってまいります。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力の程宜しくお祈り致します。</p>	<p>凡例(施工箇所) ■ 既建橋 ■ 橋既建 ■ 本線舗装</p>

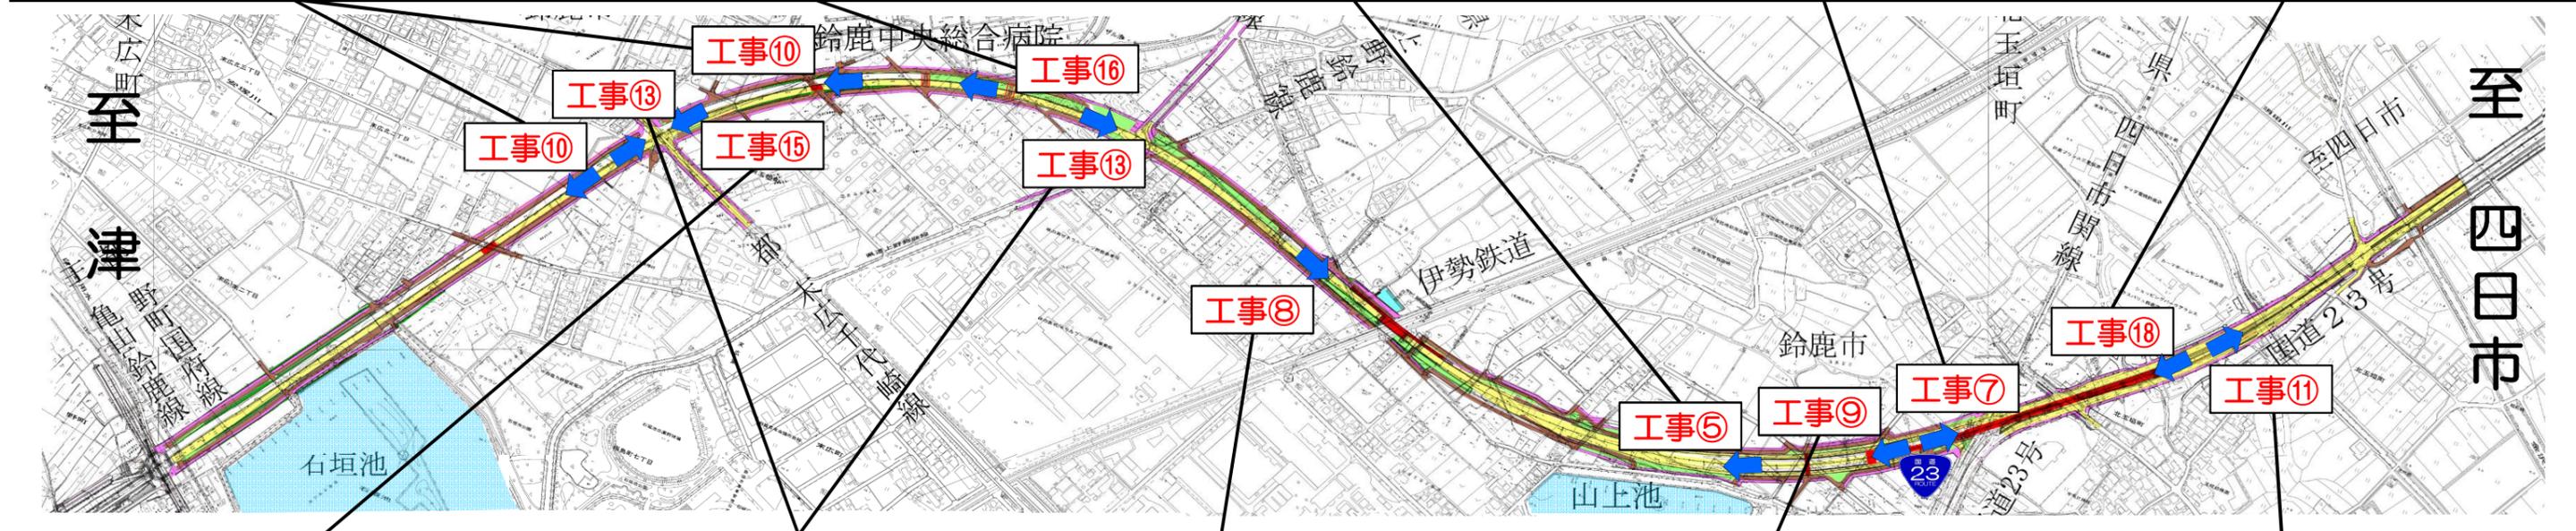

<p>野町地区</p>	<p>安塚地区</p>	<p>安塚地区</p>	<p>玉垣地区</p>	<p>玉垣地区</p>
<p>工事⑮ 23号野町舗装工事 (株)ガイアート</p> <p>進捗率 2%</p> <p>年明けからの施工に向けて測量等の準備をしております。仕上げの舗装工事を、無事故・無災害で早期完了を目指します。</p>	<p>工事⑮ 23号末広道路建設工事 丸亀産業(株)</p> <p>進捗率 13.5%</p> <p>【安塚区】にて1月からの剛性防護柵工事の施工に伴い壁面上端処理の施工が完了しました。12月末~1月中旬にかけて排水構造物工事、踏掛版工事の施工、1月中旬~剛性防護柵工事の施工を行ってまいります。【末広区】にて、12月末~管渠工事(場所打ち箱型管渠工)の施工を行ってまいります。2つの工区での施工を行ってまいりますので、重機災害及び交通災害には十分に注意し安全作業で工事を進めてまいります。</p>	<p>工事⑮ 23号安塚南道路建設工事 丸亀産業(株)</p> <p>進捗率 100%</p> <p>12月末をもちまして、担当工事を完了することができました。工事中への、ご理解ご協力誠にありがとうございました。</p>	<p>工事⑮ 23号中勢道路建設工事 (株)アイケーティ</p> <p>進捗率 82%</p> <p>1月から市道の規制をとめない排水構造物工事の施工を行います。道路は片側交互通行も行うこともあります。上のように車両の通るところも変わりますので、ご迷惑をおかけしますが御協力よろしくおねがいします。詳しくは看板等をご覧ください。</p>	<p>工事⑮ 23号北玉垣北道路建設工事 朝日土木(株)</p> <p>進捗率 32%</p> <p>1月は肥田交差点より北側の中央分離帯工事に着手するために上下線において車線規制(超越車線・走行車線)を行ってラインの切替を行います。規制に関する情報は規制予定看板や三重河川国道事務所のTwitterをご覧ください。引き続き、通行される皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全作業で進めてまいりますのでご協力をお願いします。</p>

現在実施中の中勢バイパス工事に伴う国道23号の通行規制は、1月以降も継続して行います(日曜日を除く)。また、1/6~1/19の期間は上下線で1/2車線規制を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。
 ※天候や工事進捗状況により変更する場合があります。

期間(予定)		1月			2月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
上り線	1/2車線規制 (9:00~17:00)	1/6~1/19(予定)					
	1/2車線規制 (9:00~17:00)	[規制箇所]					
下り線	1/2車線規制 (9:00~17:00)	[規制箇所]					
	歩道終日通行止め (作業日以外も通行止め)	[規制箇所]					

位置図



写真



令和4年度 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

23号北玉垣 道路建設工事 (株)久志本組	23号北玉垣 高架橋版工事 三重農林建設(株)	23号安塚南 道路建設工事 丸亀産業(株)	23号中勢道路 建設工事 (株)アイケーディ	23号中勢道路 鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株)	23号北玉垣北 道路建設工事 朝日土木(株)
明るい現場で安全第一!! 無事故で完成を目指します。	無事故・無災害をスローガンに安心・安全な工事現場を目指します。	安全第一で工事を進めていきます!	一般車両・地元の方への配慮をし、作業間の意思疎通を取りながら安全第一で進めていきます。	安全作業で工事を進めて参ります。よろしくお願いします。	無事故無災害での完成を目指し、安全第一で工事を進めます。
23号中勢道路 整備工事 三重農林建設(株)	23号末広道路 建設工事 丸亀産業(株)	23号野町舗装工事 (株)ガイアート	23号末広舗装工事 (株)昭建	23号北玉垣 西舗装工事 岐建(株)	23号北玉垣 東舗装工事 (株)昭建
安全第一で工事完成を目指します。	無事故・無災害を常に心掛け、明るく元気な現場にしていきます!!	仕上げの舗装工事を、無事故・無災害で早期開通を目指して完成させます。	作業は常に安全第一にて工事を進めて参りますので、宜しくお願いします。	無事故・無災害で完成できるように安全第一で工事を進めて参ります。	無事故無災害での完工を目指して進めて参ります。

発行/連絡先(バックナンバー配布可能です)

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
- 中勢BP工事連絡協議会
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471
- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP
<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>
ホームページからバックナンバーをご覧いただけます
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html



道路の異常を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル)へお電話ください!

