



ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication

中勢BP工事連絡協議会

--- 今月号のラインナップ ---

- 北玉垣高架橋床版工事足場解体作業完了のお知らせ
- 2月の工事進捗状況と今後の予定
- 中勢バイパス工事に伴う国道23号通行規制について

北玉垣高架橋床版工事足場解体作業完了のお知らせ

令和4年1月撮影



北玉垣高架橋床版工事の足場解体作業が完了しました。
 地域住民の皆さまにおかれましては、夜間通行規制へご協力いただき、ありがとうございました。引き続き、令和5年度のバイパス供用に向けて工事を進めていきますので、ご理解ご協力の程宜しくお願い致します。

令和5年2月撮影



位置図



「地理院地図データ」(国土地理院)をもとに作成

北玉垣高架橋の進捗状況

令和2年3月撮影

至 津

令和4年4月撮影

令和4年8月撮影

令和4年12月撮影



中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

安塚地区




工事⑩ 23号中勢道路鈴鹿地区舗装工事
(株)松岡建設

進捗率 89%

3月中旬にて工事完成を予定しております。残りひと月程度となりましたが、引き続き安全作業で工事を進めて参りますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。

安塚・末広地区

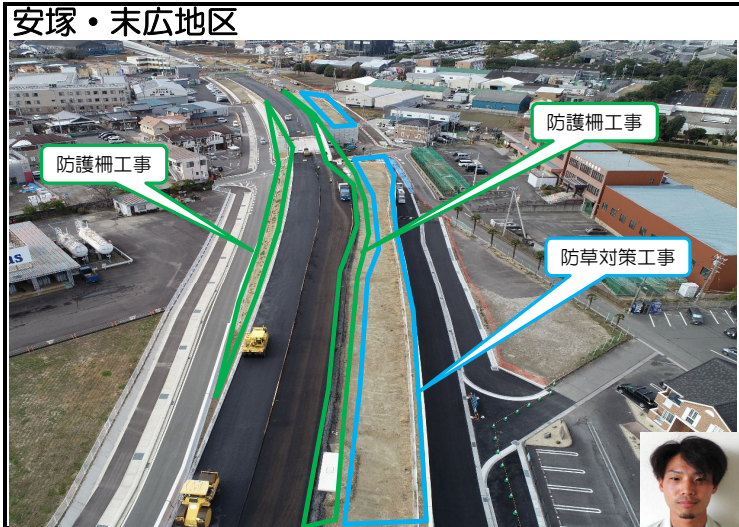


工事⑬ 23号末広舗装工事
(株)昭建

進捗率 32%

2月から本線部の防護柵工事を行っており、3月は防草対策工事を続けて行います。施工中は、工事車両が出入りしますので地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程宜しく申し上げます。

玉垣地区

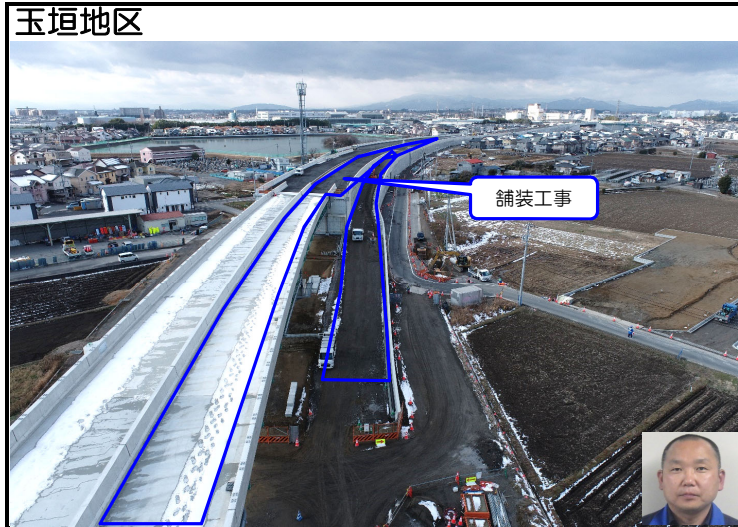

工事⑮ 23号北玉垣西舗装工事
(株)岐建

進捗率 6%

2月に引き続き、舗装工事を行っていきます。本線舗装は4層構造ですがそのうちの3層まで施工する予定です。ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力の程宜しくお願致します。


玉垣地区



工事⑦ 23号北玉垣高架橋床版工事
三重農林建設(株)

進捗率 98%

2月に足場の解体作業が完了しました。夜間交通規制にご協力頂きありがとうございました。3月の作業は主に片付け、場内整備となります。引き続き、御理解・御協力をお願い致します。

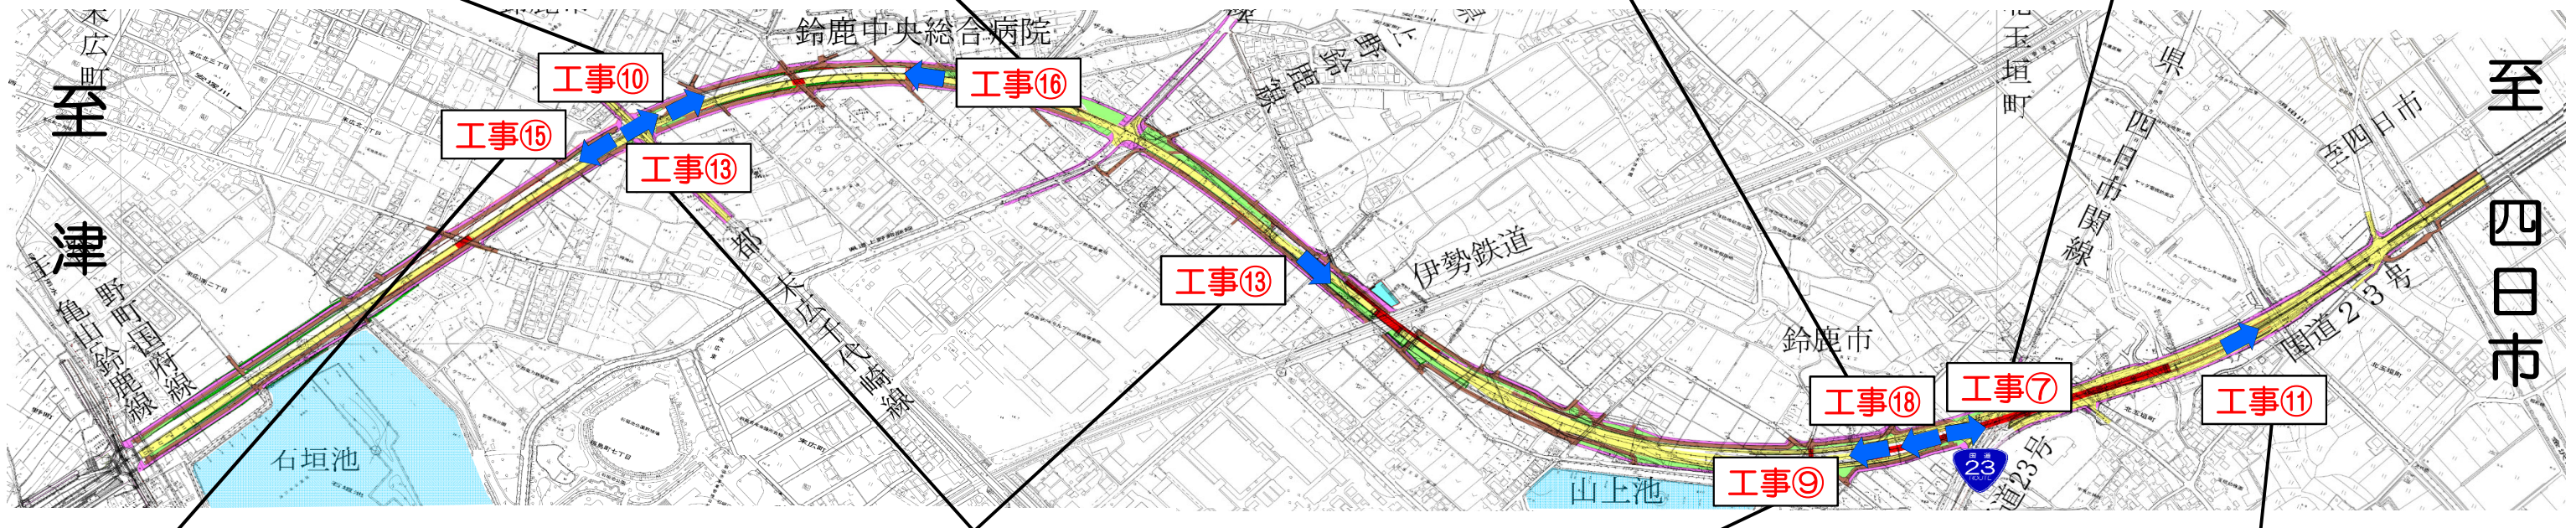

野町地区



工事⑮ 23号野町舗装工事
(株)ガイアート

進捗率 18%

1月下旬より3月上旬頃まで直線部分の舗装をします。仕上げの舗装工事を、無事故・無災害で早期完了を目指して完成させますので、御理解・御協力をお願い致します。

安塚・末広地区



工事⑬ 23号末広道路建設工事
丸亀産業(株)

進捗率 32%

【安塚工区】にて路床工事を行っております。重機とダンプとの接触事故に注意し安全作業で施工を行ってまいります。【末広工区】にて路床安定処理前の整正作業及び側道工事を行っております。隣接業者と密に連絡を行い引き続き安全作業で行ってまいります。2つの工区の総評と現場出入口での第三者害に注意し今後も安全作業で施工を行ってまいります。

玉垣地区



工事⑨ 23号中勢道路建設工事
(株)アイケーティ

進捗率 96%

現在市道部の排水構造物の施工を行っております。排水本管の施工が完了しましたら、元の市道へ復旧し、本工事は完了する予定です。ご不便とご迷惑をおかけしますが御協力よろしくおねがいします。

玉垣地区




工事⑪ 23号北玉垣北道路建設工事
朝日土木(株)

進捗率 58%

3月はバイパス先端の擁壁を施工してまいります。なお、3月中は23号の車線規制は行いません。また、長らくご迷惑をおかけしてまいりました、下り線歩道の通行止め(終日)は2月中旬より解除いたしました。工事により引き続きご迷惑をおかけすると思いますが、周辺に配慮し安全第一で作業を行います。

中勢バイパス工事に伴う国道23号通行規制について

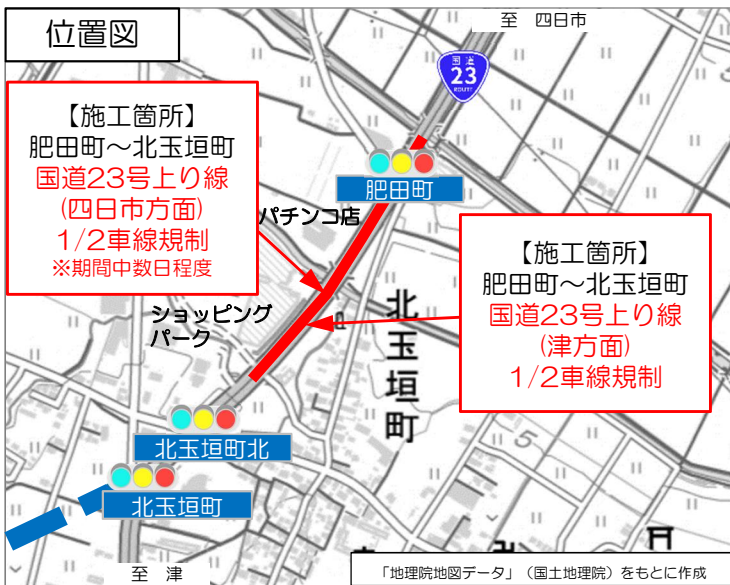

現在実施中の中勢バイパス工事に伴う国道23号の通行規制について、3月は車線規制を行いません。引き続き、4月より通行規制(左図)を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。
 ※工事の進捗や天候等により変更となる場合があります。

期間(予定)		3月			4月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
規制箇所	上の線	3月は車線規制を行いません			(期間中数日程度)		
	1/2車線規制 (9:00~17:00)						
下の線	3月は車線規制を行いません			(期間中数日程度)			
							1/2車線規制 (9:00~17:00)

中央分離帯工事

令和4年度 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

23号北玉垣 高架橋床版工事 三重農林建設(株)	23号中勢道路 建設工事 (株)アイケーディ	23号中勢道路 鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株)	23号北玉垣北 道路建設工事 朝日土木(株)	23号中勢道路 整備工事 三重農林建設(株)	23号末広道路 建設工事 丸亀産業(株)
無事故・無災害をスローガンに安心・安全な工事現場を目指します。	一般車両・地元の方への配慮をし、作業間の意思疎通を取りながら安全第一で進めていきます。	安全作業で工事を進めて参ります。よろしくお願い致します。	無事故無災害での完成を目指し、安全第一で工事を進めます。	安全第一で工事完成を目指します。	無事故・無災害を常に心掛け、明るく元気な現場にしていきたいです!!
23号中勢道路通信 設備整備工事 NDS(株)	23号野町舗装工事 (株)ガイアート	23号末広舗装工事 (株)昭建	23号中勢道路照明 設備整備工事 (株)大三洋行	23号北玉垣西 舗装工事 岐建(株)	23号北玉垣東 舗装工事 (株)昭建
安全に留意して、無事故・無災害での工事完成を目指します。	仕上げの舗装工事を、無事故・無災害で早期開通を目指して完成させます。	作業は常に安全第一にて工事を進めて参りますので、宜しくお願い致します。	無事故・無災害で工事を完成し、安全第一で施工していきます。	無事故・無災害で完成できるように安全第一で工事を進めて参ります。	無事故無災害での完工を目指して進めて参ります。
23号中勢道路標識 設置工事 東進産業(株)	23号北玉垣南 舗装工事 (株)ガイアート	23号中勢道路 建設工事 日本土建(株)	23号北玉垣北 舗装工事 フジタ道路(株)	23号安塚舗装工事 中井土木(株)	
無事故・無災害で工事を進めていきます。	早期開通を目指して無事故・無災害で工事を行っていきます。	常に笑顔で、安全第一で工事を進めていきます。	安全第一で早期完成を目指し工事を進めます。	早期での側道開通を目指し、安全第一で作業を行います。よろしくお願い致します。	

発行/連絡先 (バックナンバー配布可能です)

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
- 中勢BP工事連絡協議会
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471
- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP
<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>
ホームページからバックナンバーをご覧いただけます
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html



道路の異常を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル) へお電話ください!

