

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication


--- 今月号のラインナップ ---

- 側道開通についてのお知らせ
- 3月の工事進捗状況と今後の予定
-  中勢バイパス工事に伴う国道23号通行規制について

側道開通についてのお知らせ

末広町において
中勢バイパス側道の一部が通行できるようになります。(位置図参照)

側道開通日時: 令和5年4月25日10時頃(予定)

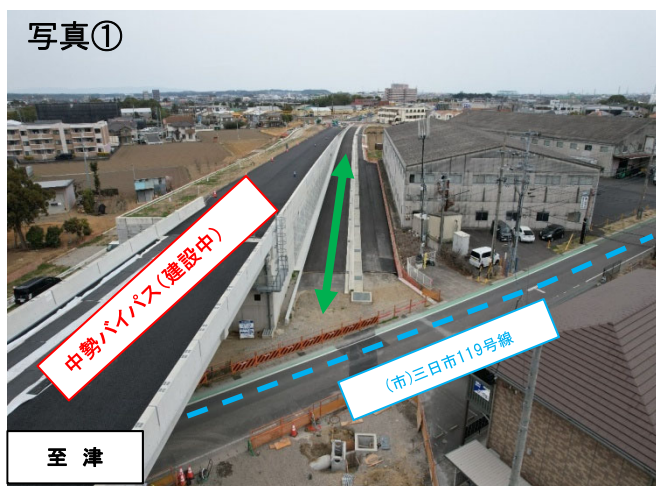


中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

安塚地区

工事完了



末広地区

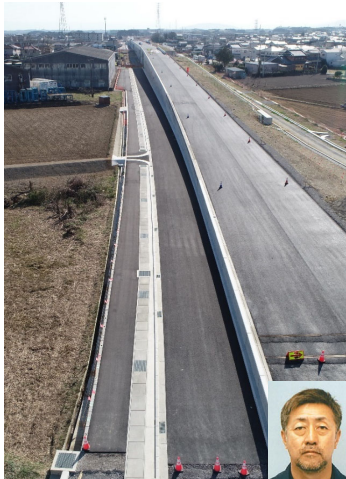

工事⑩	23号中勢道路鈴鹿地区舗装工事 松岡建設(株)	進捗率	100%
-----	----------------------------	-----	------

3月の中旬に無事、工事を完成することが出来ました。約半年間の短い期間でありましたが、近隣の方々には、工事に対しご理解とご協力を頂きありがとうございました。

安塚・末広地区



至 四日市

電線配管工事
排水構造物工事

至 津

工事⑩	23号末広舗装工事 (株)昭建	進捗率	45%
-----	--------------------	-----	-----

3月から本線部の防草対策工事を行っており、4月は安塚町南交差点付近の電気配管工事、排水構造物工事を続けて行います。施工中は、地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程宜しくお願いします。

玉垣地区



情報ボックス
照明配管
舗装工事

工事⑩	23号北玉垣西舗装工事 岐建(株)	進捗率	20%
-----	----------------------	-----	-----

4月からは情報ボックスや照明用配管、舗装工事を行っていきます。ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力の程宜しくお願い致します。

玉垣地区

工事完了




至 四日市

至 津市

工事⑦	23号北玉垣高架橋床版工事 三重農林建設(株)	進捗率	100%
-----	----------------------------	-----	------

3月末日にてコンクリート床版工事の全工程が完了しました。工事期間中は、御理解・御協力を賜り誠にありがとうございました。

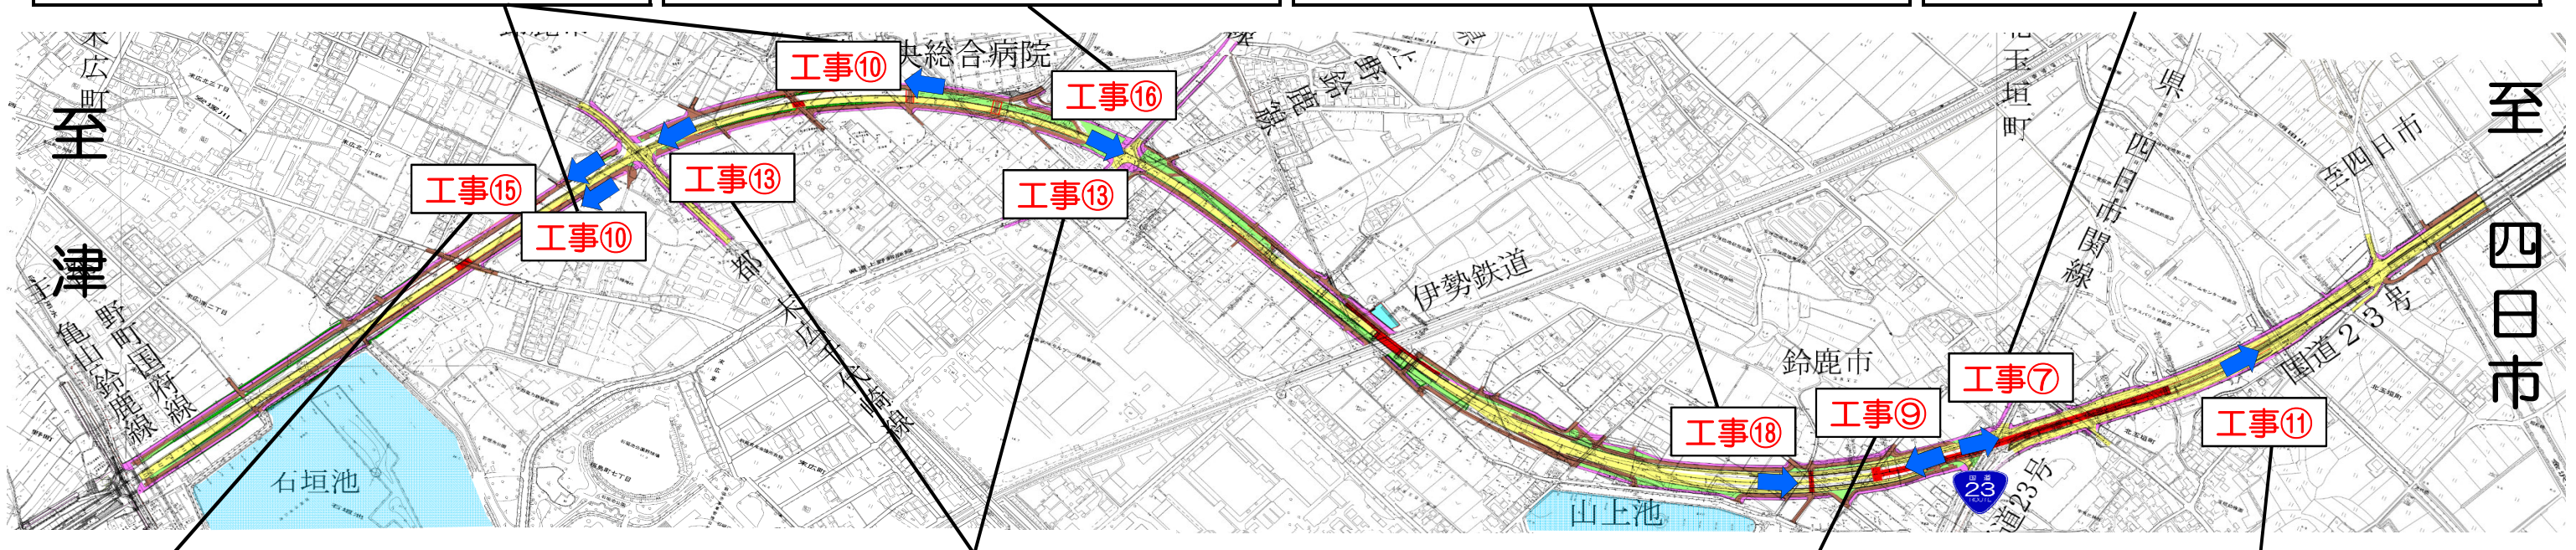

The map shows the route of the Chubu Bypass 4 construction zones, starting from Tsuru (津) and ending at Shikokuchiyama (至 四日市). The route is marked with various construction zones and progress indicators. Key locations include Tsuru, Shikokuchiyama, and the Ise Railway (伊勢鉄道). The map also shows the location of the Shikokuchiyama Hospital (中央総合病院) and the Shikokuchiyama Pond (石垣池).

野町地区



至 津市

至 四日市

工事⑮	23号野町舗装工事 (株)ガイアート	進捗率	41%
-----	-----------------------	-----	-----

R5.1月下旬よりR5.3月上旬頃までで直線部分の舗装を終え、4月より盛土と排水構造物の施工を行います。無事故・無災害で早期開通を目指し完成させますので、御理解・御協力をお願い致します。

安塚・末広地区



至 四日市

安塚工区

路盤工事

至 津

末広工区

4月25日供用予定

舗装工事

工事⑬	23号末広道路建設工事 丸亀産業(株)	進捗率	53%
-----	------------------------	-----	-----

【安塚工区】は路床整正の完了了し今後は路盤工事の方を施工をしていきます。現場出入口はタンクが往來しますので一般車との接触事故には十分注意したいと思ひます。また【末広工区】は側道部の排水構造物工事、縁石工事の施工が完了しました。3月末～舗装工事の施工を行って行きます。

玉垣地区


工事完了



工事⑨	23号中勢道路建設工事 (株)アイケーディ	進捗率	100%
-----	--------------------------	-----	------

3月末をもちまして、本工事の担当箇所について無事完成することが出来ました。工事中の皆様の御理解・御協力に感謝いたします。

玉垣地区

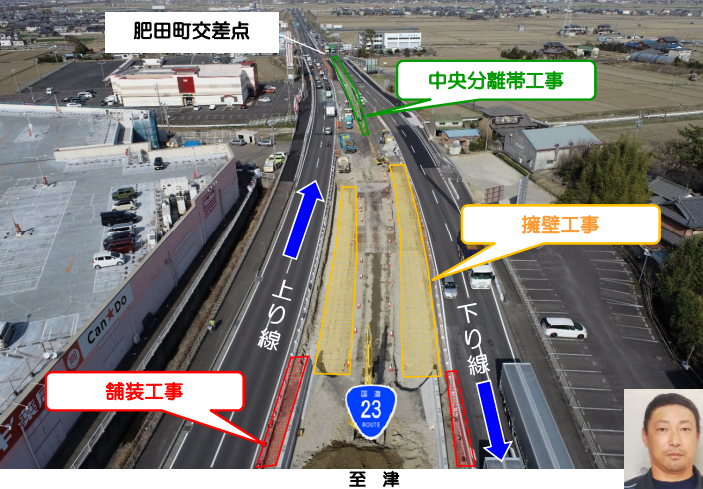

至 四日市

肥田町交差点

中央分離帯工事

擁壁工事

舗装工事

至 津

工事⑪	23号北玉垣北道路建設工事 朝日土木(株)	進捗率	68%
-----	--------------------------	-----	-----

4月も引き続き、バイパス先端の擁壁、中央分離帯、舗装工事をしてまいります。中央分離帯および、舗装施工時は車線規制を行います。工事により引き続きご迷惑をおかけすると思ひますが、周辺に配慮し安全第一で作業を行います。

23 中勢バイパス工事に伴う国道23号通行規制について



規制箇所		期間(予定)		
		4月		
		上旬	中旬	下旬
下り線	1/2車線規制			
上り線	1/2車線規制			

現在実施中の中勢バイパス工事に伴う国道23号の通行規制については、4月以降も継続して行います(左図)。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

※工事の進捗や天候等により変更となる場合があります。

中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

23号北玉垣北道路建設工事 朝日土木(株) 無事故・無災害での完成を目指し、安全第一で工事を進めます。	23号中勢道路整備工事 三重農林建設(株) 安全第一で工事完成を目指します。	23号末広道路建設工事 丸亀産業(株) 無事故・無災害を常に心掛け、明るく元気な現場にしていきたいです!!	23号中勢道路通信設備整備工事 NDS(株) 安全に留意して、無事故・無災害での工事完成を目指します。	23号野町舗装工事 (株)ガイアート 仕上げの舗装工事を、無事故・無災害で早期開通を目指して完成させます。	23号末広舗装工事 (株)昭建 作業は常に安全第一にて工事を進めて参りますので、宜しくお願いします。
23号中勢道路照明設備整備工事 (株)大三洋行 無事故・無災害で工事を完成し、安全第一で施工していきます。	23号北玉垣西舗装工事 岐建(株) 無事故・無災害で完成できるように安全第一で工事を進めて参ります。	23号北玉垣東舗装工事 (株)昭建 無事故・無災害での完工を目指して進めて参ります。	23号中勢道路標識設置工事 東進産業(株) 無事故・無災害で工事を進めていきます。	23号北玉垣南舗装工事 (株)ガイアート 早期開通を目指して無事故・無災害で工事を行っています。	23号中勢道路建設工事 日本土建(株) 常に笑顔で、安全第一で工事を進めていきます。
23号北玉垣北舗装工事 フジタ道路(株) 安全第一で早期完成を目指し工事を進めます。	23号安塚舗装工事 中井土木(株) 早期での側道開通を目指し、安全第一で作業を行います。よろしくお願い致します。	23号中勢BP整備工事 三重農林建設(株) 安全第一で品質の良い工事を行いますのでよろしくお願い致します。			

発行／連絡先

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 工務第二課
 〒514-8502 津市広明町297
 TEL: 059-229-2219 FAX: 059-229-2238

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP
<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>
 ホームページからバックナンバーをご覧いただけます
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html



道路の異常を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル) へお電話ください!

