

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication

今月号のラインナップ

■  中勢バイパス工事に伴う国道23号の通行規制について ■ 5月の工事進捗状況と今後の予定

中勢バイパス工事に伴う国道23号の通行規制について

下記の通り国道23号の通行規制を予定しております。通行の際は規制看板や交通誘導員に従って、通行をお願い致します。ご不便とご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

夜間車線規制について

中勢バイパスと国道23号が接続する北玉垣町交差点の工事に伴い、5月8日(月)から**夜間通行規制**(夜21時～翌朝6時)を行っています。



規制区間：鈴鹿市 北玉垣町～北玉垣町北

規制期間：5月8日(月)～10月下旬[予定]

※日曜夜21時から月曜朝6時は夜間通行規制はありません。

また工事の進捗や天候等により変更となる場合があります。

規制時間：夜21時～翌朝6時

規制内容

- **国道23号：1/2車線規制(上り、下り)**
- **県道四日市鈴鹿環状線：1/2車線規制(津方面)**
- **県道四日市鈴鹿環状線：通行止め(市役所方面)**

昼間車線規制・歩道規制について

現在実施中の中勢バイパス工事に伴う国道23号の昼間車線規制については、8月下旬頃まで継続して行います。また、国道23号下り線の歩道についても、6月30日(金)から規制を行いますが、歩道幅を確保しますので通行可能です。



規制区間：鈴鹿市 北玉垣町北～肥田町

車線規制期間：5月 8日(月)～8月下旬[予定]

歩道規制期間：6月30日(金)～8月下旬[予定]

※日曜日は除きます。

また工事の進捗や天候等により変更となる場合があります。

規制時間：9時～17時

規制内容

- **国道23号：1/2車線規制(上り、下り)**
- **国道23号：歩道規制(下り)**

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

安塚・末広地区 至 四日市

電線配管工事
舗装工事

電線配管工事
舗装工事

至 津

工事⑥	23号末広舗装工事 (株)昭建	進捗率	67%
-----	--------------------	-----	-----

5月から安塚町南交差点付近の電線配管工事、舗装工事を行っており、6月は引き続き電線配管工事、舗装工事を行っていきます。施工中は、車線規制を行います。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。

北玉垣地区 至 津市

電線配管工事
舗装工事

至 四日市

工事⑩	23号北玉垣南舗装工事 (株)ガイアート	進捗率	28%
-----	-------------------------	-----	-----

R5.3月下旬までで本線舗装の施工を終え、6月は5月に引き続き排水構造物、新たに防草対策の施工を行います。無事故・無災害で早期開通を目指し完成させますので、御理解・御協力をお願い致します。


玉垣地区 至 四日市

構造物撤去工事
排水構造物工事
縁石工事

至 津市

工事⑧	23号北玉垣西舗装工事 岐建(株)	進捗率	45%
-----	----------------------	-----	-----

6月は国道23号現道で歩道及び路肩の改良作業を行ってまいります。夜間規制(21:00~翌6:00)が伴い、ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力の程宜しくお願い致します。

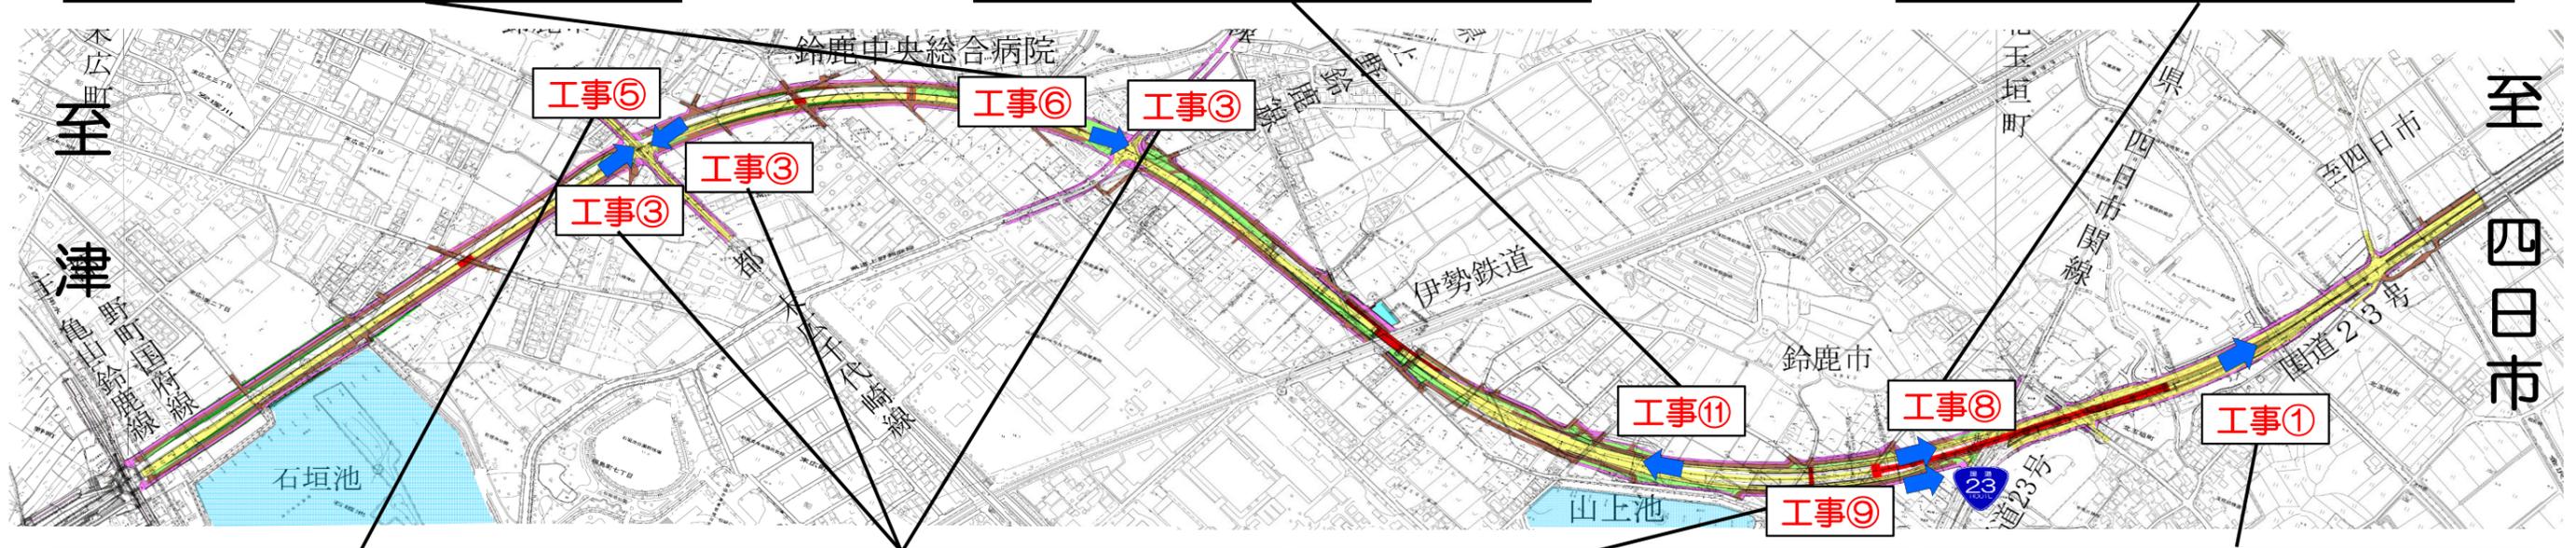

野町地区 至 津市

至 四日市

工事⑤	23号野町舗装工事 (株)ガイアート	進捗率	49%
-----	-----------------------	-----	-----

R5.1月下旬よりR5.3月上旬頃までで直線部分の舗装を終え、6月は4・5月に引き続き排水構造物、新たに防草対策の施工を行います。無事故・無災害で早期開通を目指し完成させますので、御理解・御協力をお願い致します。

安塚・末広地区

末広工区

安塚工区

末広工区

至 津市

至 四日市

工事③	23号末広道路建設工事 丸亀産業(株)	進捗率	70%
-----	------------------------	-----	-----

【安塚工区】にて下層路盤工の施工が完了しました。現在は情報ボックス工事の施工を行っております。【末広工区】にて歩道部の排水構造物工事、縁石工事を行っております。引き続き第三者及び一般車との接触事故には十分注意し作業を行ってまいります。また5月末頃より電線配管工事の施工を行います。隣接業者との接触事故には十分注意したいと思います。

玉垣地区 至 四日市

排水構造物工事
縁石工事

至 津

工事⑨	23号北玉垣東舗装工事 (株)昭建	進捗率	41%
-----	----------------------	-----	-----

5月に引き続き国道23号との接続付近の排水構造物・縁石の施工を行います。ご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力をお願い致します。

玉垣地区 至 四日市

排水構造物
縁石
舗装工事

盛土工事

至 津

工事①	23号北玉垣北道路建設工事 朝日土木(株)	進捗率	91%
-----	--------------------------	-----	-----

6月も現道23号の上下線において盛土工事・排水構造物、縁石及び、舗装工事を施工してまいります。施工時は車線規制を行います。工事により引き続きご迷惑をおかけすると思いますが、周辺に配慮し安全第一で作業を行います。

※掲載されている写真はドローンの飛行に必要な許可を得て撮影しています。

中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

①23号北玉垣北 道路建設工事 朝日土木(株)	②23号中勢道路 整備工事 三重農林建設(株)	③23号末広道路 建設工事 丸亀産業(株)	④23号中勢道路通信 設備整備工事 NDS(株)	⑤23号野町舗装工事 株ガイアート	⑥23号末広舗装工事 株昭建
無事故無災害での完成を目指し、安全第一で工事を進めます。	安全第一で工事完成を目指します。	無事故・無災害を常に心掛け、明るく元気な現場にしていきたいです！！	安全に留意して、無事故・無災害での工事完成を目指します。	仕上げの舗装工事を、無事故・無災害で早期開通を目指して完成させます。	作業は常に安全第一で工事を進めて参りますので、宜しくお願いします。
⑦23号中勢道路照明 設備整備工事 株大三洋行	⑧23号北玉垣西 舗装工事 岐建(株)	⑨23号北玉垣東 舗装工事 株昭建	⑩23号中勢道路標識 設置工事 東進産業(株)	⑪23号北玉垣南 舗装工事 株ガイアート	⑫23号中勢道路 建設工事 日本土建(株)
無事故・無災害で工事を完成し、安全第一で施工していきます。	無事故・無災害で完成できるように安全第一で工事を進めて参ります。	無事故無災害での完工を目指して進めて参ります。	無事故・無災害で工事を進めていきます。	早期開通を目指して無事故・無災害で工事を行っていきます。	常に笑顔で、安全第一で工事を進めていきます。
⑬23号北玉垣北 舗装工事 フジタ道路(株)	⑭23号安塚舗装工事 中井土木(株)	⑮23号中勢BP 整備工事 三重農林建設(株)			
安全第一で早期完成を目指し工事を進めます。	早期での側道開通を目指し、安全第一で作業を行います。よろしくお願致します。	安全第一で品質の良い工事を行いますのでよろしくお願致します。			

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします



発行／連絡先

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 工務第二課
〒514-8502 津市広明町297
TEL : 059-229-2219 FAX : 059-229-2238

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.htm>

ホームページからバックナンバーをご覧ください

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html



道路の異状を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル)へお電話ください!

