

ちゅうばす通信


Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication

--- 今月号のラインナップ ---

-  中勢バイパス(鈴鹿(安塚)工区)開通について
- 開通記念イベントの開催について
- 10月の工事進捗と今後の予定

中勢バイパス(鈴鹿(安塚)工区)開通について

令和5年10月20日に中勢バイパス(鈴鹿(安塚)工区)開通について記者発表がありました。



令和5年11月19日10時より開通式典、セレモニーが実施されます。
(式典・セレモニー会場は、会場の都合により一般の方のご来場はできません。)

開通記念イベントの開催について

- ・ 中勢バイパス本線の全線開通に伴い開通記念イベントが10月22日(日)に実施されました。
- ・ 市民ら約12,000人が来場され、青空の下で開通前の真新しい道路を歩かれました。

■ 開通記念イベント状況



① 会場内の様子(ステージ前)



② フリーウォーキングの様子



③ 会場内の様子(レーシングカー展示)




④ 会場内の様子(キッチンカー)

国道23号の通行規制については、11月中旬まで実施致します。

中勢バイパス(鈴鹿(安塚)工区) 工事進捗状況と今後の予定

安塚・末広地区

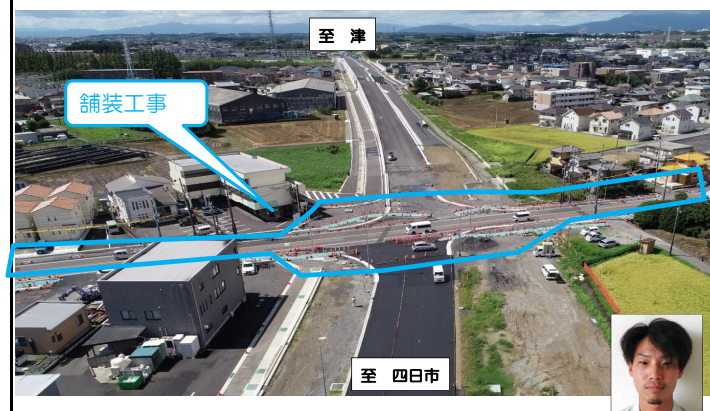


工事 ⑥	23号末広舗装工事 (株)昭建	進捗率	95%
10月は末広交差点付近の舗装工事を行っており、11月も引き続き末広交差点の舗装工事を続けて行います。施工中は、車線規制を行います。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程宜しく申し上げます。			

玉垣地区




工事 ⑨	23号北玉垣西舗装工事 岐建(株)	進捗率	97%
皆様のご理解のもと10月までに本工事はほぼ完了致しました。ご迷惑をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。11月は開通に向けて準備作業をしていきます。			

玉垣地区

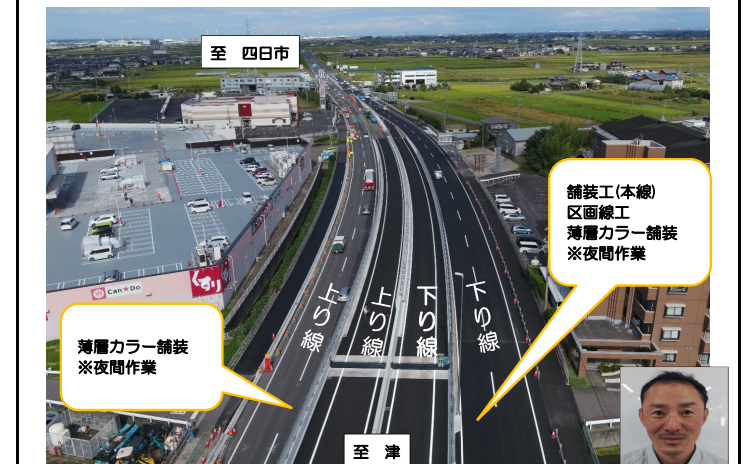

工事 ⑬	23号北玉垣北舗装工事 フジタ道路(株)	進捗率	55%
10月は昼間規制(9:00~17:00)にて上下線の歩道改良工事(舗装工・防護柵工・道路付属物工)、夜間規制(21:00~翌6:00)にて上り線本線の舗装工事を行っております。11月は舗装工事(夜間規制 本線部)を行います。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程宜しく申し上げます。			

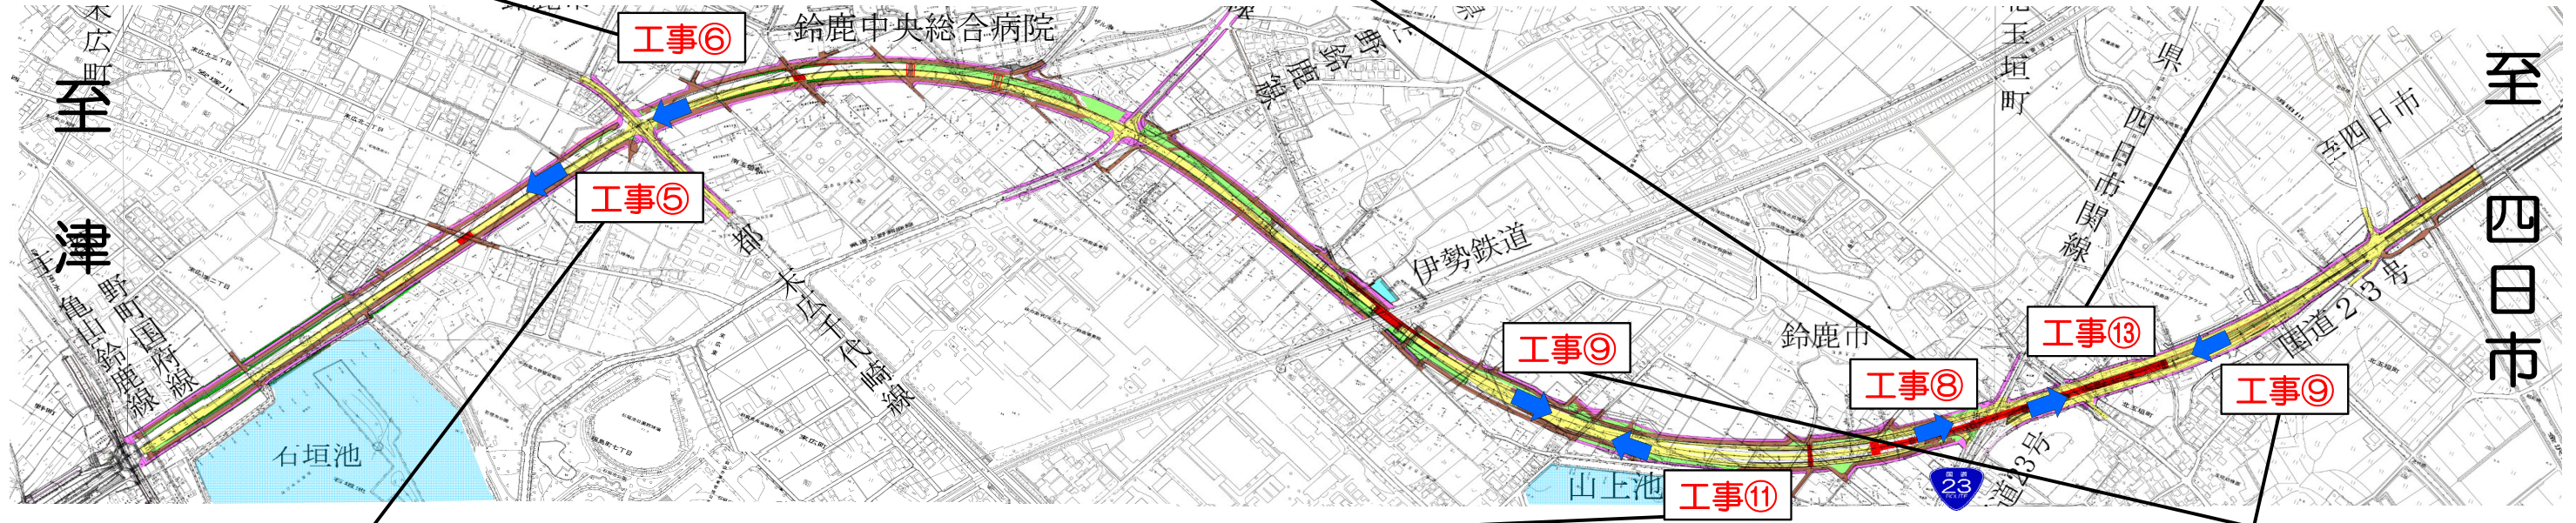

野町地区



工事 ⑤	23号野町舗装工事 (株)ガイアート	進捗率	98%
R5.10月下旬までで交差点舗装と本線の仕上げ舗装を終え、後は区画線(ライン)、防護柵を11月上旬完了を目途に施工して参ります。無事故・無災害で開通を目指し完成させますので、御理解・御協力をお願い致します。			

北玉垣地区



工事 ⑪	23号北玉垣南舗装工事 (株)ガイアート	進捗率	99%
R5.10月下旬までで本線舗装と区画線設置の施工を終え、後は防護柵を11月上旬完了を目途に施工して参ります。無事故・無災害で開通を目指し完成させますので、御理解・御協力をお願い致します。			

玉垣地区



工事 ⑩	23号北玉垣東舗装工事 (株)昭建	進捗率	100%
10月31日で全ての工事を完了することができました。施工中はご迷惑をおかけしましたが、ご協力いただきありがとうございました。			

※掲載されている写真はドローンの飛行に必要な許可を得て撮影しています。

中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

④23号中勢道路通信 設備整備工事 NDS(株) 	⑤23号野町舗装工事 (株)ガイアート 	⑥23号末広舗装工事 (株)昭建 	⑧23号北玉垣西 舗装工事 岐建(株) 	⑨23号北玉垣東 舗装工事 (株)昭建 	⑩23号中勢道路標識 設置工事 東進産業(株) 
					
安全に留意して、無事故・無災害での工事完成を目指します。	仕上げる舗装工事を、無事故・無災害で早期開通を目指して完成させます。	作業は常に安全第一にて工事を進めて参りますので、宜しくお願いします。	無事故・無災害で完成できるように安全第一で工事を進めて参ります。	無事故・無災害で工事を完了することができました。	無事故・無災害で工事を進めていきます。
⑪23号北玉垣南 舗装工事 (株)ガイアート 	⑫23号中勢道路 建設工事 日本土建(株) 	⑬23号北玉垣北 舗装工事 フジタ道路(株) 	⑭23号安塚舗装工事 中井土木(株) 	⑮23号中勢BP 整備工事 三重農林建設(株) 	⑯23号玉垣西 舗装工事 中井土木(株) 
					
早期開通を目指して無事故・無災害で工事を行っています。	常に笑顔で、安全第一で工事を進めています。	安全第一で早期完成を目指し工事を進めます。	早期での側道開通を目指し、安全第一で作業を行います。よろしくお願い致します。	安全第一で品質の良い工事を行っていますのでよろしくお願い致します。	安全第一で工事を進め、無事故・無災害での完成を目指します。
⑰23号中勢道路 整備工事 (株)田村組 					
					
安全第一、無事故・無災害を目標に工事を進めています。					

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします



発行／連絡先

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 工務第二課
〒514-8502 津市広明町297
TEL: 059-229-2219 FAX: 059-229-2238

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie>

ホームページからバックナンバーをご覧いただけます


https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html

三重河川国道事務所HP



QRコード

X(Twitter)



通行規制や工事状況などの情報を発信しています。



QRコード



道路の異状を発見したら

9910 (道路緊急ダイヤル)へお電話ください!

