

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS
Communication

--- 今月号のラインナップ ---

- 23 中勢バイパス全線開通について
- 9月の工事進捗と今後の予定

23 中勢バイパス全線開通について


中勢バイパス鈴鹿（安塚）工区の開通が下記の通り決定しました。

鈴鹿（安塚）工区の開通により、中勢バイパス全線が暫定2車線で開通します。

開通区間：国道23号中勢バイパス鈴鹿（安塚）工区
みえ すずか きたたまがきちよう のまち
三重県鈴鹿市北玉垣町～野町 約2.8km

開通日：令和5年11月19日（日）

■ 開通区間の位置図・状況

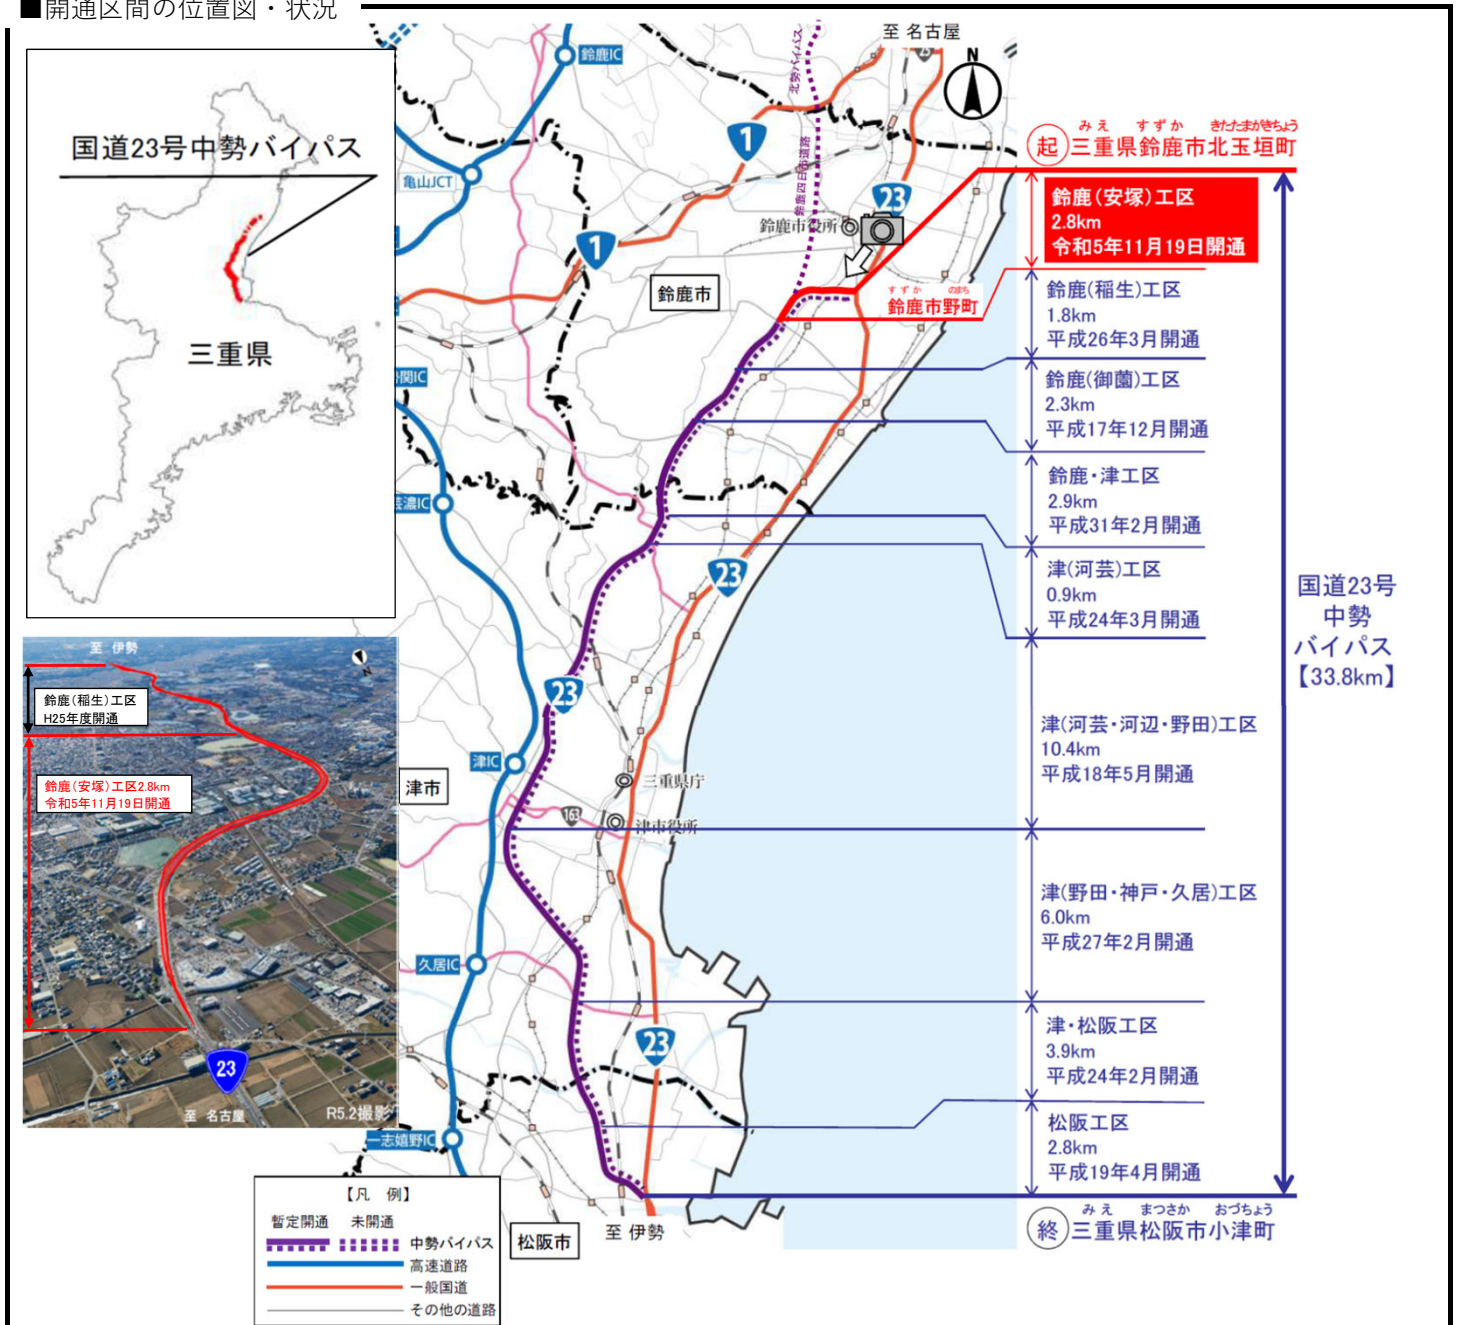

国道23号の通行規制については、10月も引き続き実施致します。

中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

安塚・末広地区

舗装工事

工事⑥	23号末広舗装工事 (株)昭建	進捗率	92%
-----	--------------------	-----	-----

9月は安塚町南交差点付近の舗装工事を行っており、10月は末広交差点の舗装工事を続けて行います。施工中は、車線規制を行います。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程宜しくをお願いします。

玉垣地区

区画線工事
防護柵工事
道路付属物設置工事

工事⑧	23号北玉垣西舗装工事 岐建(株)	進捗率	94%
-----	----------------------	-----	-----

10月はバイパス本線で区画線工事及び防護柵工事や道路付属物設置工事を行っていきます。工事車両の出入り等、ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力の程宜しくお願い致します。

玉垣地区


防護柵工
道路付属物工

構造物とりこわし工
排水構造物工
縁石工
舗装工
防護柵工
道路付属物工

舗装工(本線)
区画線工
※夜間作業

工事⑬	23号北玉垣北舗装工事 フジタ道路(株)	進捗率	30%
-----	-------------------------	-----	-----

9月は昼間規制(9:00~17:00)にて上下線の歩道改良工事(構造物とりこわし・排水構造物・舗装工事)、夜間規制(21:00~翌6:00)にて下り線本線の舗装工事を行っております。10月は上り線の歩道改良工事(昼間規制)及び本線工事(夜間規制)を行います。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程宜しくをお願いします。

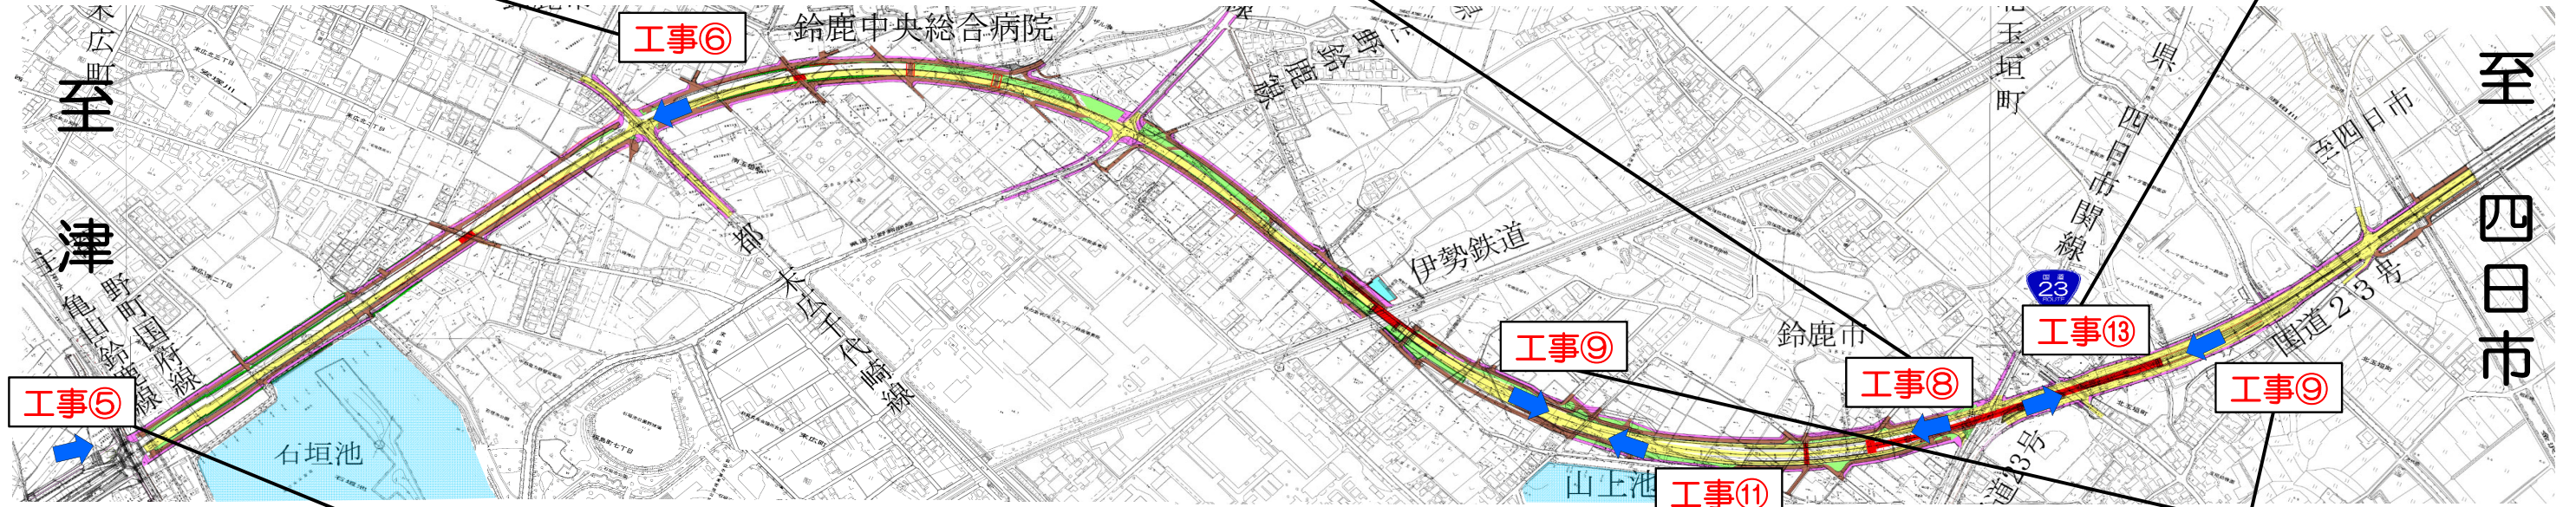

野町地区

工事⑥	23号野町舗装工事 (株)ガイアート	進捗率	85%
-----	-----------------------	-----	-----

R5.9月下旬までで交差点舗装の施工を終え、10月には本線の仕上げ舗装、区画線(ライン)、防護柵を11月上旬までに施工して参ります。無事故・無災害で早期開通を目指し完成させますので、御理解・御協力をお願い致します。

北玉垣地区

工事⑩	23号北玉垣南舗装工事 (株)ガイアート	進捗率	84%
-----	-------------------------	-----	-----

R5.9月下旬までで本線舗装の施工を終え、10月には区画線(ライン)と防護柵を11月上旬までに施工して参ります。無事故・無災害で早期開通を目指し完成させますので、御理解・御協力をお願い致します。

玉垣地区

ONラン

標識工
道路付属物工

標識工
道路付属物工

工事⑨	23号北玉垣東舗装工事 (株)昭建	進捗率	78%
-----	----------------------	-----	-----

9月で舗装工事を完了し、10月には標識や道路の付属物を施工します。近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力をお願い致します。

※掲載されている写真はドローンの飛行に必要な許可を得て撮影しています。

中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

③23号末広道路 建設工事 丸亀産業(株)	④23号中勢道路通信 設備整備工事 NDS(株)	⑤23号野町舗装工事 株ガイアート	⑥23号末広舗装工事 株昭建	⑦23号中勢道路照明 設備整備工事 株大三洋行	⑧23号北玉垣西 舗装工事 岐建(株)
無事故・無災害を常に心掛け、明るく元気な現場にしていきたいです!!	安全に留意して、無事故・無災害での工事完成を目指します。	仕上げる舗装工事を、無事故・無災害で早期開通を目指して完成させます。	作業は常に安全第一にて工事を進めて参りますので、宜しくお願いします。	無事故・無災害で工事を完成し、安全第一で施工していきます。	無事故・無災害で完成できるように安全第一で工事を進めて参ります。
⑨23号北玉垣東 舗装工事 株昭建	⑩23号中勢道路標識 設置工事 東進産業(株)	⑪23号北玉垣南 舗装工事 株ガイアート	⑫23号中勢道路 建設工事 日本土建(株)	⑬23号北玉垣北 舗装工事 フジタ道路(株)	⑭23号安塚舗装工事 中井土木(株)
無事故無災害での完工を目指して進めて参ります。	無事故・無災害で工事を進めていきます。	早期開通を目指して無事故・無災害で工事を行っています。	常に笑顔で、安全第一で工事を進めていきます。	安全第一で早期完成を目指し工事を進めます。	早期での側道開通を目指し、安全第一で作業を行います。よろしくお願致します。
⑮23号中勢BP 整備工事 三重農林建設(株)	⑯23号玉垣西 舗装工事 中井土木(株)	⑰23号中勢道路 整備工事 株田村組			
安全第一で品質の良い工事を行っていますのでよろしくお願致します。	安全第一で工事を進め、無事故・無災害での完成を目指します。	安全第一、無事故・無災害を目標に工事を進めています。			

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします



発行／連絡先

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 工務第二課
〒514-8502 津市広明町297
TEL: 059-229-2219 FAX: 059-229-2238

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからバックナンバーをご覧いただけます

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/office/region/news_spot/suzukoku.html



道路の異状を発見したら

#9910 (道路緊急ダイヤル)へお電話ください!

