

# 狩野川水系河川整備計画の点検

平成30年10月11日

国土交通省 中部地方整備局  
沼津河川国道事務所


## 河川整備計画の主な整備内容と整備進捗

- ◆ 狩野川水系河川整備計画策定時(平成17年度)からの整備状況
  - 堤防整備と河道掘削の整備進捗率は約4割～約6割と着実に進捗
  - 浸透対策は未着手、侵食対策(護岸整備)の整備進捗率は約2割

狩野川水系(大臣管理区間)河川整備計画の主な整備内容と整備進捗率

整備内容	河川整備計画 (数量)①	整備完了 (数量)②	残工事 (数量)	整備進捗率 ①÷②
堤防整備(嵩上げ・腹付け)	約19.0km	約7.7km	約11.3km	約41%
浸透対策	約15.0km	約0.0km	約15.0km	0%
侵食対策(護岸整備)	約10.2km	約2.1km	約8.1km	約21%
河道掘削	約247千m <sup>3</sup>	約24千m <sup>3</sup>	約223千m <sup>3</sup>	約10%
樹木伐開 (維持伐開を除く)	約3.7ha	約2.6ha	約1.1ha	約70%
横断工作物等の改築	2箇所	1箇所	1箇所	50%
危機管理型ハード対策	約0.9km	約0.9km	0.0km	100%
減災対策 (河川防災ステーション等の整備)	3箇所	0箇所	0箇所	0%
減災対策 (CCTVカメラの増設)	8基	0基	0基	0%

狩野川水系(大臣管理区間)河川整備計画  
 (平成17年12月16日 策定)  
 (平成28年12月9日 変更)

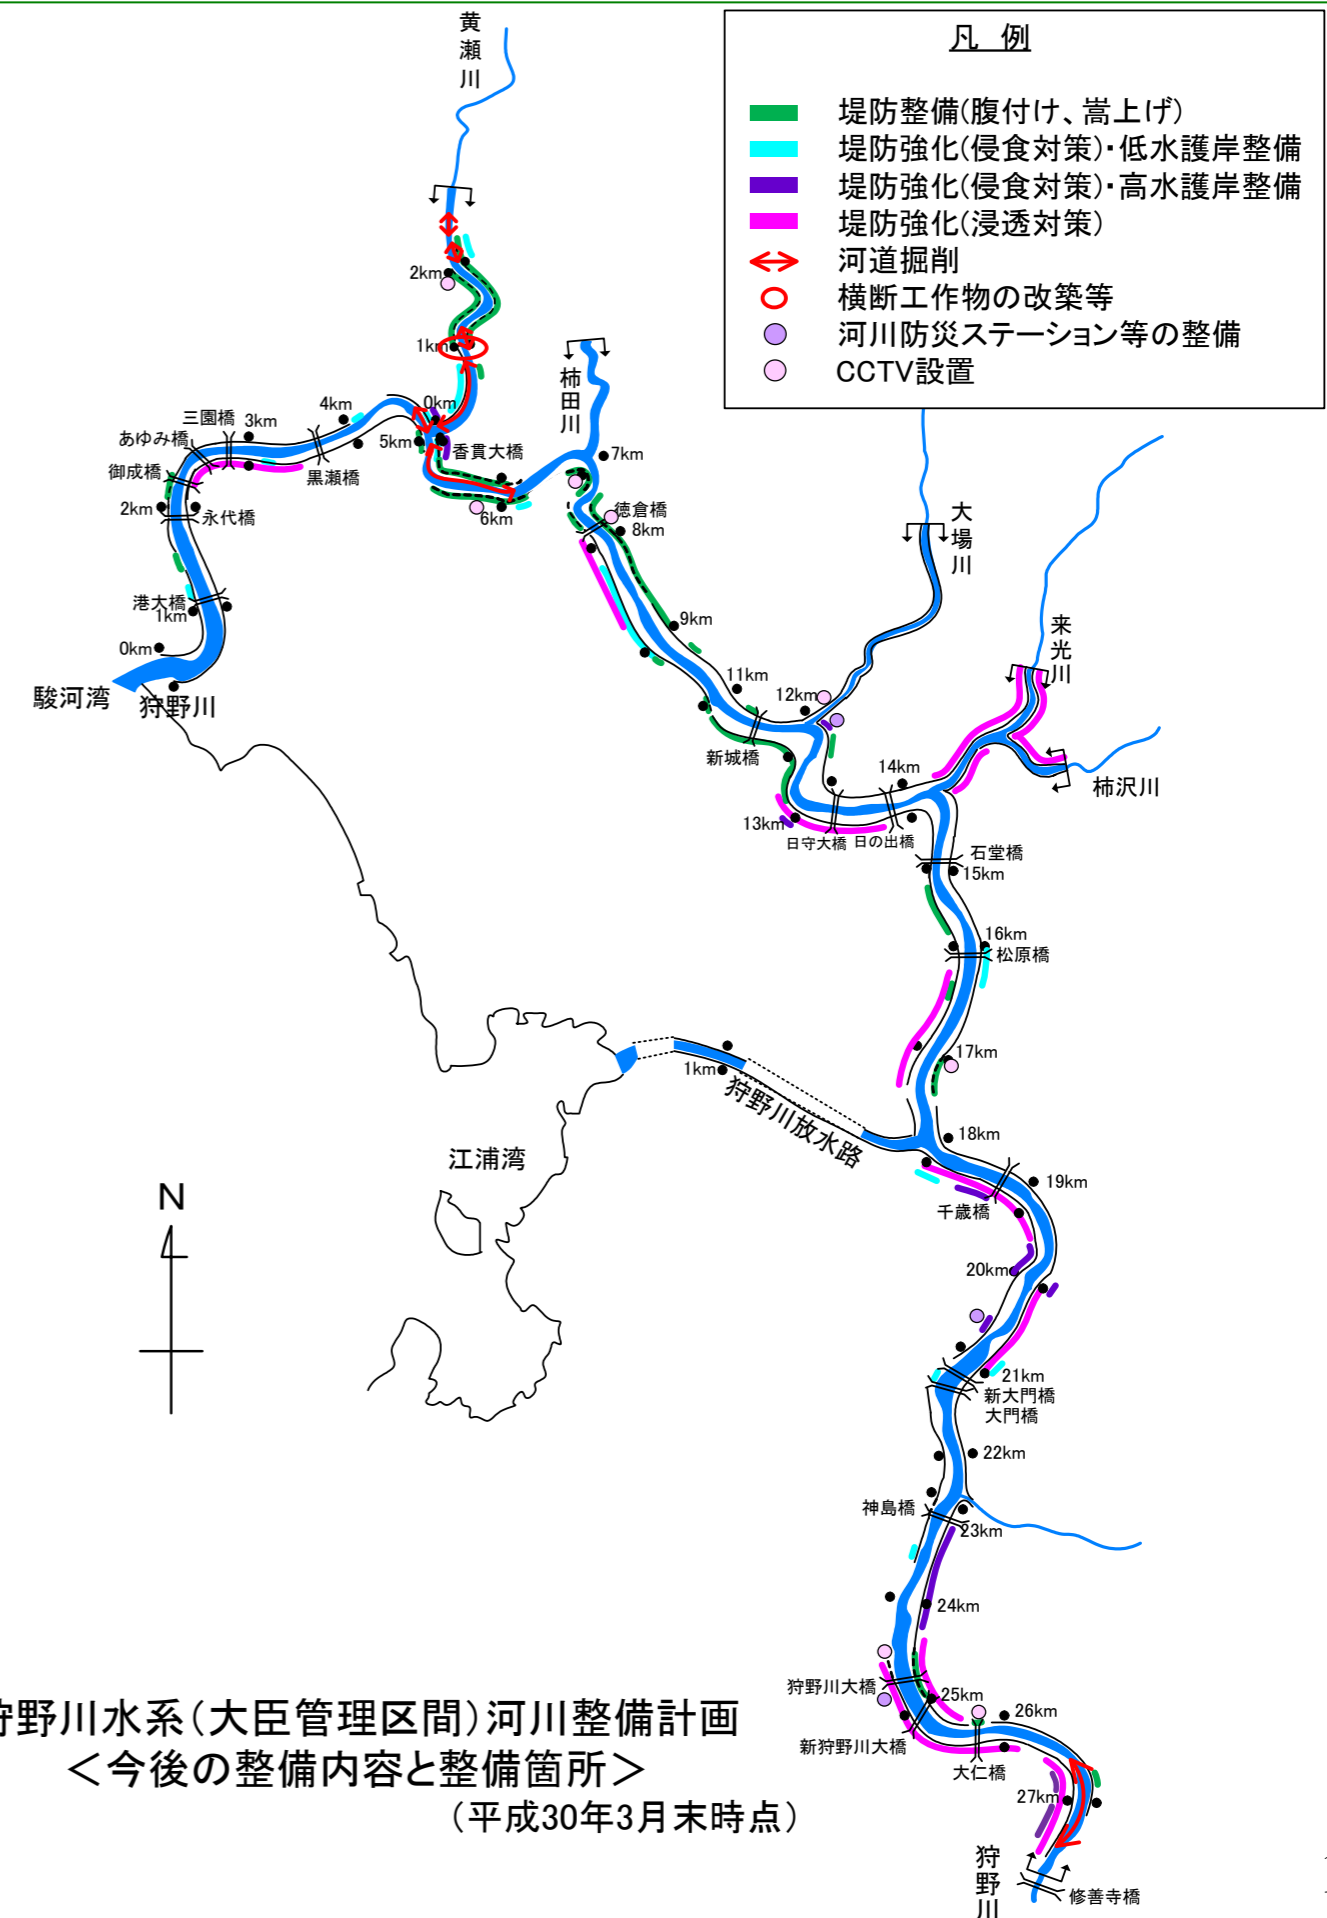

狩野川水系(大臣管理区間)河川整備計画  
 <今後の整備内容と整備箇所>  
 (平成30年3月末時点)

## 「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく緊急的な整備の進捗



- ◆ 平成27年9月の関東・東北豪雨等を踏まえた「水防災意識社会再構築ビジョン」に沿って、2020年度を目途に、以下の整備を推進区間において、
  - ・ 堤防高が低い等、当面の目標に対して流下能力が不足している箇所などの優先的に対策が必要な堤防整備や河道掘削などの「洪水を安全に流すためのハード対策」の実施
  - ・ 堤防天端の保護、堤防裏法尻の保護など決壊までの時間を少しでも延ばすよう、堤防構造を工夫「危機管理型ハード対策」の実施
  - ・ 緊急時の水防備蓄資材の確保のための「河川防災ステーション」の設置
  - ・ ハード・ソフト面からの「総合的な内水対策」の実施



事業の進捗状況			
洪水を安全に流すためのハード対策		危機管理型ハード対策	
内容	延長	完成延長	進捗率
浸透対策	—	—	—
パイピング対策	—	—	—
流下能力対策	4.7km	1.1km	23%
侵食・洗掘対策	—	—	—
堤防天端の保護	—	—	—
堤防裏法尻の保護	0.9km	0.9km	100%



## ① 沼津市大平地区の堤防整備状況(狩野川)

- ◆ <sup>おおひら</sup>沼津市大平地区の堤防は、堤防高と断面が不足
- ◆ また、同地区では、内水被害が頻発しているため、大平江川(沼津市)の河川改修とあわせ、堤防整備や樋管改築を実施
- ◆ 平成30年度は、樋管の改築を実施

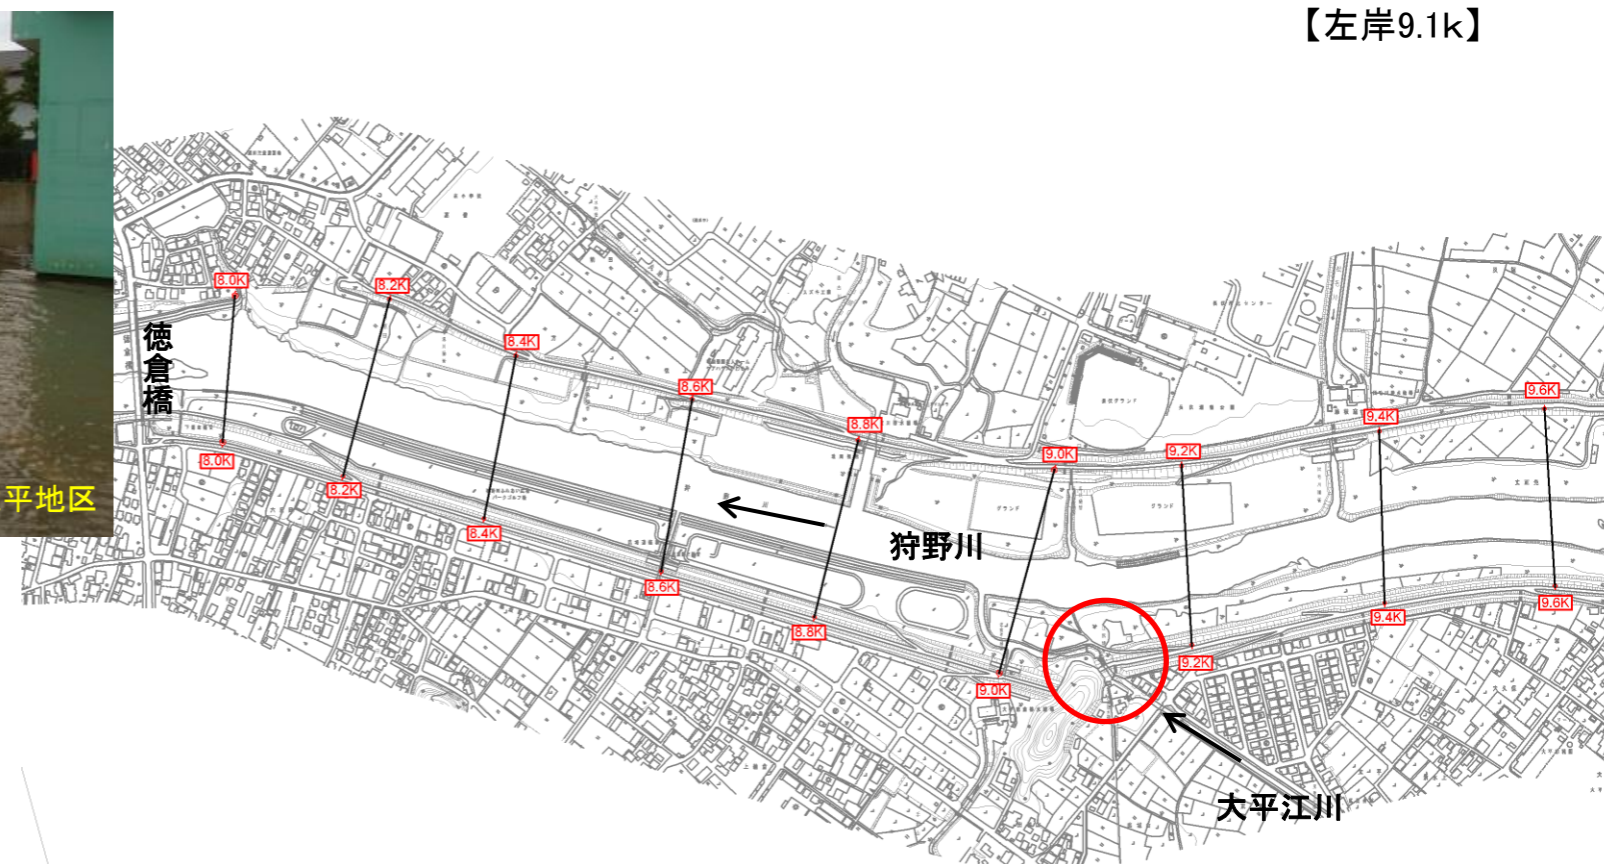

## ② 清水町長沢地区の河道掘削整備状況(狩野川)

- ◆ 清水町長沢地区の黄瀬川合流点付近は狭窄部であり、流下能力が不足しているため、河道掘削と樹木伐開を実施
- ◆ 平成30年度は、河道掘削と樹木伐開を実施

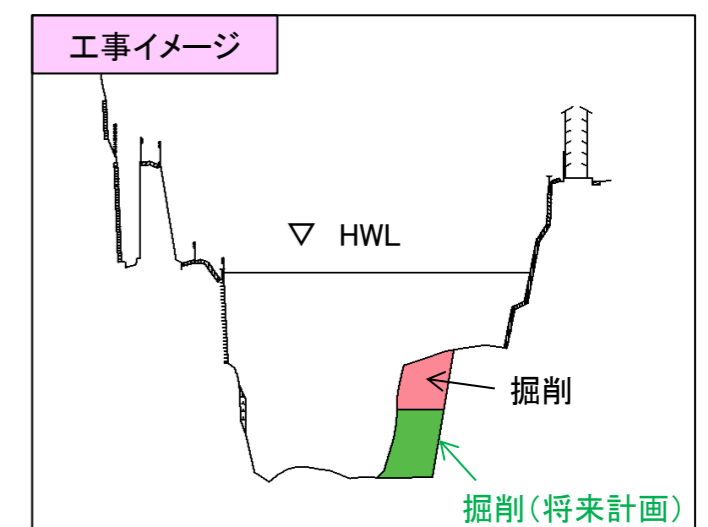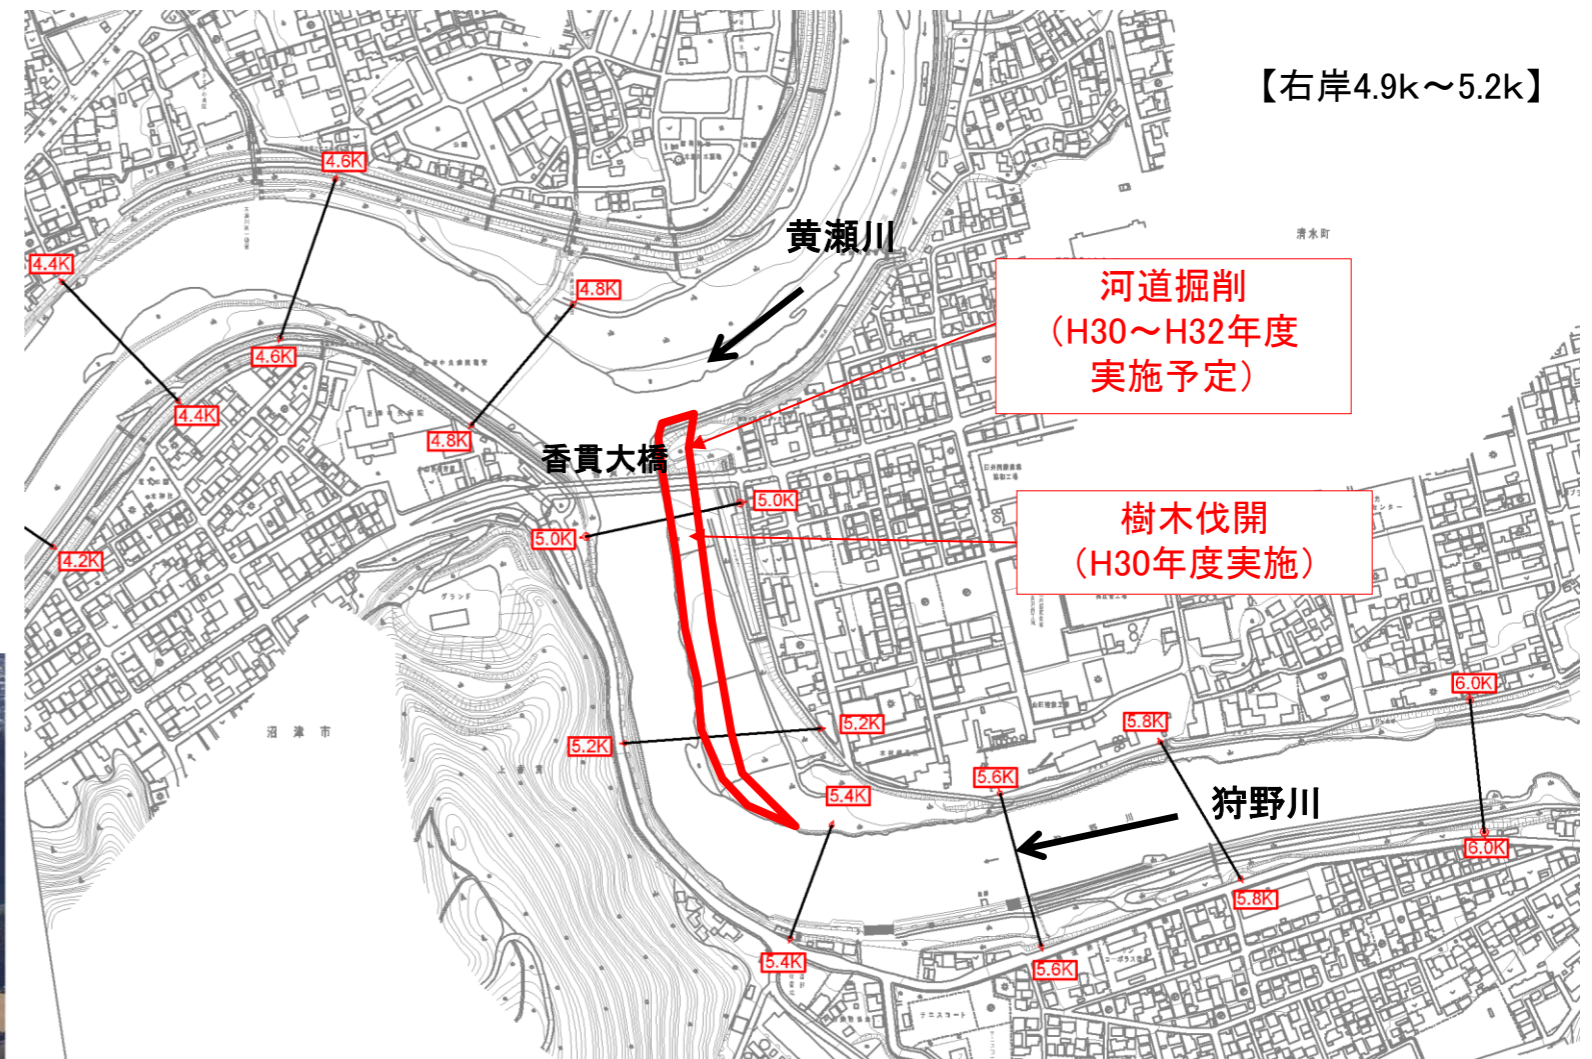


## ③ 長泉町本宿地区堤防整備状況(黄瀬川)


- ◆ 黄瀬川(駿東郡長泉町本宿地区)は、堤防高と断面が不足しているため、堤防整備と河道掘削等を実施
- ◆ 平成30年度は、堤防整備を実施



【左岸2.2k~2.4k】


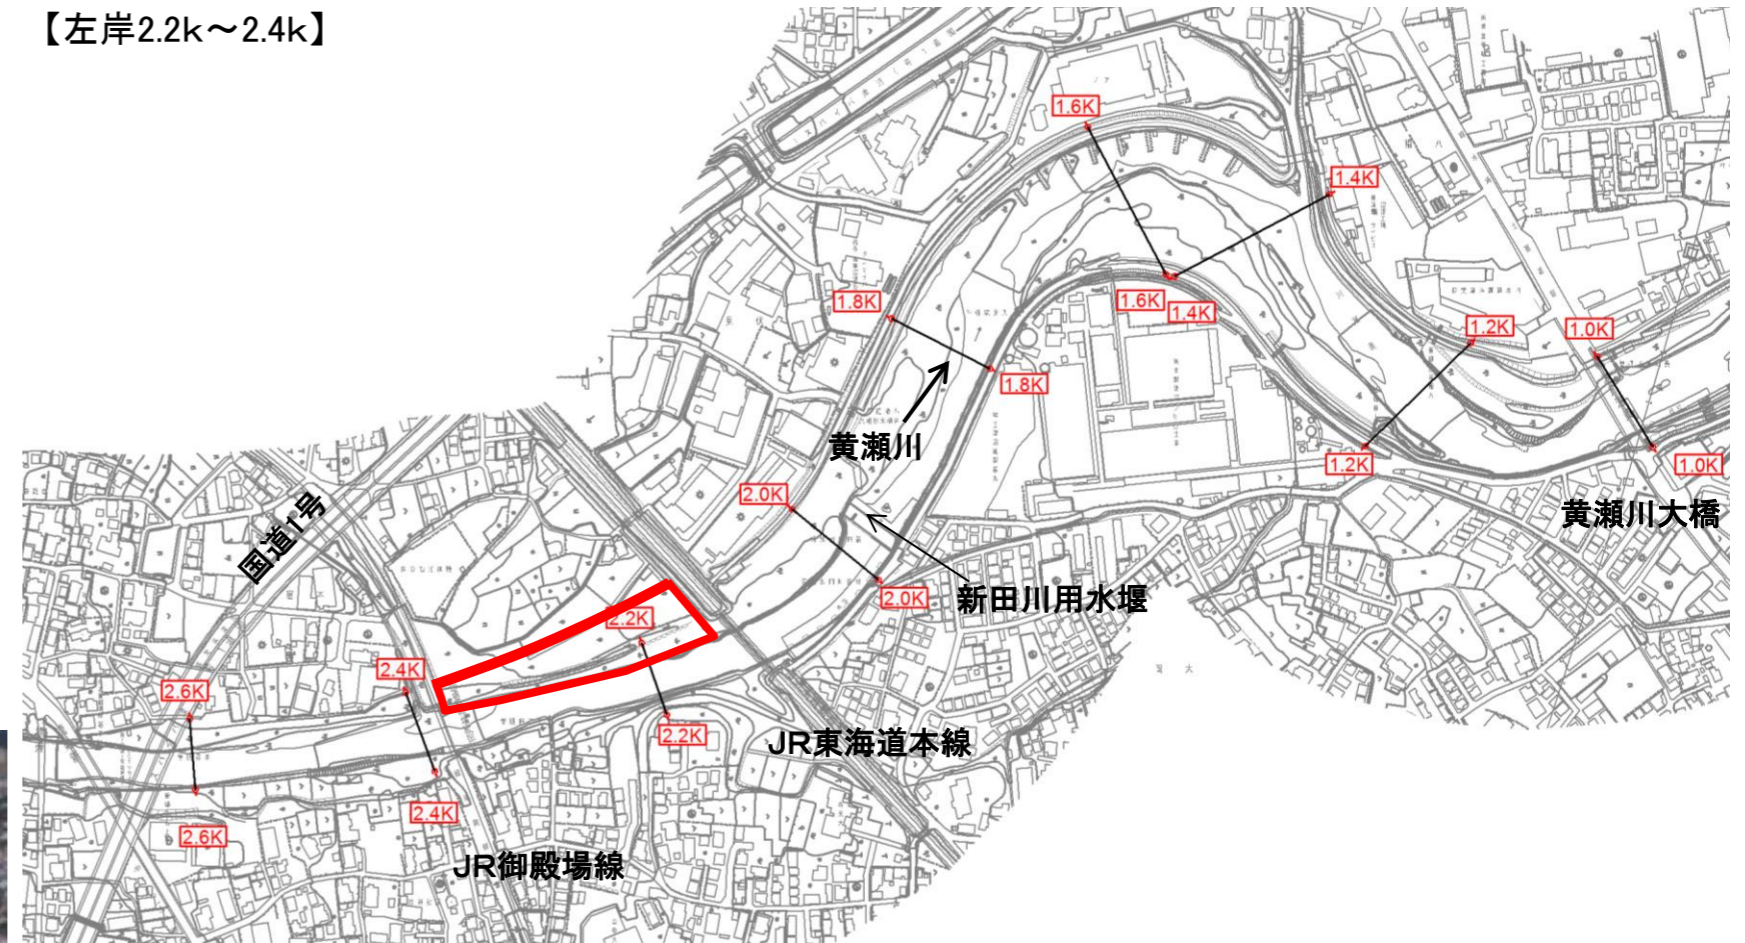


工事イメージ

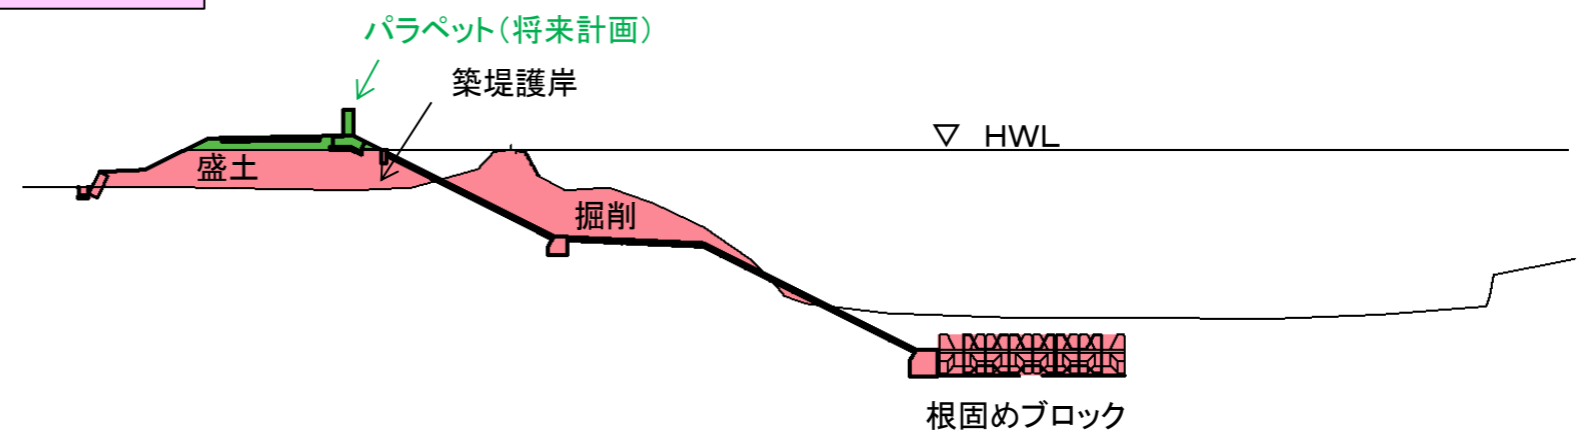

## ④ 沼津市下河原地区の堤防整備状況(狩野川)

- ◆ 沼津市下河原地区は、堤防高と断面が不足しているため、堤防整備を実施
- ◆ 平成30年度は、築堤護岸を実施

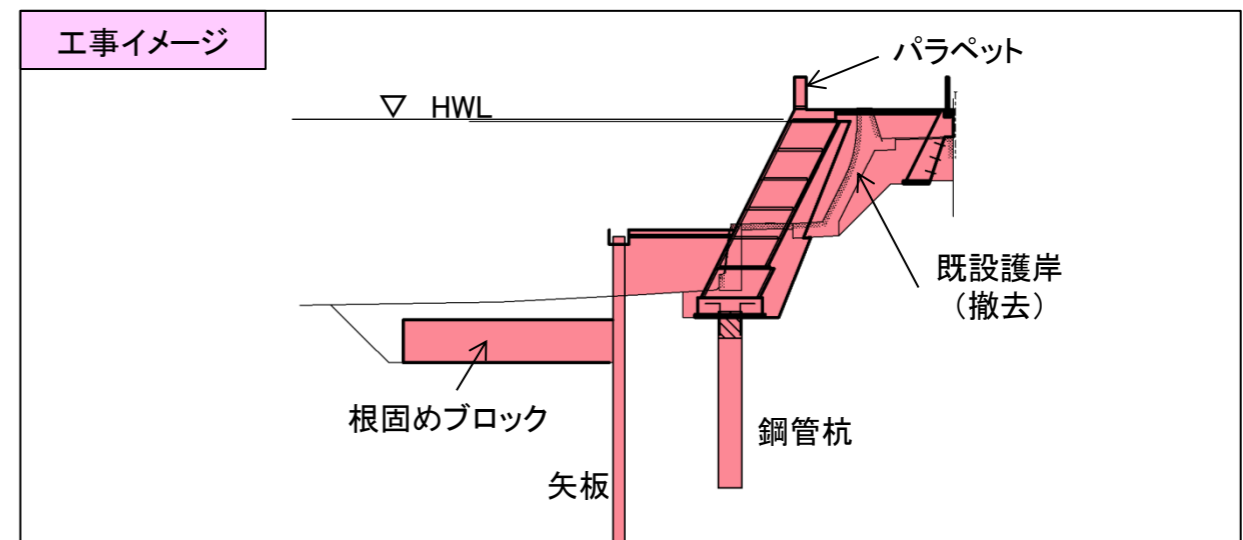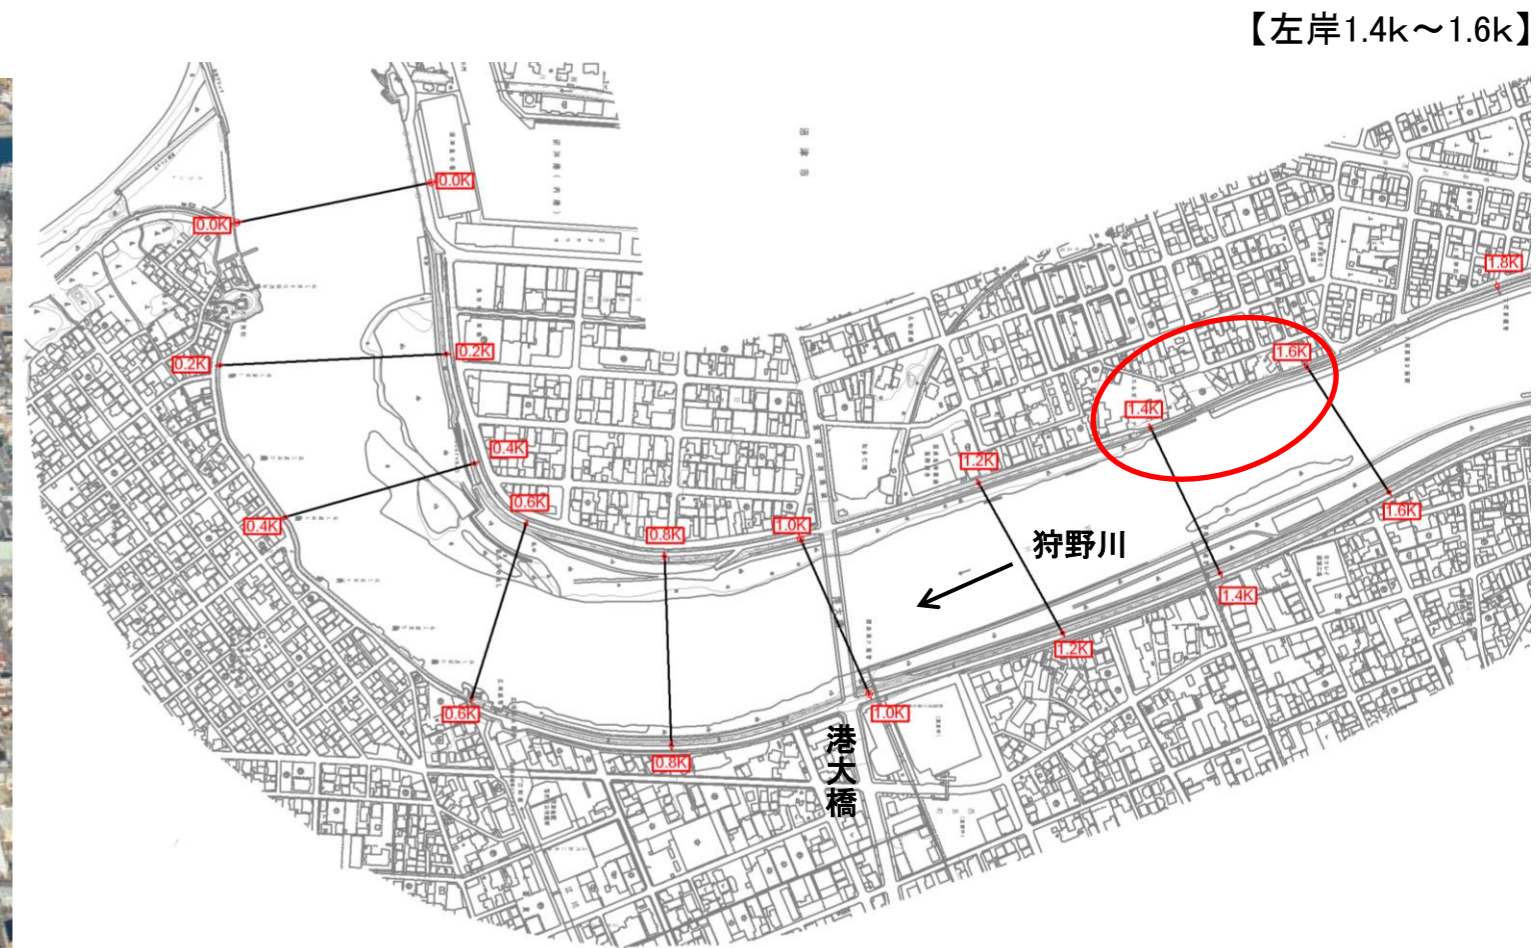

## 函南町塚本地区河川防災ステーション・かわまちづくり整備状況

- ◆ 函南町塚本地区河川防災ステーションは、災害が発生時の緊急復旧活動に必要な緊急用資材の備蓄、駐車場、ヘリポート等のほか、函南町が水防多目的センターを配置し、迅速かつ円滑な河川災害復旧活動の拠点を整備する計画
- ◆ 函南町塚本地区かわまちづくりは、「道の駅・川の駅」として連続した水辺空間を整備する事業であり、国が高水敷の整備を実施
- ◆ 平成30年度は、函南町が水防多目的センターの整備を実施



「水辺で乾杯！」



開催日時：平成29年7月7日(午後7時頃)
