



静清バイパス 清水立体 工事だより 第21号



【はじめに】
 清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
 今回(第21号)は、1月以降の各工事予定をお知らせします。
 現場では、橋の柱(橋脚)を作る工事で、夜間交通規制を伴う作業を引き続き行います。
 ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いします。



No15 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事

施工会社：鈴与建設(株) **新規工事**

工期：令和3年2月26日まで
 工事状況：清水IC西交差点西側に橋台、交差点付近では構造物をつくります。



着手前

No2 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋西下部工事

施工会社：静岡工業(株)

工期：令和2年7月6日まで
 工事状況：仮設工事は昨年末で完了し、1月より地盤を掘り下げる掘削作業を夜間に行っています。



P29橋脚 仮設工施工状況

No4 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋東下部工事

施工会社：(株)白鳥建設

工期：令和2年7月30日まで
 工事状況：基礎杭の工事が年内で完了し、1月より掘削作業を夜間作業にて進めています。




P26橋脚 場所打杭施工状況

No7 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋西下部工事

施工会社：木内建設(株)

工期：令和2年3月31日まで
 工事状況：P18橋脚は、12月にコンクリート打設完了しました。P19橋脚は1月から橋脚工事を進めています。



P18橋脚施工状況

No8 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋東下部工事

施工会社：木内建設(株)

工期：令和2年2月28日まで
 工事状況：1月からは橋脚を造り終え、埋戻しを行っています。




P13橋脚 埋戻し施工状況

No12 令和元年度 1号清水立体 尾羽地区舗装工事

施工会社：鈴与建設(株)

工期：令和2年3月27日まで
 工事状況：現在は尾羽地区の下り線において舗装工事を行っています。1月末の完了予定で、その後上り線の工事を開始していきます。




下り線尾羽地区 舗装施工状況

No13 令和元年度 1号清水立体 横砂地区舗装工事

施工会社：日本道路(株)

工期：令和2年3月27日まで
 工事状況：現在は横砂～尾羽地区の下り線において舗装工事を行っています。1月末の完了予定で、その後上り線の工事を開始していきます。



下り線横砂～尾羽地区 施工状況


No14 令和元年度 1号清水立体 整備工事

施工会社：花菱建設(株)

工期：令和2年2月28日まで
 工事状況：1月13日より順次、庵原交差点、庵原川橋の舗装を直していきます。



舗装修繕施工状況

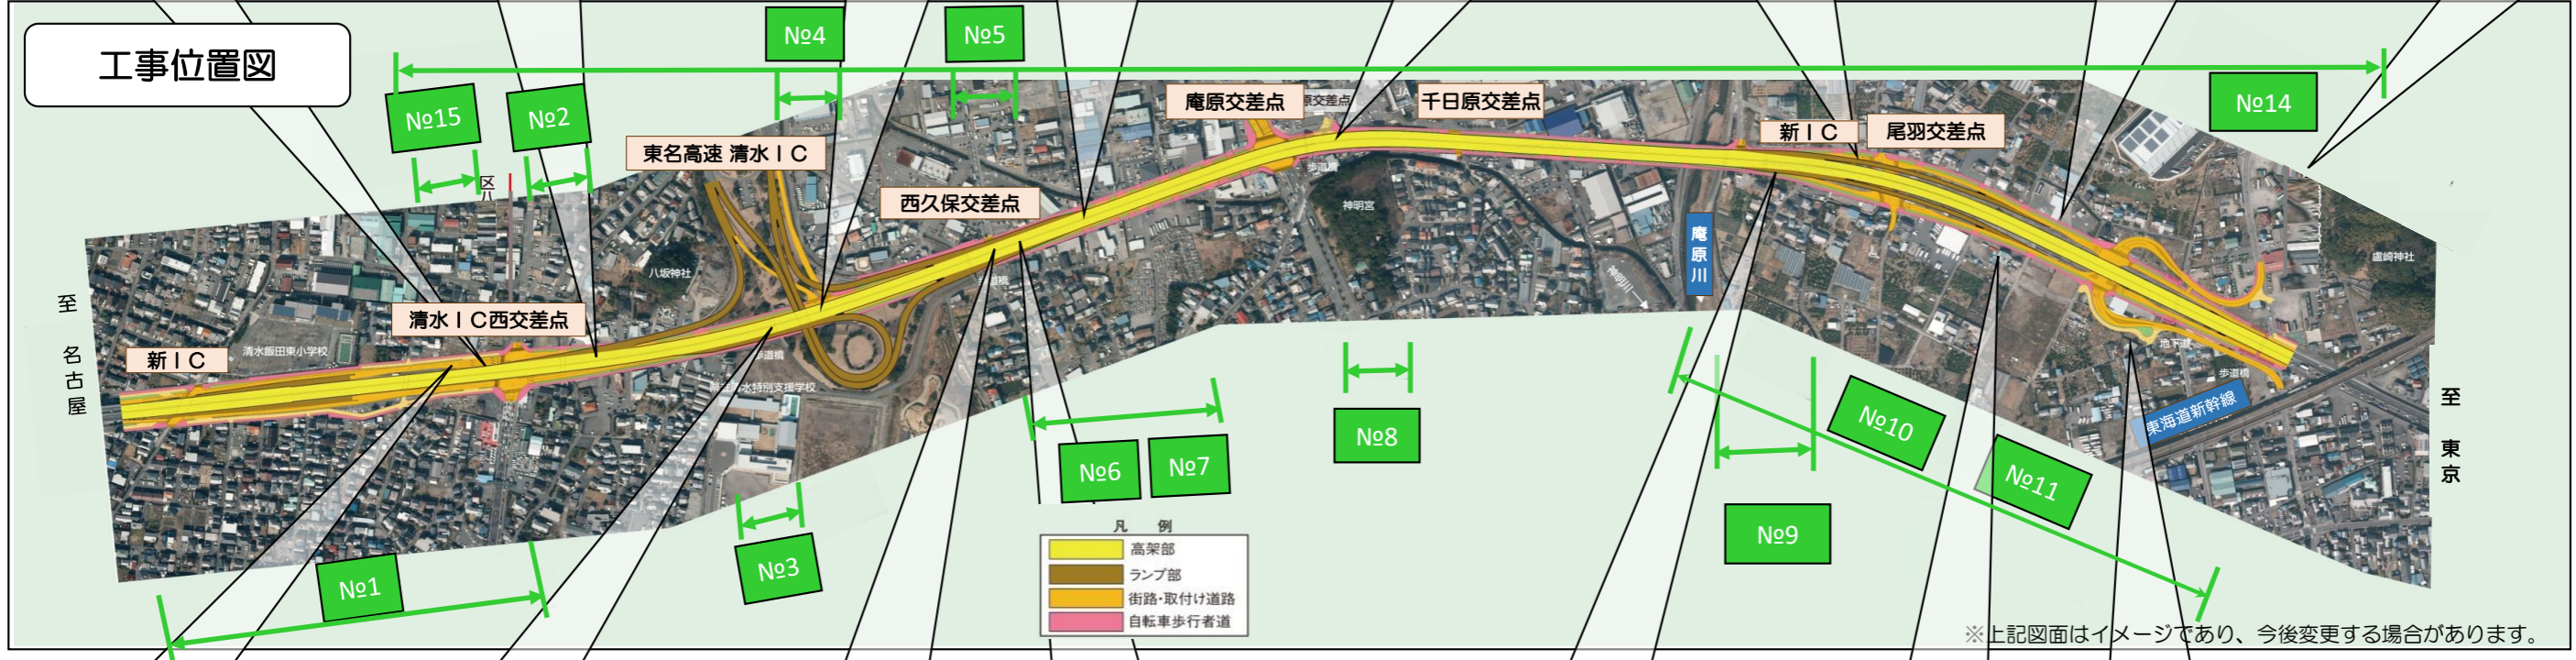

No1 平成30年度 1号静清BP 八坂丸子地区道路建設工事

施工会社：平井工業(株)

工期：令和2年3月31日まで
 工事状況：下り線副道の対面通行切替が完了し、下り線側道の整備を行っています。




下り線八坂地区 側道施工状況

No3 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋中下部工事

施工会社：五光建設(株)

工期：令和2年7月30日まで
 工事状況：基礎杭の工事が1月末で完了予定。その後、掘削作業を夜間にて進めています。



P27橋脚施工状況

No5 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事

施工会社：平井工業(株)

工期：令和2年7月30日まで
 工事状況：道路の地中に橋脚の基礎を作る時、道路を掘り下げるので、道路が崩れないための鉄の壁(矢板)を設置しています。




P22橋脚 鋼矢板施工状況

No6 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋中地区下部工事

施工会社：木内建設(株)

工期：令和2年3月31日まで
 工事状況：橋脚の基礎工事が完了しました。引き続き橋脚本体工事を行っています。




P20橋脚施工状況

No9 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事

施工会社：鈴与建設(株)

工期：令和2年3月30日まで
 工事状況：地中に埋設されていた国道横断水路の取り壊しが終わり、埋め戻しが完了。1月から夜間作業にて橋脚を地中で支える鋼管杭を打ち込みます。




P4橋脚部 水路取壊し完了状況

No10 平成30年度 1号清水立体 横砂尾羽地区道路建設工事

施工会社：平井工業(株)

工期：令和2年3月31日まで
 工事状況：下り線排水構造物が完了致しました。引き続き上り線の排水構造物を施工していきます。




下り線尾羽地区 排水構造物施工状況

No11 平成30年度 1号清水立体 横砂尾羽地区北舗装工事

施工会社：静岡工業(株)

工期：令和2年3月6日まで
 工事状況：1月から上り線で側溝を設置し、2月からは同じく上り線の舗装を行っています。



下り線横砂地区 排水構造物施工状況



静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和2年 1月
 清水監督官誌所
 TEL 054-250-8920
 編集：清水監督官誌所 清水立体安全協議会
 担当：平井工業(株) (植野 泰広)
