




# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第28号

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。  
今回（第28号）は、10月以降の工事予定をお知らせします。  
現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。  
引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

<p><b>No13</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：場所打杭の打設が完了し、9月下旬から10月末頃まで中央分離帯内で土留・仮締切工事を行います。夜間交通規制となり、ご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。</p>  <p>A2橋台施工状況</p>	<p><b>No15</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株)</p> <p>工期：令和3年3月26日まで 工事状況：場所打杭の施工が始まりました。引き続き夜間交通規制を行い、施工していきます。どうぞよろしくお願い致します。</p>  <p>場所打杭施工状況</p>	<p><b>No18</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事</p> <p>施工会社：あおみ建設(株)</p> <p>工期：令和4年2月28日まで 工事状況：清水ICにて、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。現在、本施工に向け、9月下旬から10月上旬にかけて工事用車両出入り口および伐採を行い、10月中旬ごろから道路土工の施工を行っていく予定です。</p>  <p>工事用車両乗入口施工状況</p>	<p><b>No12</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋南下部工事</p> <p>施工会社：佐藤鉄工(株)</p> <p>工期：令和3年1月29日まで 工事状況：鋼製橋脚の柱部の架設が終わり、現場溶接、中詰め根巻きコンクリートの施工を行っています。少し離れた中央分離帯内で梁部地組溶接を施工します。宜しくお願い致します。</p>  <p>P22橋脚 柱部架設完了</p>	<p><b>No11</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋西側架設工事</p> <p>施工会社：佐藤鉄工(株)</p> <p>工期：令和2年9月30日まで 工事状況：9月29日をもって、無事工事の完成を迎えることができました。皆様のご協力ありがとうございました。</p>  <p>P11-P13 橋脚 完成</p>	<p><b>No10</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋中側架設工事</p> <p>施工会社：瀧上工業(株)</p> <p>工期：令和2年9月30日まで 工事状況：9月29日をもって、無事工事完了を迎えることができました。皆様のご協力ありがとうございました。</p>  <p>P8-P10橋脚 完成</p>	<p><b>No9</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋東側架設工事</p> <p>施工会社：宮地エンジニアリング(株)</p> <p>工期：令和2年10月16日まで 工事状況：P5-P7橋脚において、10月上旬で無事工事完了を迎えることが出来ました。皆様のご協力ありがとうございました。</p>  <p>P5-P7橋脚 完成</p>	<p><b>No22</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋西下部工事</p> <p>施工会社：平井工業(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：A2橋台において鋼矢板による仮締切工事を行います。矢板の打設完了後、掘削していきます。一部矢板打込の際に夜間施工となりますが安全に十分注意して作業いたします。宜しくお願い致します。</p>  <p>A2橋台鋼矢板打設状況</p>	<p><b>No23</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋東下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：現在、A1橋台において仮設工が終わり引き続き掘削作業を行います。横砂アンダーではボックスの設置が完了しました。</p>  <p>横砂アンダーボックス状況</p>
--	---	--	--	--	---	--	---	---

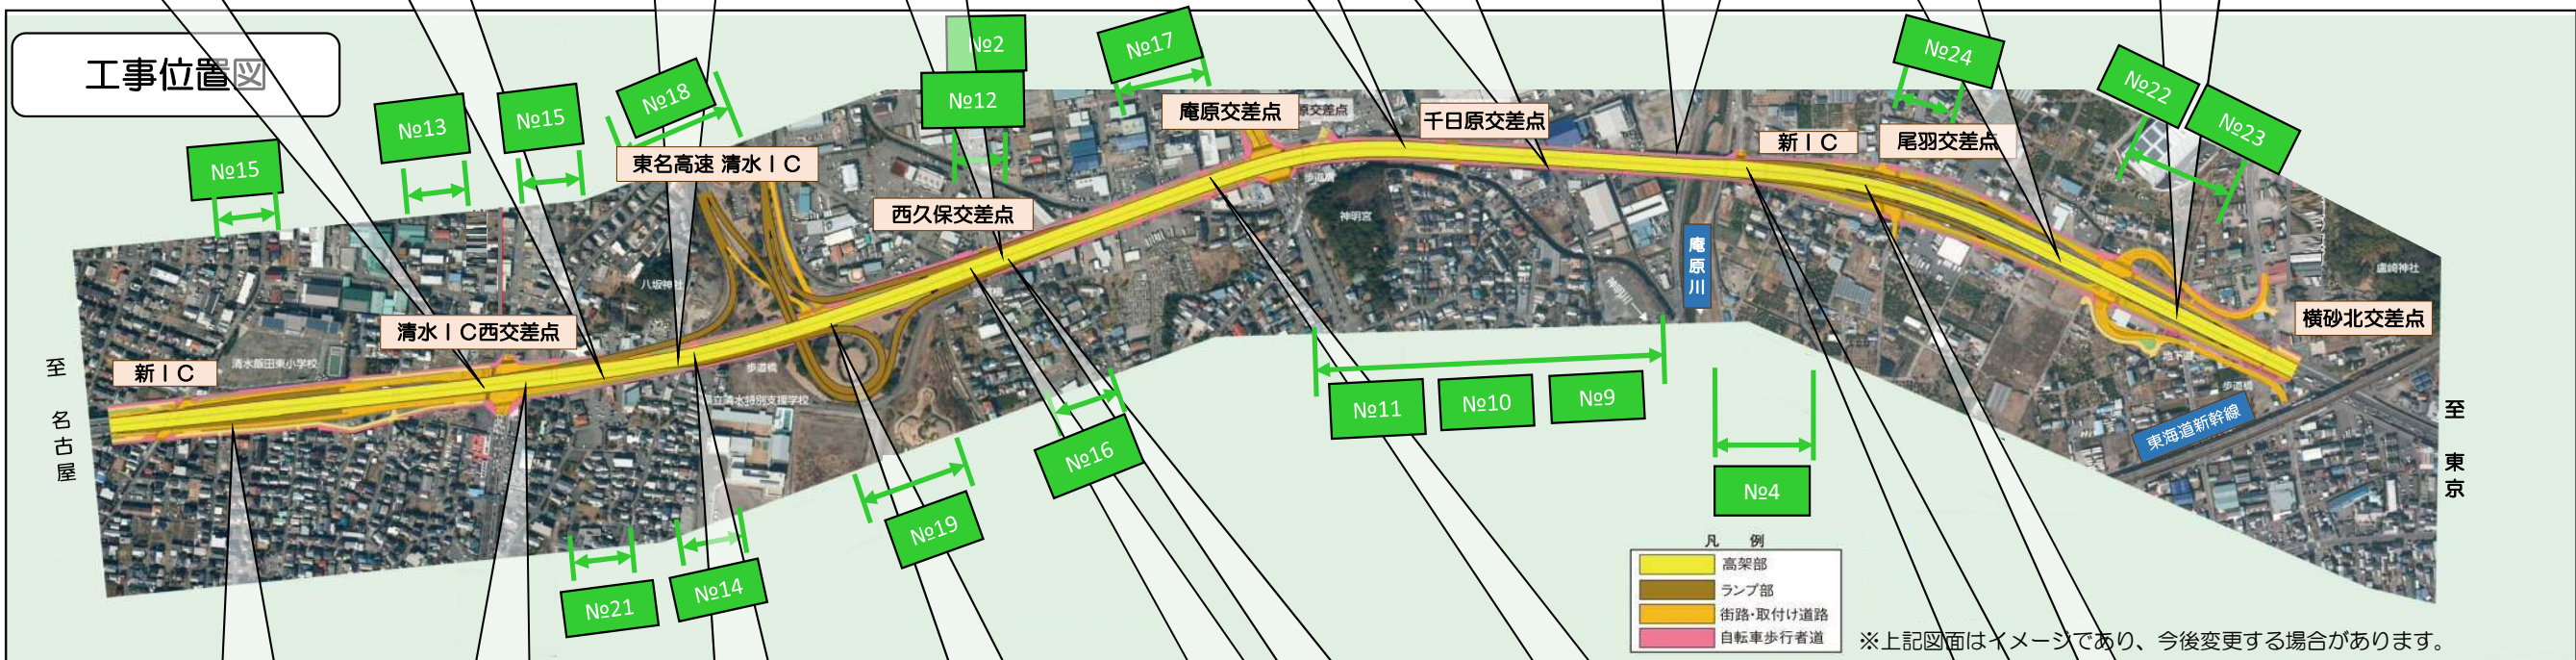

<p><b>No15</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株)</p> <p>工期：令和3年3月26日まで 工事状況：現在、上り線の側道橋の撤去に続き、橋台の撤去作業を行っています。この作業は10月末に終了する予定です。</p>  <p>上り線側道 橋台撤去状況</p>	<p><b>No21</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株)</p> <p>工期：令和3年3月26日まで 工事状況：P32橋脚の鋼矢板打設にて締切り作業を進めています。</p>  <p>P32橋脚 鋼矢板打設状況</p>	<p><b>No14</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事</p> <p>施工会社：木内建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：P28橋脚の工事に着手しました。</p>  <p>P28工事着手</p>	<p><b>No19</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事</p> <p>施工会社：名工建設(株)</p> <p>工期：令和4年2月28日まで 工事状況：本工事着手に向け、1号線に接続する工事用道路を造成中です。歩道迂回等、ご迷惑をおかけしておりますが、ご協力お願いします。</p>  <p>工事用道路造成中</p>	<p><b>No2</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事</p> <p>施工会社：平井工業(株)</p> <p>工期：令和2年9月30日まで 工事状況：9月29日をもって無事工事の完成を迎える事ができました。皆様のご協力ありがとうございました。</p>  <p>P22橋脚 完成</p>	<p><b>No16</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋東下部工事</p> <p>施工会社：五光建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：仮設工の施工中となります。10月初旬より基礎杭の施工予定です。</p>  <p>P21橋脚 仮設工施工中</p>	<p><b>No17</b> 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事</p> <p>施工会社：静鉄建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：鋼管杭の打込みを9月14日より開始しました。打込み完了は10月20日ごろとなります。完了後、覆工板の設置を再度行い、掘削作業に入っていきます。</p>  <p>P17橋脚 鋼管杭 施工状況</p>	<p><b>No4</b> 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株)</p> <p>工期：令和2年12月25日まで 工事状況：10月上旬にP3橋脚の柱部2回目のコンクリート打設を行います。これで橋脚の施工は完了になり、10月下旬より足場解体→埋戻しを行い工事完了となります。</p>  <p>P3橋脚 現況(柱部施工状況)</p>	<p><b>No24</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株)</p> <p>工期：令和3年2月26日まで 工事状況：掘削が終わりその後、場所打杭の杭頭処理が終了しました。10月からは橋脚部分の施工（鉄筋組立→型枠組立→コンクリート打設）を行っていきます。</p>  <p>P1本線およびONランプ杭頭処理完了時</p>
---	---	---	---	--	---	---	---	---

静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizuku/>

令和2年 10月  
清水監督官話所  
TEL 054-250-8920  
編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会  
担当：佐藤鉄工(株) (山田 浩之)
