




# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第29号



【はじめに】  
 清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。  
 今回（第29号）は、11月以降の工事予定と交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。  
 現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。  
 引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。



<b>No29</b> 令和2年度 1号清水立体 飯田地区西道路建設工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和4年1月31日まで 工事状況：ヤード内の緑石およびフェンスの撤去が完了し、11月から上り線側の副道の通行止め規制を行い、植栽等の撤去を行います。終日規制となりご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。  フェンス・緑石撤去状況	<b>No27</b> 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：高橋建設(株) 工期：令和4年1月31日まで 工事状況：杭工事の準備および事前調査中です。  準備中	<b>No32</b> 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋OFFランプ 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年11月30日まで 工事状況：現在の残土撤出作業を行っています。本工事（上りランプP1~7橋脚）は未着手です。  着手前	<b>No13</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年3月31日まで 工事状況：夜間での鋼矢板打設が完了し、10月下旬からA2橋台の掘削作業を行います。当分は規制を伴わない昼間作業になります。宜しくお願い致します。  A2橋台施工状況	<b>No6</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋西下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月26日まで 工事状況：P29橋脚において橋脚基礎の場所打ち杭工の施工が終了し、工事は完了しました。ご協力ありがとうございました。  場所打杭施工状況	<b>No18</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事 施工会社：あおみ建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：清水ICにて、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。現在、工事用車両出入口及び伐採工が完了し、11月上旬頃から道路土工の施工を行う予定です。また、11月中旬に清水IC横の市道を通行止めさせていただく予定となっております。ご不便をおかけして申し訳ございませんがご理解ご協力宜しくお願い致します。  工事用車両乗入口完了	<b>No12</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋橋下部工事 施工会社：佐藤鉄工(株) 工期：令和3年1月29日まで 工事状況：鋼製橋脚の柱部の現場溶接、根巻きコンクリートを終え、11月より覆工板鋼矢板撤去、舗装復旧を行います。少し離れた中央分離帯内で梁部地組溶接、塗装を施工します。宜しくお願い致します。  P22橋脚 柱部根巻きコンクリート完了	<b>No22</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋西下部工事 施工会社：平井工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：夜間施工において、鋼矢板打設が完了し、掘削作業も完了致しました。11月からは、本体工事（鉄筋、型枠）を行ってまいります。  A2橋台掘削完了	<b>No23</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：A1橋台において杭頭処理が完了し引き続き底版の施工を進めていきます。横砂アンダーはカルバートの設置が完了し、今後踏掛版を施工してまいります。  A1橋台杭頭処理完了
--	--	--	---	--	---	---	---	---

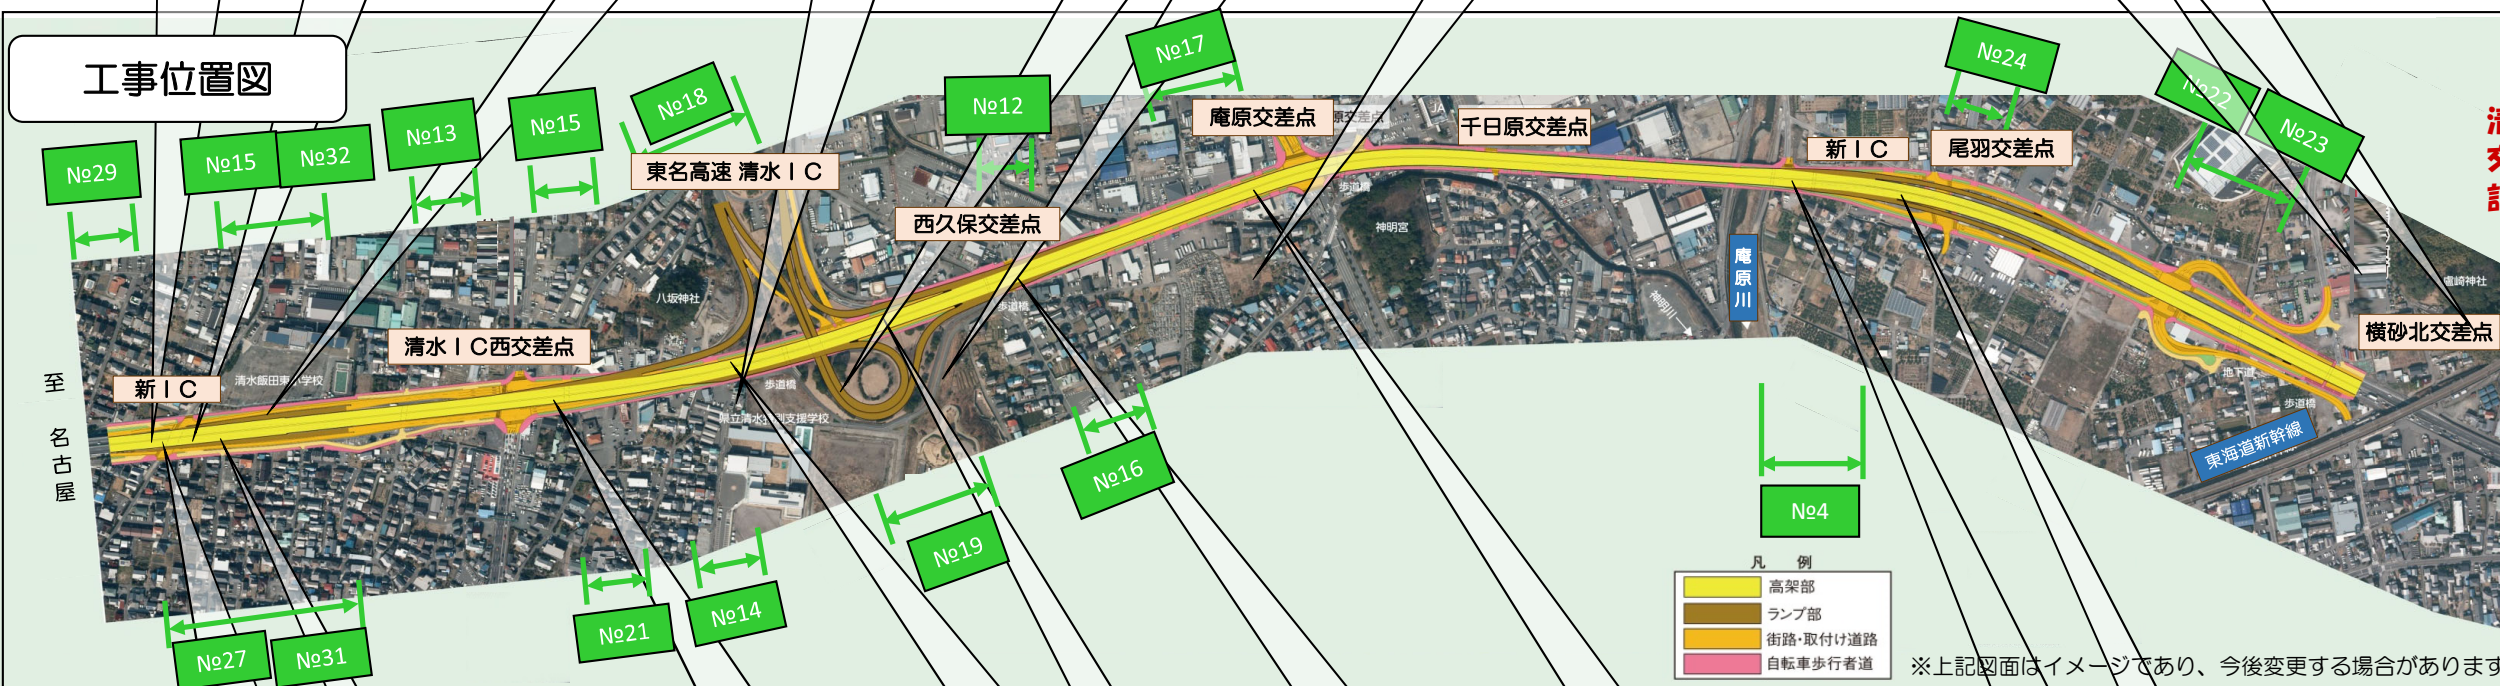

清水立体11月・12月の交通規制案内を裏面に記載しています。

※上記図面はイメージであり、今後変更する場合があります。

<b>No31</b> 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋ONランプ 施工会社：(株)橋本組 工期：令和3年11月30日まで 工事状況：現在、準備工にて橋脚毎のジャストポイントでの追加ボーリング調査をヤード内にて実施しています。  準備工	<b>No15</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋橋下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月26日まで 工事状況：10月末で上り線側の既設橋台の撤去作業が無事に終了しました。11月上旬より、P30橋脚において構造物の撤去作業を進めていきます。  上り線側道 橋台撤去状況	<b>No21</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月26日まで 工事状況：P32橋脚の掘削作業を開始します。年内には掘削完了し、橋脚躯体工に移ってまいります。  P32橋脚 鋼矢板打設状況	<b>No14</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：P28橋脚の仮設工にて鋼矢板を打設しております。引き続き夜間交通規制での作業となります。ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願い致します。  P28橋脚 鋼矢板打設状況	<b>No19</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：1号線に接する工事用道路を造成中です。11月中旬より、東京方面流出路の切廻し道路を施工します。  工事用道路造成中	<b>No16</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：仮設工の施工中となります。P21橋脚 11月初旬より基礎杭の施工に入ります。  P21橋脚 基礎杭施工中	<b>No17</b> 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事 施工会社：静鉄建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：鋼管杭の打込みは、10月20日に無事終了しました。11月からは、下り線の覆工板の設置を行った後、橋脚部分の掘削作業に入っていきます。  P17橋脚 鋼管杭 施工状況	<b>No4</b> 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和2年12月25日まで 工事状況：10月下旬~11月中旬にかけてP3橋脚の埋戻し作業を行い、全工程が完了いたします。最後まで無事故無災害で工事を進めてまいります。  P3橋脚 現況(埋戻し前)	<b>No24</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：10月で3橋脚すべての底版の打設が終了しました。11月には柱部分までのコンクリート打設を行い、足場の解体までを11月中に予定しています。  P1本線およびONランプ杭頭処理完了時
--	---	---	--	---	---	---	---	--

静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和2年 11月  
 清水監督官事務所  
 TEL 054-250-8920  
 編集：清水監督官事務所 清水立体安全協議会  
 担当：鈴与建設(株) (柴田 倫樹)
