

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路(川合工区)かわら版


発行第68号  
(平成27年11月1日)  
責任者:安全協議会  
株安藤・間  
上林 凡人  
TEL 053-965-0685

## ① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

**工事概要** 佐久間第2トンネル(浦川~川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

**進捗状況** トンネル坑口部の掘削と、トンネルずりの判定、運搬を行っています。10/26時点進捗:138.0m(上半)/2.408m

トンネル坑口

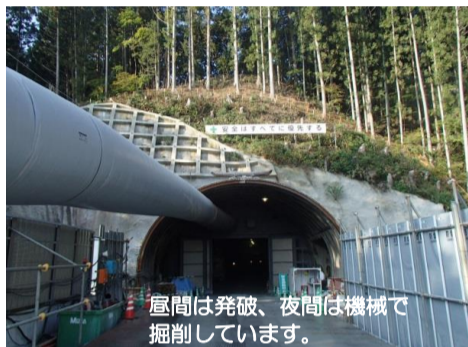

昼間は発破、夜間は機械で掘削しています。

トンネルずり判定場



判定結果により運搬先を決定しています。

## ② 平成26年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 間淵 053-965-1370

**工事概要** 佐久間道路橋梁の橋台・橋脚、佐久間IC(仮称)の盛土を行います。

**進捗状況** 橋脚深礎杭及び橋台掘削を施工しています。佐久間IC(仮称)は引き続き盛土を行っています。

川合2号橋 橋台背面



橋脚

橋台

佐久間IC(仮称)



## ③ 平成26年度 佐久間道路川合地区下部工事 中村建設(株)松永 053-965-0082


**工事概要** 佐久間道路橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

**進捗状況** 1号橋は深礎杭の施工を行っています。  
2号橋は深礎杭の施工を行っています。  
2号橋仮橋撤去・移設は10月中旬に施工が終わりました。

川合1号橋深礎杭進捗状況



川合2号橋仮橋進捗状況

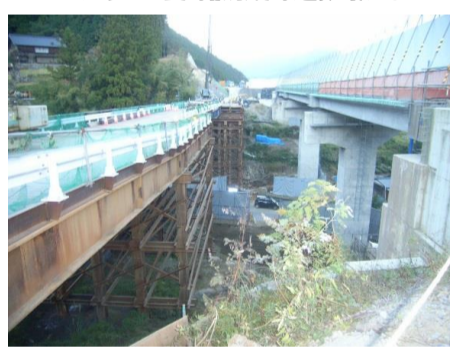

## ④ 平成27年度 佐久間道路川合地区整備工事 中村建設(株)清水 053-965-0082

**工事概要** 佐久間IC(仮称)付近の道路改良工事を行います。

**進捗状況** BOX周辺にて排水工事等を引き続き行います。11月中旬に規制切り換えを予定しています。  
11月初旬より佐久間川合24号線の規制工事を行います。  
国道473号線 切土・盛土完了 佐久間川合24号線 規制工事

終点から起点を望む



新設側溝

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業  
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。  
ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>
