

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路 (東栄工区) かわら版


発行第56号
 (平成26年11月1日議会)
 株中村組
 富士見 飛鳥
 TEL0536-76-1375

① 平成24年度 三遠道路1号橋西下部工事 藤城建設(株) 伊興田 0536-76-0097

工事概要 国道474号(三遠道路)において、橋梁の橋脚を作る工事を行います。

進捗状況 10月末現在で橋脚の柱部分が完成しております、11月に梁部のコンクリートを打設し橋脚は完成する予定です。

施工箇所全景

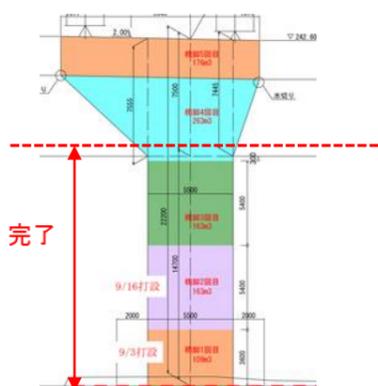

② 平成24年度 三遠道路1号橋東下部工事 鈴木工業(株) 細井 0536-76-1701

工事概要 東栄地区において国道151号と奈根川に架かる三遠道路の橋梁の橋脚を造る工事を行います。

進捗状況 現在、深礎工がほぼ完了し11月より橋脚の施工(足場、鉄筋、型枠、コンクリート)を行っていきます。

P2橋脚施工箇所(南→北)



深礎工施工箇所



③ 平成25年度 三遠道路三輪地区工事用道路建設工事 (株)中村組 土屋 0536-76-1375

工事概要 三遠道路において、トンネル工事に必要な工事用道路を作る工事を行います。

進捗状況 現在、3号トンネル坑口に向けて仮橋を築造しています。11月下旬には本工事施工範囲の仮橋が完了する予定です。

施工箇所(町道から撮影)



施工箇所(起点側から撮影)



④ 平成26年度 佐久間・三遠道路東栄地区整備工事 (株)中村組 富士見 0536-76-1375

工事概要 三遠道路において、トンネル工事に必要な工事用道路を作る工事を行います。

進捗状況 現在、12月上旬の仮橋着手に向けて現地調査を実施しています。

仮橋施工予定箇所(起点側から撮影)



仮橋施工予定箇所(トンネル坑口側から撮影)




⑤ 平成26年度 三遠道路4号橋下部工事 (株)中村組 新野 0536-76-1375

工事概要 三遠道路において、本線4号橋(仮称)の下部工を施工します。

進捗状況 現在準備中です。

施工箇所
 (西側から撮影)

※3号トンネルと4号トンネルの間に深谷川をまたぐ橋梁(下部工-橋台、橋脚)を築造します。

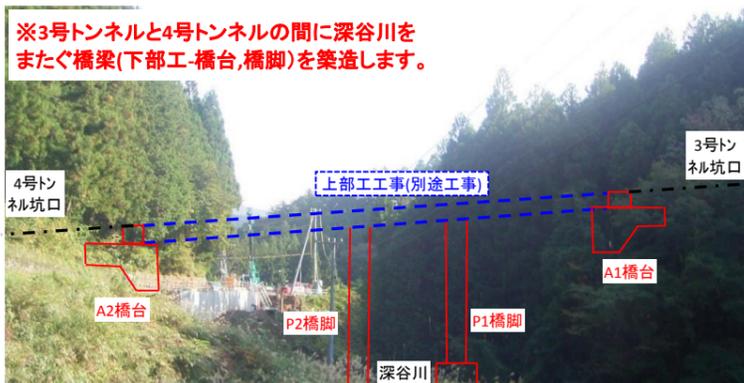

位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
 【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】
