



静清バイパス 清水立体 工事だより 第20号



【はじめに】
 清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
 今回(第20号)は、11月以降の各工事予定をお知らせします。
 現場では、橋の柱(橋脚)を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行います。
 ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いします。



No2 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋西下部工事
 施工会社：静和工業(株)
 工期：令和2年3月30日まで
 工事状況：丸ノコを使って鋼矢板(鉄板)を地中に圧入する施工を行います。



P29橋脚

No4 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋東下部工事
 施工会社：(株)白鳥建設
 工期：令和2年3月30日まで
 工事状況：11月は橋脚基礎杭を施工します。



P26橋脚

No5 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事
 施工会社：平井工業(株)
 工期：令和2年3月30日まで
 工事状況：既設水路の取壊しを行いました。11月より仮設工(掘削する為の土留め)を行います。



P22橋脚

No7 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋西下部工事
 施工会社：木内建設(株)
 工期：令和2年3月30日まで
 工事状況：P18橋脚の掘削作業を完了し、鉄筋コンクリート工事を進めています。



P18橋脚

No8 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋東下部工事
 施工会社：木内建設(株)
 工期：令和2年2月28日まで
 工事状況：橋脚下部工の柱部分を作っています。



P13橋脚

No9 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事
 施工会社：鈴与建設(株)
 工期：令和2年3月30日まで
 工事状況：構造物撤去工を行っています。11月から夜間施工となります。



P3、P4橋脚

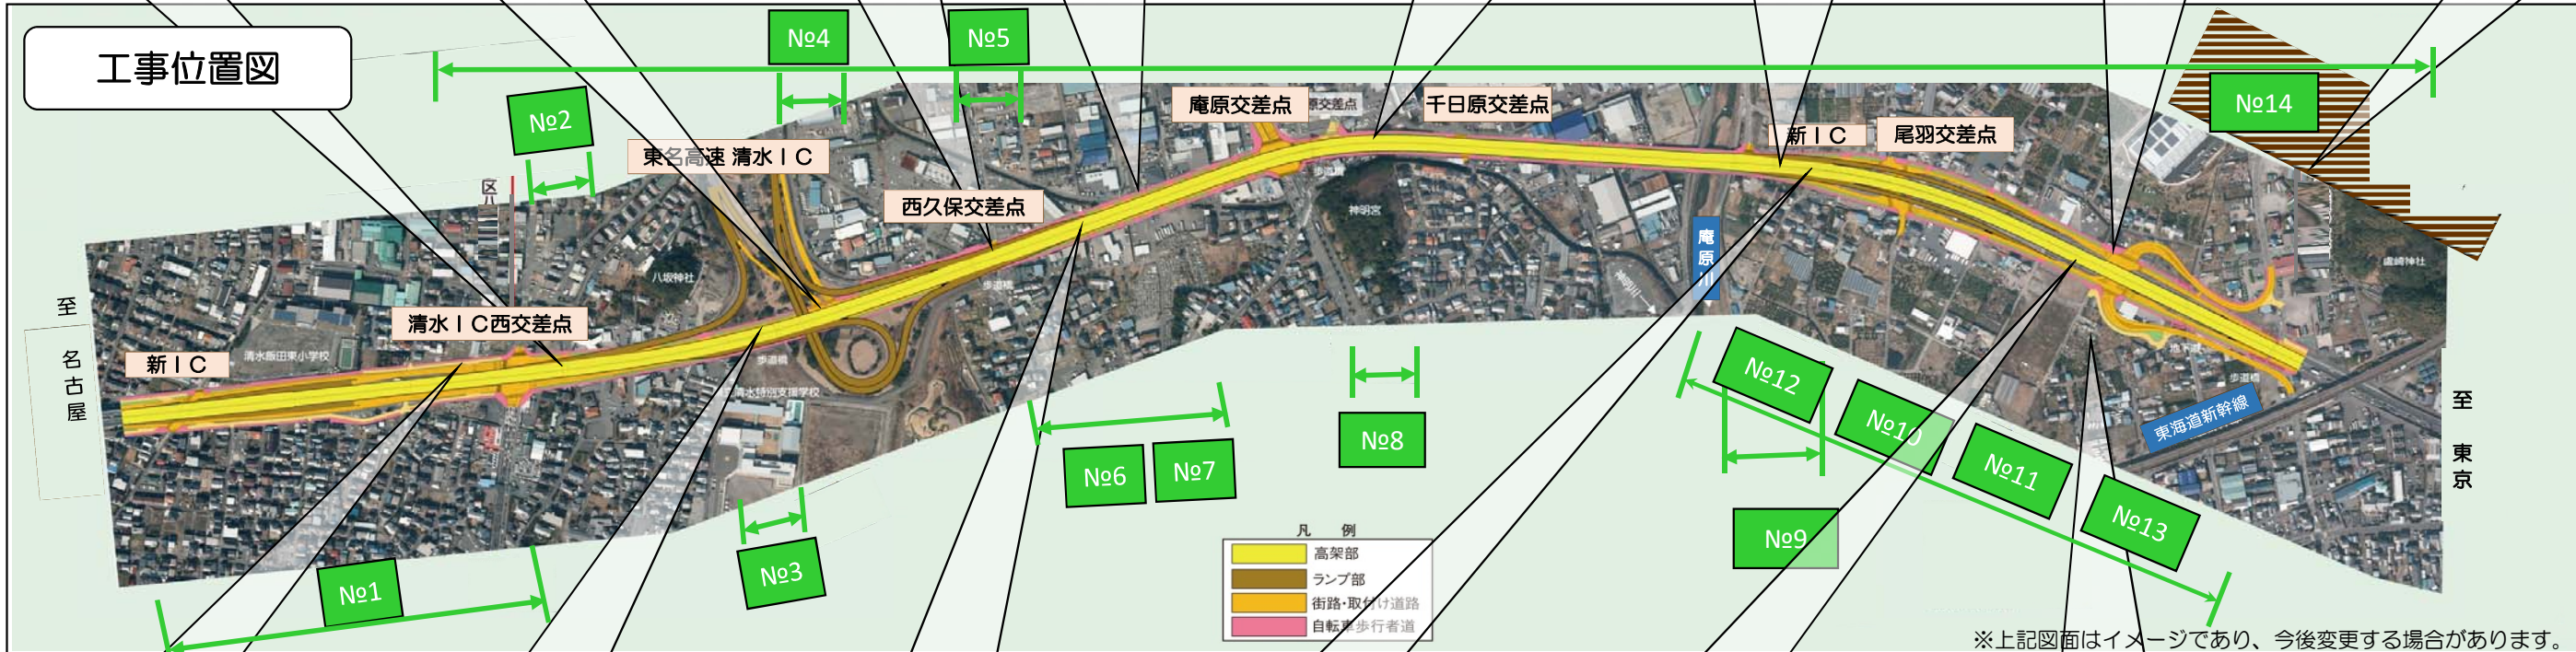
No10 平成30年度 1号清水立体 横砂尾羽地区道路建設工事
 施工会社：平井工業(株)
 工期：令和2年3月31日まで
 工事状況：上下線の擁壁を施工しています。11月より尾羽歩道橋の撤去を行います。



上り線 擁壁 施工状況

No14 令和元年度 1号清水立体 整備工事
 施工会社：花菱建設(株)
 工期：令和2年2月28日まで
 工事説明：清水立体工区 延長2.4Km 区間の立体化工事のため、道路を整備します。

現場代理人：西村 武之

No1 平成30年度 1号静清BP 八坂丸子地区道路建設工事
 施工会社：平井工業(株)
 工期：令和元年12月20日まで
 工事状況：地盤改良工を行なっています。



下り線 施工状況

No3 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋中下部工事
 施工会社：五光建設(株)
 工期：令和2年3月30日まで
 工事状況：仮設工(路面覆工)を行っています。11月より橋脚の基礎杭を施工します。



P27橋脚


No6 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋中地区下部工事
 施工会社：木内建設(株)
 工期：令和元年12月5日まで
 工事状況：仮設工(鋼矢板の打込み)、橋脚基礎の杭打ちをしています。



P20橋脚


No12 令和元年度 1号清水立体 尾羽地区舗装工事
 施工会社：鈴与建設(株)
 工期：令和2年3月27日まで
 工事説明：尾羽交差点から庵原川東側までの範囲で、上下線において舗装工を行います。下り線から順次施工してまいります。

現場代理人 平野 隼斗




No13 令和元年度 1号清水立体 横砂地区舗装工事
 施工会社：日本道路(株)
 工期：令和2年3月27日まで
 工事説明：横砂北交差点～尾羽交差点間の街路部(歩道・自転車道・車道)を舗装する工を行います。

現場代理人：宗末 正剛



No11 平成30年度 1号清水立体 横砂尾羽地区北舗装工事
 施工会社：静和工業(株)
 工期：令和2年3月6日まで
 工事状況：11月は下り線側で舗装を行います。上り線では側溝や集水桝を作ります。



下り線 舗装工 施工状況



静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和元年 11月
 清水監督官詰所
 TEL 054-250-8920
 編集：清水監督官詰所 清水立体安全協議会
 担当：平井工業(株) (秋本 謙太)
