




静清バイパス 清水立体 工事だより 第24号

【はじめに】
 清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
 今回（第24号）は、6月以降の工事予定をお知らせします。
 現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。
 また、7月には橋の桁（鋼製梁）架け工事で庵原交差点～横砂北交差点付近の区間において、1週間程度の夜間対面通行を予定しております。
 引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。



<p>No13 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：清水IC西の地下道の通行止めを解除しました。6月～7月にかけて車線を清水IC西交差点付近の歩道側に切り替える工事を行います。</p>  <p>歩道PC桁架設完了</p>	<p>No6 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋西下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株) 工期：令和2年7月6日まで 工事状況：橋脚の工事を進めています。</p>  <p>P29橋脚施工状況</p>	<p>No18 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事</p> <p>施工会社：あおみ建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：東名清水IC西側で、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。たがいま工事を進めるための準備中です。</p>  <p>着手前</p>	<p>No5 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋東下部工事</p> <p>施工会社：(株)白鳥建設 工期：令和2年7月30日まで 工事状況：橋脚基礎基礎のコンクリート打設が完了しました。今後は柱の施工を進めていきます。</p>  <p>P26橋脚施工状況</p>	<p>No1 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋西下部工事</p> <p>施工会社：木内建設(株) 工期：令和2年6月30日まで 工事状況：覆工板撤去が完了しました。6月中旬に舗装復旧工事を行います。</p>  <p>P19・P20 覆工板撤去完了</p>	<p>No11 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋西側鋼製梁工事</p> <p>施工会社：佐藤鉄工(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P11～P13橋脚において、工場で製作した鋼製梁のピースを連結して溶接作業を行っています。大型クレーンを使用して既存のコンクリート支柱の上に乗せる作業を行います。</p>  <p>P11-P13地組立状況</p>	<p>No10 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋中側鋼製梁工事</p> <p>施工会社：瀬上工業(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P8～P10橋脚において、工場で製作した鋼製梁のピースを連結して溶接作業を行っています。大型クレーンを使用して既存のコンクリート支柱の上に乗せる作業を行います。</p>  <p>P9地組立状況</p>	<p>No9 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋東側鋼製梁工事</p> <p>施工会社：空地エンジニアリング(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P5～P7橋脚において、工場で製作した鋼製梁のピースを連結して溶接作業を行っています。大型クレーンを使用して既存のコンクリート支柱の上に乗せる作業を行います。</p>  <p>P5-P7地組立状況</p>	<p>No8 令和元年度 1号清水立体 尾羽地区舗装工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和2年6月30日まで 工事状況：5月15日に歩道橋撤去が完了しました。現在は、尾羽交差点の舗装工事を行っています。今後は尾羽交差点内の歩道整備を行います。</p>  <p>尾羽歩道橋撤去状況</p>	<p>No23 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋東下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：新しい横砂交差点(仮称)東側に橋台と堀切及び横砂アンダーボックスを設置します。6月下旬より工事着手します。</p>  <p>着手前</p>	<p>No7 令和元年度 1号清水立体 横砂地区舗装工事</p> <p>施工会社：日本道路(株) 工期：令和2年6月30日まで 工事状況：すべての工事が完了しました。ご協力ありがとうございました。</p>  <p>下り線施工状況</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

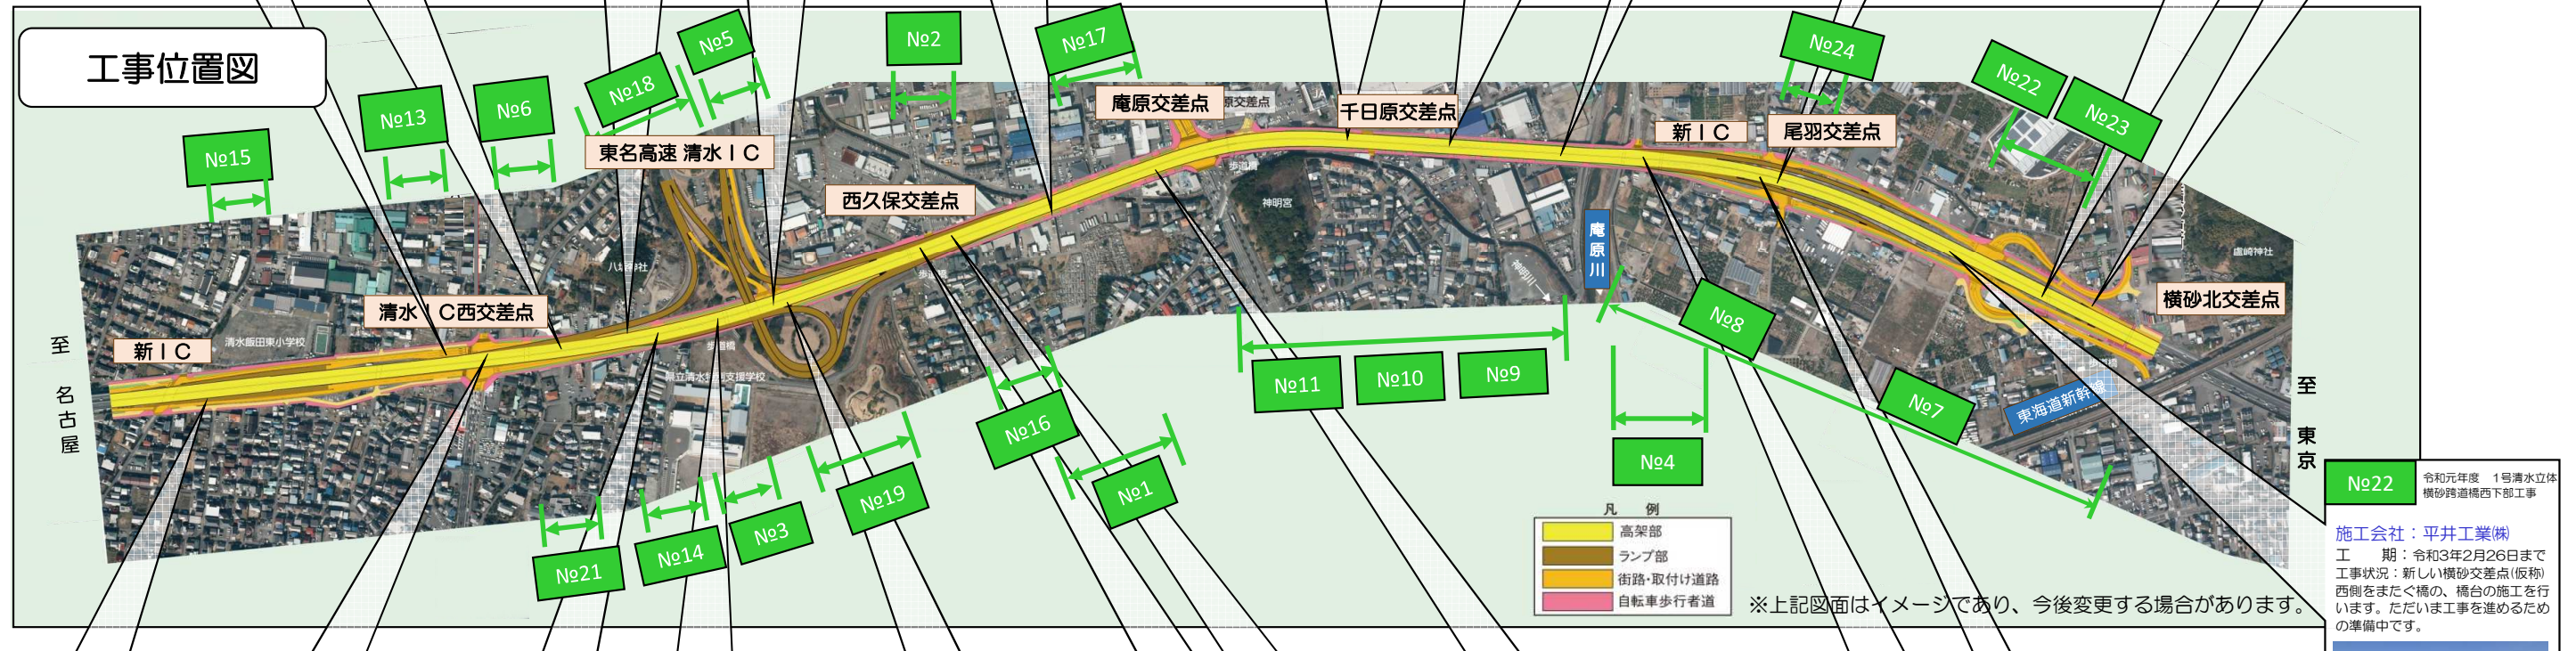

<p>No15 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：5月11日より側道橋の取壊しに伴う準備作業に着手しました。6月下旬より取壊しを行う予定です。</p>  <p>上り線側道橋下基礎施工状況</p>	<p>No21 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事</p> <p>施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月26日まで 工事状況：P31・P32橋脚の施工を行います。たがいま工事を進めるための準備中です。</p>  <p>着手前</p>	<p>No14 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下下部工事</p> <p>施工会社：木内建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：P28橋脚の施工を行います。たがいま工事を進めるための準備中です。</p>  <p>着手前</p>	<p>No3 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋中下部工事</p> <p>施工会社：五光建設(株) 工期：令和2年7月30日まで 工事状況：橋脚基礎コンクリートの打設が完了しました。今後は柱部の施工を行っていきます。</p>  <p>P27橋脚躯体体施工状況</p>	<p>No19 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事</p> <p>施工会社：名工建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：東名清水IC東側で、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。たがいま工事を進めるための準備中です。</p>  <p>着手前</p>	<p>No2 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事</p> <p>施工会社：平井工業(株) 工期：令和2年7月30日まで 工事状況：5月中旬で仮設工事が完了し、現在は掘削工事を夜間作業にて行っています。今後は杭の処理工事、鉄筋工事、コンクリート工事を順に行っていきます。</p>  <p>P22橋脚 掘削 施工状況</p>	<p>No16 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋下下部工事</p> <p>施工会社：五光建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：P21・P24橋脚の施工を行います。たがいま工事を進めるための準備中です。</p>  <p>着手前</p>	<p>No17 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事</p> <p>施工会社：静鉄建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：P17橋脚の施工を行います。たがいま工事を進めるための準備中です。</p>  <p>着手前</p>	<p>No4 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和2年12月25日まで 工事状況：P3橋脚では、基礎杭の施工を行っています。P4橋脚では、6月上旬に柱部のコンクリート打設が完了します。</p>  <p>P3橋脚 場所打ち杭施工状況</p>	<p>No24 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事</p> <p>施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：舗装版の撤去が完了しました。6月15日以降、場所打杭の施工を行います。</p>  <p>着手前</p>
--	---	---	--	---	---	---	---	--	--



静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和2年 6月
 清水監督官話所
 TEL 054-250-8920
 編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会
 担当：鈴与建設(株) (数嶋 陽平)
