



静清バイパス 牧ヶ谷～丸子地区4車線化 工事だより 第8号

【はじめに】


日頃より静清バイパス4車線化事業につきまして、ご理解ご協力を頂き誠に有難うございます。工事だよりを通じて地域の皆様へ『静清バイパス牧ヶ谷～丸子地区4車線化工事』の進捗状況、交通規制予定などの工事情報をお届けし、工事を進めて参りたいと思います。今回、工事だより第8号をお届けします、どうぞ宜しくお願い致します。




工事位置図

10月中旬より 丸子高架橋付近～牧ヶ谷IC付近の車線切替を予定しています。(天候等により順延する場合があります。)

現在の交通規制

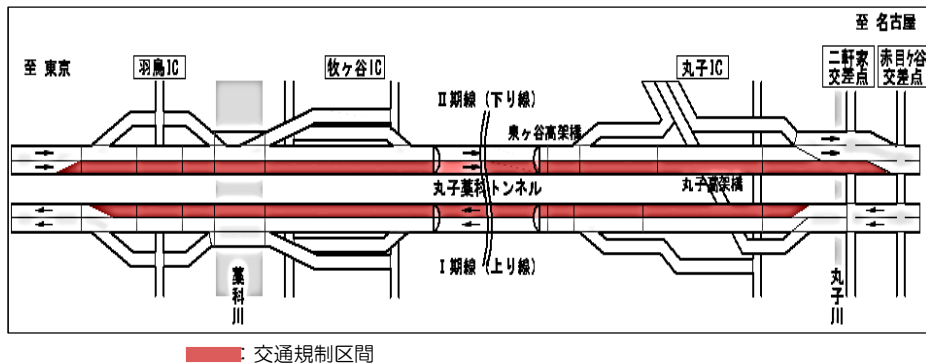

10月中旬以降の交通規制

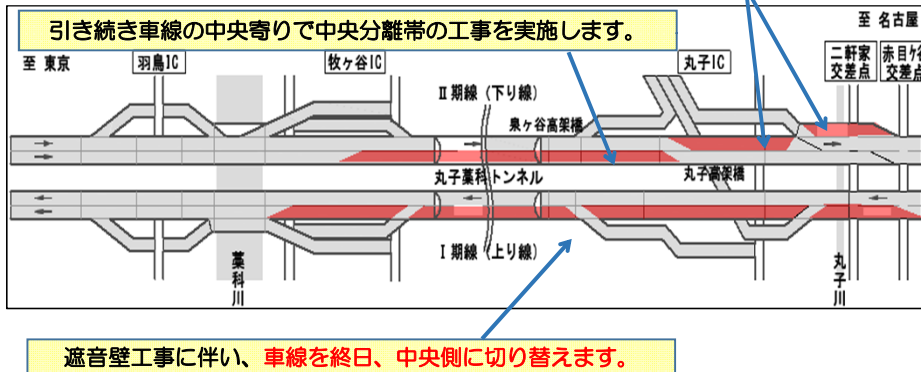

交通規制のお知らせ

※ 天候等により順延する場合があります。

- 遮音壁工事及び標識工事に伴い、下記のとおり交通規制を行います。
場所：1号静清BP上り線(二軒家交差点付近～牧ヶ谷IC付近)
規制時間：平成30年10月中旬～平成30年11月下旬
規制内容：走行車線規制(終日)
- 中央分離帯工事に伴い、下記のとおり交通規制を行います。
場所：1号静清BP下り線(牧ヶ谷IC～丸子高架橋付近)
規制時間：平成30年10月中旬～平成30年11月下旬
規制内容：追越車線規制(終日)
- 遮音壁工事に伴い、下記のとおり交通規制を行います。
場所：1号静清BP下り線(丸子高架橋東側～丸子高架橋西側)
規制時間：平成30年10月中旬～平成30年11月下旬
規制内容：走行車線規制(終日)

現在の進捗状況

<p>トンネル内設備工事 NO.1</p> <p>工事名：平成29年度 1号丸子薬科トンネル通信設備整備工事 工期：H29.4.19～H30.9.18 施工会社：イシデンエンジニアリング(株)</p> <p>担当者より一言 本工事は、国道1号丸子薬科トンネルII期線内のラジオ再放送設備の設置及び、防災設備の警報表示板、補助警報表示板、トンネル内表示板をI期線よりII期線へ移設、整備等を行い、無事工事が完了致しました。地元の皆様には多大なるご協力いただき、本当にありがとうございました。</p> <p>現場代理人 杉本明文</p> <p>完了</p>	<p>II期線 II期線</p>  <p>ラジオ再放送設備</p>  <p>警報表示板</p>	<p>トンネル内機械工事 NO.4</p> <p>工事名：平成30年度 丸子薬科トンネル換気設備撤去工事 工期：H30.8.18～H31.3.15 施工会社：JFEテクノス(株)</p> <p>担当者より一言 当工事は、I期線で使わなくなった換気設備の撤去を行う工事です。現在は電気配線を安全に撤去できるよう、現場の配線状況及び通電状況を調査しています。安全に施工できる事が確認できましたら、トンネル内や近傍施設の電気配線撤去に取りかかっていく予定です。</p> <p>現場代理人 山田智広</p>	<p>1期線(上り線)のジェットファン等の設備を撤去します。</p>  <p>ジェットファン</p>  <p>V.I.計</p>
<p>道路工事 NO.2</p> <p>工事名：平成29年度 1号静清BP牧ヶ谷丸子地区整備工事 工期：H30.3.3～H30.9.28 施工会社：平井工業(株)</p> <p>担当者より一言 千代～丸子間の車線切替え、二軒家交差点東側側道の遮音壁も完了し、この工事としては全ての作業が完了致しました。地元の皆様にはご理解と多大なるご協力をいただき、本当にありがとうございました。</p> <p>現場代理人 秋本謙太</p> <p>完了</p>	<p>牧ヶ谷側 丸子側</p>  <p>二軒家遮音壁</p>  <p>二軒家遮音壁</p>	<p>道路工事 NO.5</p> <p>工事名：平成30年度 1号静清BP整備工事 工期：H30.9.1～H31.3.20 施工会社：花菱建設(株)</p> <p>担当者より一言 当工事は、国道1号静清バイパスの4車線化に向け、道路の整備工事(傷んだ舗装の補修等)を行っています。現在は安全で高品質な施工を行うよう、施工計画及び現地調査を行っています。調査が終了しましたら、舗装等の作業を行なっていきます。</p> <p>現場代理人 高橋拓也</p>	 <p>工事中</p> 
<p>道路工事 NO.3</p> <p>工事名：平成29年度 1号静清BP牧ヶ谷丸子地区舗装工事 工期：H30.3.28～H31.2.8 施工会社：岐建(株)</p> <p>担当者より一言 本工事は、国道1号静清バイパスの千代～丸子間の道路改良および舗装を行う工事です。7月から藤枝向き(下り車線)を切り替えています。今後は4車線化するための遮音壁工事や標識工事等を行なっていきます。</p> <p>現場代理人 常川裕司</p>	<p>牧ヶ谷側 丸子側</p>  <p>縁石施工状況</p>  <p>旧中央分離帯取壊し状況</p>	<p>編集後記</p> <p>静清バイパス牧ヶ谷～丸子地区の4車線化は、平成30年度の供用開始に向け、5件の工事が急ピッチで行われていましたが、この度、2件の工事が完了となります。皆様のご協力をいただき、交通混雑の緩和に向けた4車線化工事は、計画通り順調に進んでいます。工事に伴い、工事用車両の出入り・交通規制・騒音等、皆様には大変ご不便をお掛けしています。引き続き安全第一で工事を進めて参りますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。</p> <p>静岡国道事務所 ホームページ http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/</p> <p>平成30年度 9月 静岡国道事務所 静岡国道出張所 編集：静岡国道出張所 安全協議会 担当：JFEテクノス株式会社</p>	
