

H16名古屋第2合同庁舎耐震改修工事ニュースNO. 1

○防災拠点としての機能を確保するために、B1Fの柱頭に免震装置を組み込む中間階免震工法を用いて改修を行います。

平成17年6月 発行

工事状況のお知らせ



南側仮設工事用構台敷設工事が完了しました



B1F車庫内 基礎の補強工を行っています




3F仮理髪店舗工事が完了しました


今月6月の主な作業内容について

- ・B1F車庫の基礎補強工事を行います。
- ・南面から西面の山留め杭打ち工事を行います。
- ・B2Fの躯体補強工事として山留め杭打ち工事を行います。
- それに伴う設備の切り回し工事も行います。
- ・B1F車庫の免震工事として柱の柱頭部の補強工事を行います。
- ・仮設理容店舗、仮設売店は3Fで営業を行っています。

中部地方整備局
(株) 竹中工務店

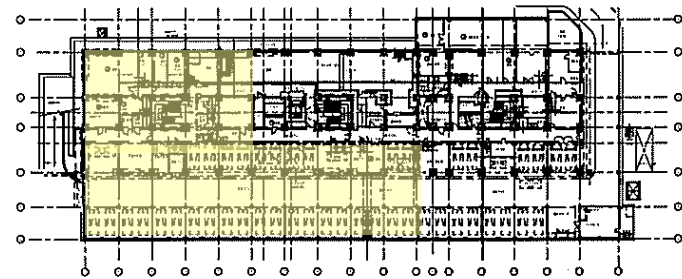

B 1 階平面図



B 2 階平面図

6月工事予定範囲です

名古屋地方第2地方合同庁舎
耐震改修工事

発注者 国土交通省中部地方整備局
設計 国土交通省中部地方整備局
(株) 梓 設計

監理 国土交通省中部地方整備局

営繕部保全指導・監督室

(株) 梓 設計

施工 建築 (株) 竹中工務店

電気 東光電気工事(株)

機械 三機工業(株)

ELV 日本オーチス・エレベーター(株)
