

# H16名古屋第2合同庁舎耐震改修工事ニュースNO. 2

○防災拠点としての機能を確保するために、B1Fの柱頭に免震装置を組み込む中間階免震工法を用いて改修を行います。

平成17年7月 発行

## 工事状況のお知らせ



南面、山留め杭打ち工事を行っています。



B1F車庫内 基礎の補強コンクリート打設が完了しました。




B1F 整備局、国土地理院書庫で耐震補強壁を新設します。

## 7月の主な作業内容について


- ・南面の山留め杭打ち工事を引き続き行います。
- ・南面の杭掘削土をスロープに埋め戻します。
- ・南面西側より杭打ち工事を行います。  
(11月末完了予定)
- ・B2Fの躯体補強工事として西側より各書庫、倉庫、冷凍機室等の柱まわり壁を撤去後、柱壁に補強工事を行います。
- ・B1Fの免震工事として外周部躯体の解体、柱の柱頭部に補強工事を引き続き行います。
- ・エレベーター工事、3・4号機は停止します。5・6号機は2～8F稼働します。

中部地方整備局  
(株) 竹中工務店

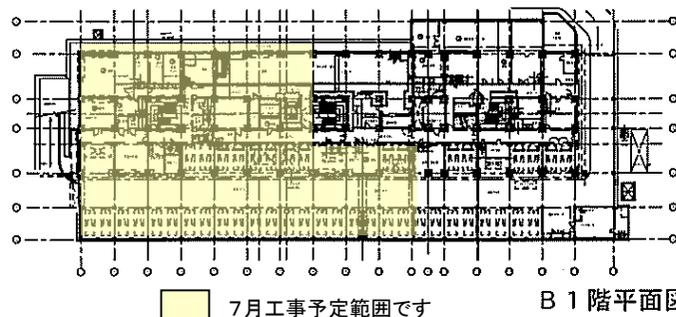

7月工事予定範囲です

B 1 階平面図



B 2 階平面図

名古屋地方第2地方合同庁舎  
耐震改修工事

発注者 国土交通省中部地方整備局

設計 国土交通省中部地方整備局  
(株) 設計

監理 国土交通省中部地方整備局

営繕部保全指導・監督室

(株) 設計

施工 建築 (株) 竹中工務店

電気 東光電気工事(株)

機械 三機工業(株)

ELV 日本オーチス・エレベータ(株)

\* 工事についての質問等は下記までご連絡下さい

中部地方整備局 営繕部

保全指導・監督室 細川 TEL 052-953-8196
