

H16名古屋第2合同庁舎耐震改修工事ニュースNO. 3

○防災拠点としての機能を確保するために、B1Fの柱頭に免震装置を組み込む中間階免震工法を用いて改修を行います。

平成17年8月 発行

工事状況のお知らせ



南面杭工事打設中。



北側正面入口階段撤去工事中。




西面山留杭工事中。

8月1日より庁舎北側出入り口を閉鎖し、東・西側からの出入りとなりました。

8月の主な作業内容について

- ・北面の山留め杭打ち工事を引き続き行います。
- ・南面の杭掘削土をスロープに埋め戻します。
- ・西北面の杭打ち工事を引き続き行います。
- ・B2Fの躯体補強工事として西側より各書庫、倉庫、冷凍機室等の柱まわり壁を撤去後、柱壁に補強工事を引き続き行います。
- ・B1Fの免震工事として外周部躯体の解体、柱の柱頭部に補強工事を引き続き行います。
- ・エレベーター工事、3・4号機は停止します。
1・2号機はB2～8F稼動します。
5・6号機は2～8F稼動します。
- ・下旬よりB1F免震装置取付予定です。
(9月頃見学会を予定しています)

中部地方整備局
(株) 竹中工務店

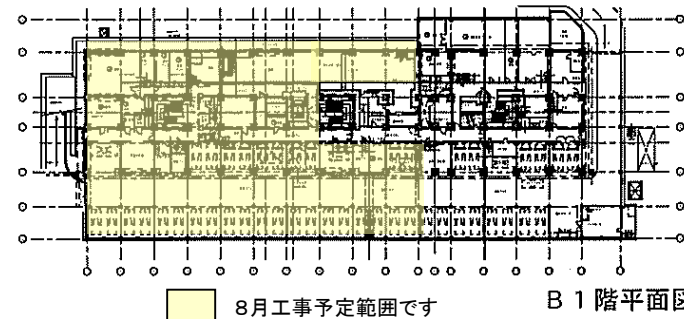

B 1 階平面図



B 2 階平面図

名古屋第2地方合同庁舎耐震改修建築工事

発注者 国土交通省中部地方整備局

設計 国土交通省中部地方整備局

(株) 梓 設計

監理 国土交通省中部地方整備局

営繕部保全指導・監督室

(株) 梓 設計

施工 建築 (株) 竹中工務店

電気 東光電気工事(株)

機械 三機工業(株)

ELV 日本オーチス・エレベータ(株)

* 工事についての質問等は下記までご連絡下さい

中部地方整備局 営繕部

保全指導・監督室 細川 TEL 052-953-8196
